

Id		Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	02 nov '08										09 nov	
							V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	
1		SAT APS	811 días	jue 18/06/09	jue 26/07/12													
2		Firma de contrato	20 días	jue 18/06/09	mar 07/07/09													
3		Fase de Planeacion del Arranque	20 días	mié 08/07/09	mar 04/08/09													
4		Entrega de 2 equipos de computo por cada uno de los modelos considerados por Cepra (2.3.1)	5 días	mié 08/07/09	dom 12/07/09	2												
5		Creación de imagen base de software (2.1.1.3)	17 días	lun 13/07/09	mar 04/08/09	4												
6		Entrega de Solución de harware o software de evaluación de equipos entregados (2.3.1)	5 días	mié 08/07/09	dom 12/07/09	2												
7		Entregables de la planeación del arranque (sección 2.3.1.1.)	20 días	mié 08/07/09	mar 04/08/09	2												
8		Elaborar junto con el SAT el plan de aseguramiento de continuidad de los servicios (BSP,DRP y AFN) (2.3.1.1)	20 días	mié 08/07/09	mar 04/08/09	2												
9		Conformación y presentación del Grupo Administrador del Proyecto, con elementos pertenecientes a CEPRA y al SAT (Cuerpo de Gobierno) (2.3.1.3)	20 días	mié 08/07/09	mar 04/08/09	2												
10		Presentación de esquema de reciclaje y disposición final de baterías (3.3.2.3)	20 días	mié 08/07/09	mar 04/08/09	2												
11		Solicitud de calendario de capacitación en la herramienta de MA del SAT (3.4.6.2)	15 días	mié 08/07/09	mié 22/07/09	2												
12		Equipo de recurso de humanos dedicados a la planeación (5.2.2)	20 días	mié 08/07/09	mar 04/08/09	2												
13		Presentación de información curricular del equipo de trabajo propuesto(5.2.2)	5 días	mié 08/07/09	mar 14/07/09	2												
14		Desarrollar los materiales, las formas y tipos de capacitación asi como los perfiles y el orden en que se lleve la capacitación a los usuarios	20 días	mié 08/07/09	mar 04/08/09	2												
15		Especificación de los diferentes aspectos operativos de la mesa de ayuda del SAT (MA) y la mesa de servicio (MS) de CEPRA	20 días	mié 08/07/09	mar 04/08/09	2												
16		Definición de estatus de reportes entre CEPRA y la mesa de ayuda del SAT (MA)	20 días	mié 08/07/09	mar 04/08/09	2												
17		Acuerdo de procedimientos y lineamientos de medición de los diferentes niveles de servicio	20 días	mié 08/07/09	mar 04/08/09	2												
18		Acuerdo de ejecución del Plan de migración	20 días	mié 08/07/09	mar 04/08/09	2												
19		Generación de PUNTOS DE CONTACTO y METODOS DE ESCALACIÓN de problemas al interior del Cuerpo de Gobierno	5 días	mié 08/07/09	mar 14/07/09	2												
20		Presentación, por parte de CEPRA, del Programa de Implementación detallado	10 días	mié 15/07/09	mar 28/07/09	19												
21		Analisis y Revisión del Programa de Implementación (Plan Detallado) por parte del SAT	4 días	mié 29/07/09	lun 03/08/09	20												
22		Aprobación del Programa de Implementación	1 día	mar 04/08/09	mar 04/08/09	21												

Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16


Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
Project Summary		Tarea manual		Progress	
External Tasks		Sólo duración		Split	

Id		Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	02 nov '08										09 nov			
							V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L			
23		Firma de Requerimientos de Operación (OLAs) entre CEPRA y terceros involucrados, en coordinación con el Grupo Administrador del Proyecto (2.3.1.4)	20 días	mié 05/08/09	mar 01/09/09	22														
24		Procedimiento aprobado por el gobierno del proyecto APS para ejercer los montos de apoyo a la supervisión (2.3.2)	60 días	mié 05/08/09	sáb 03/10/09	22														
25		Generación de Repositorio de información de consulta (2.4)	60 días	mié 05/08/09	sáb 03/10/09	22														
26		Instalación y configuración total de la consola de la herramienta de administración , diagnostico y soporte remoto (3.3.4)	60 días	mié 05/08/09	sáb 03/10/09	22														
27		Equipo de recurso de humanos dedicados a la planeación (5.2.2)	30 días	mié 05/08/09	jue 03/09/09	22														
28		Entrega de procedimientos actualizados y alineados a los procesos de ITIL(5.2.2)	30 días	mié 05/08/09	jue 03/09/09	22														
29		Liberación de infraestructura (incluye facilities y enlace de datos)	60 días	mié 05/08/09	sáb 03/10/09	22														
30		Implementación de los PS (2.3.3)	120 días	mié 05/08/09	mié 02/12/09															
31		Primera Fase 40% de inmuebles	40 días	mié 05/08/09	dom 13/09/09															
32		Instalación de PS	40 días	mié 05/08/09	dom 13/09/09	22														
33		Segunda Fase 40% de inmuebles	40 días	lun 14/09/09	vie 23/10/09															
34		Instalación de PS	40 días	lun 14/09/09	vie 23/10/09	32														
35		Tercera Fase 20% de inmuebles	40 días	sáb 24/10/09	mié 02/12/09															
36		Instalación de PS	40 días	sáb 24/10/09	mié 02/12/09	34														
37		Entrega de Projectores ligeros (5.2.5)	120 días	mié 05/08/09	mié 02/12/09	22														
38		Fase de Estabilización del Servicio (2.3.3)	100 días	mar 25/08/09	mié 02/12/09															
39		Primera Fase 40% de inmuebles	30 días	mar 25/08/09	mié 23/09/09															
40		Estabilización del servicio	30 días	mar 25/08/09	mié 23/09/09	32FC-20 días														
41		Segunda Fase 40% de inmuebles	30 días	dom 04/10/09	lun 02/11/09															
42		Estabilización del servicio	30 días	dom 04/10/09	lun 02/11/09	34FC-20 días														
43		Tercera Fase 20% de inmuebles	30 días	mar 03/11/09	mié 02/12/09															
44		Estabilización del servicio	30 días	mar 03/11/09	mié 02/12/09	36FC-30 días														
45		Fase de Administración de Servicios (2.3.4)	960 días	jue 03/12/09	jue 19/07/12	44														
46		Entrega de respaldo de toda la información del proyecto a la finalización del contrato (2.4)	7 días	vie 20/07/12	jue 26/07/12	45														
47		Entrega de Accesorios(5.2.5)	1080 días	mié 05/08/09	jue 19/07/12	22														
48		Modelo de madurez - Administración de los Servicios (2.3.5)	417 días	jue 08/07/10	vie 10/02/12															
49		1a etapa de ajustes de SLA´s (mejora continua) (2.3.5.2)	30 días	jue 08/07/10	vie 06/08/10	2FC+365 días														
50		2a etapa de ajustes de SLA´s (mejora continua) (2.3.5.2)	30 días	lun 02/01/12	vie 10/02/12	49FC+365 días														

Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	


Id		Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	02 nov '08														09 nov		
							V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L						
51		Planes de evolución y desarrollo de las plataformas de computo (3.3.2.2)	412 días	jue 05/08/10	vie 02/03/12																		
52		Entrega 1	7 días	jue 05/08/10	mié 11/08/10	22FC+365 días																	
53		Entrega 2	7 días	vie 11/02/11	jue 17/02/11	52FC+183 días																	
54		Entrega 3	7 días	vie 19/08/11	jue 25/08/11	53FC+182 días																	
55		Entrega 4	7 días	sáb 25/02/12	vie 02/03/12	54FC+183 días																	
56		Revisión de OLA´s (2.3.1.4)	425 días	lun 17/05/10	vie 30/12/11																		
57		Revisión 1	20 días	lun 17/05/10	vie 11/06/10	23FC+183 días																	
58		Revisión 2	20 días	mié 23/02/11	mar 22/03/11	57FC+182 días																	
59		Revisión 3	20 días	lun 05/12/11	vie 30/12/11	58FC+183 días																	
60		Mantenimientos preventivos(3.4.3)	511 días	jue 05/08/10	jue 19/07/12																		
61		Entrega de plan 1er mantenimiento	30 días	jue 05/08/10	vie 03/09/10	22FC+365 días																	
62		Elaboración de 1er mantenimiento	300 días	sáb 04/09/10	jue 30/06/11	61																	
63		Entrega de plan 2do mantenimiento	30 días	dom 04/09/11	lun 03/10/11	61FC+365 días																	
64		Elaboración de 2do mantenimiento	290 días	mar 04/10/11	jue 19/07/12	63																	
65		Reportes Mensuales de la herramienta de Administración(3.3.4)	1020 días	dom 04/10/09	jue 19/07/12	26																	
66		Reportes Mensuales de inventario (3.4.4)	1020 días	dom 04/10/09	jue 19/07/12	26																	
67		Reportes consolidados de servicios mensuales (4.2.1.7)	1020 días	dom 04/10/09	jue 19/07/12	26																	
68		Presentación plan de retiro de equipos finalización del contrato (5.3)	180 días	dom 22/01/12	jue 19/07/12	45FC-180 días																	

Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

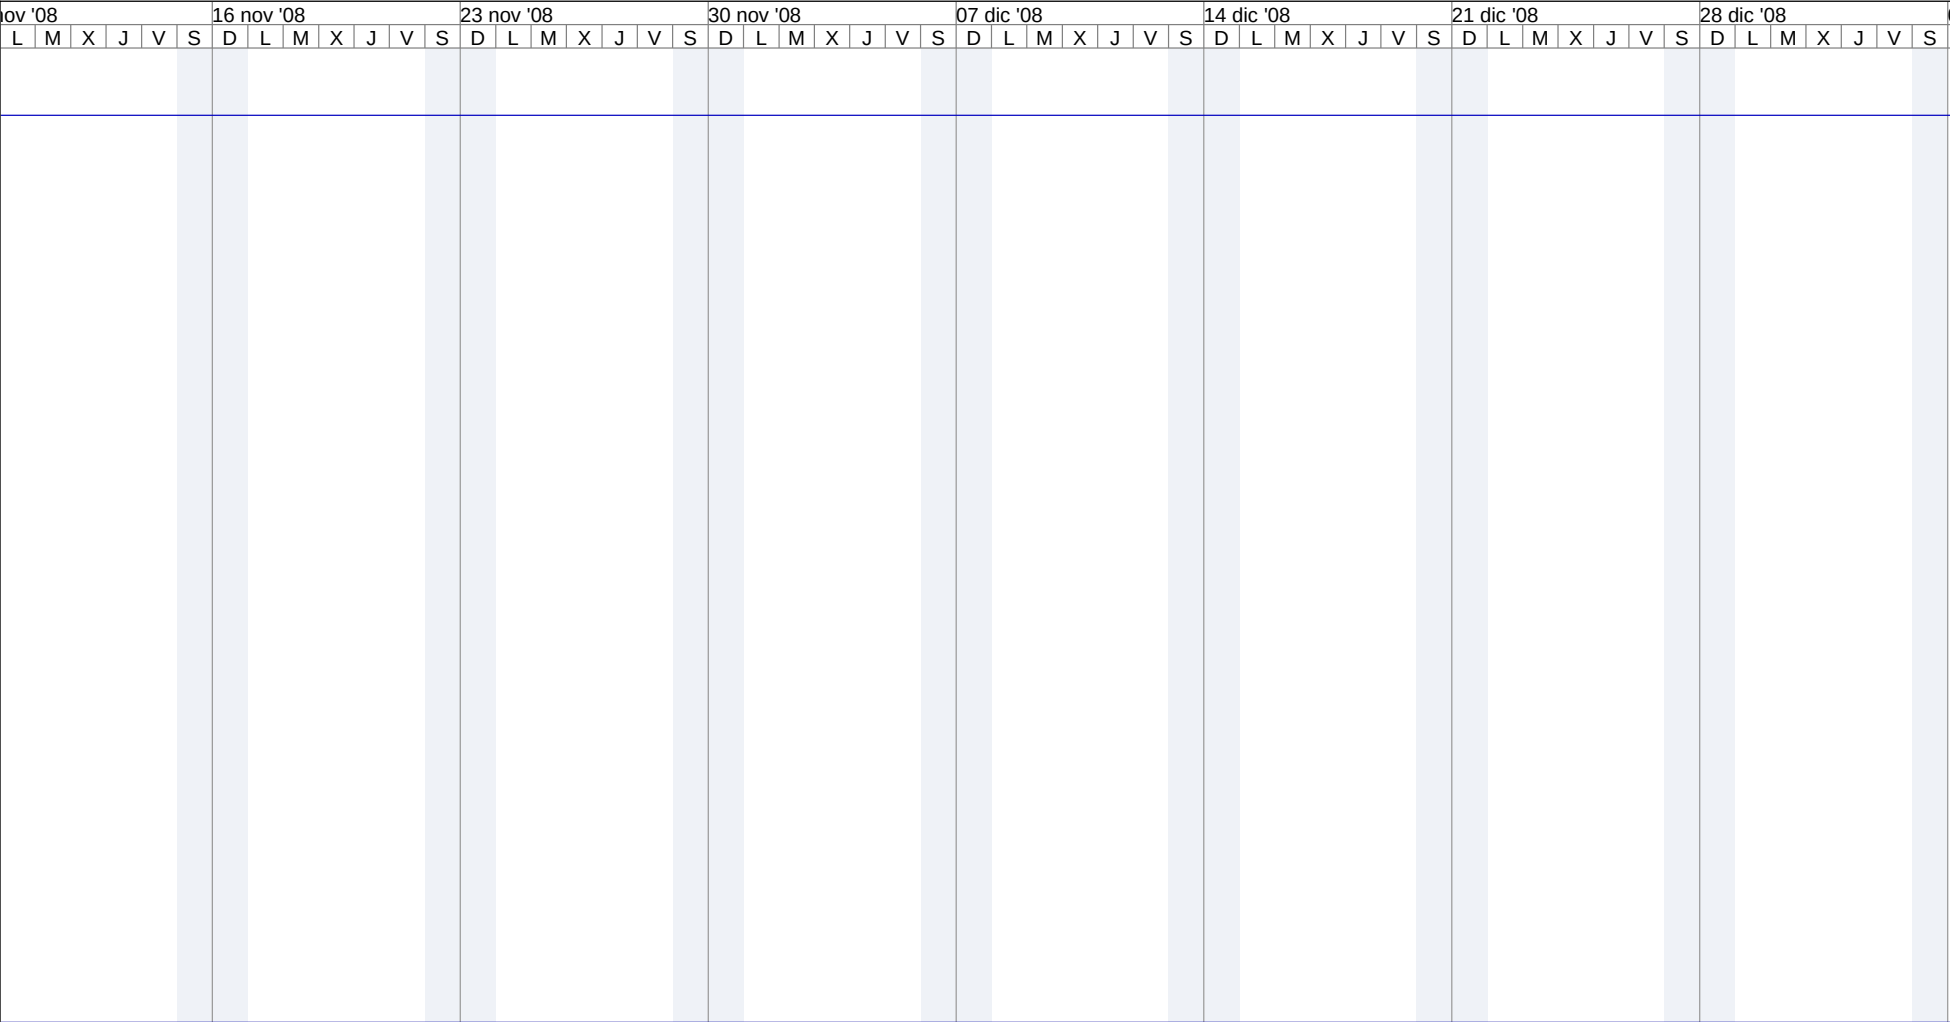


Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
Project Summary		Tarea manual		Progress	
External Tasks		Sólo duración		Split	

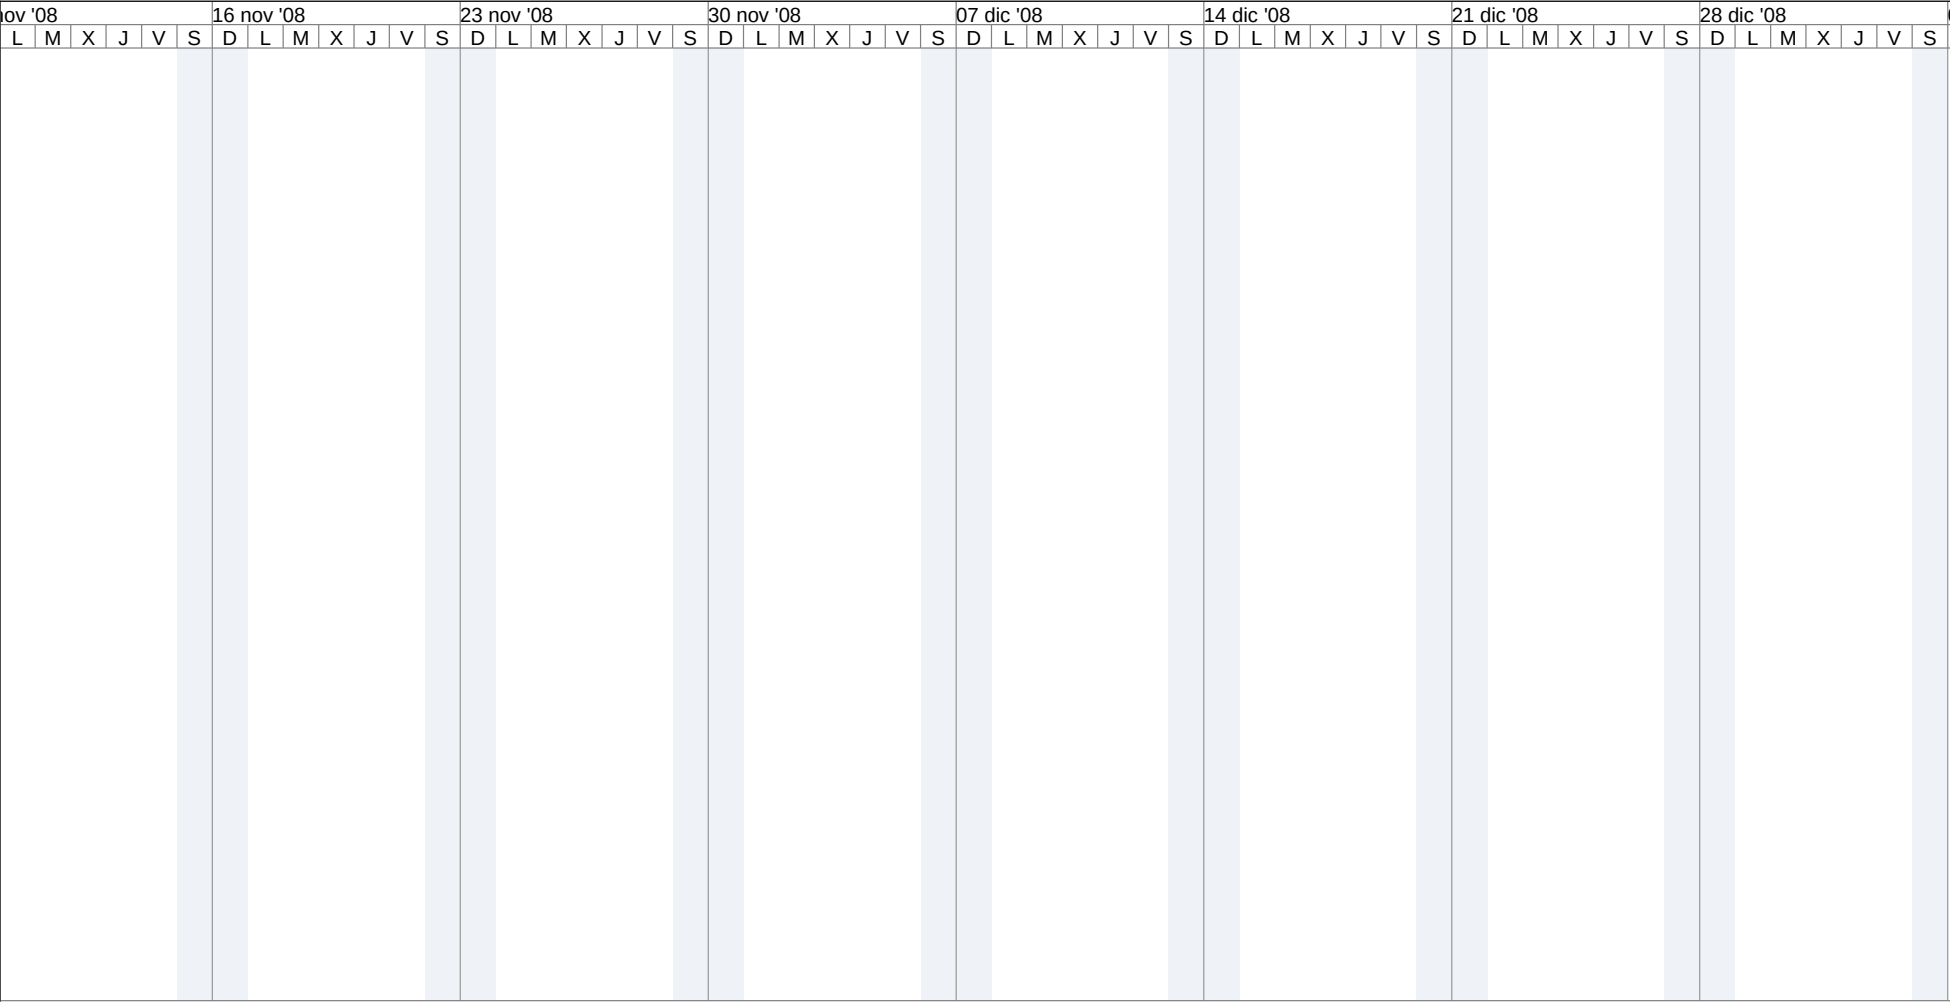

Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

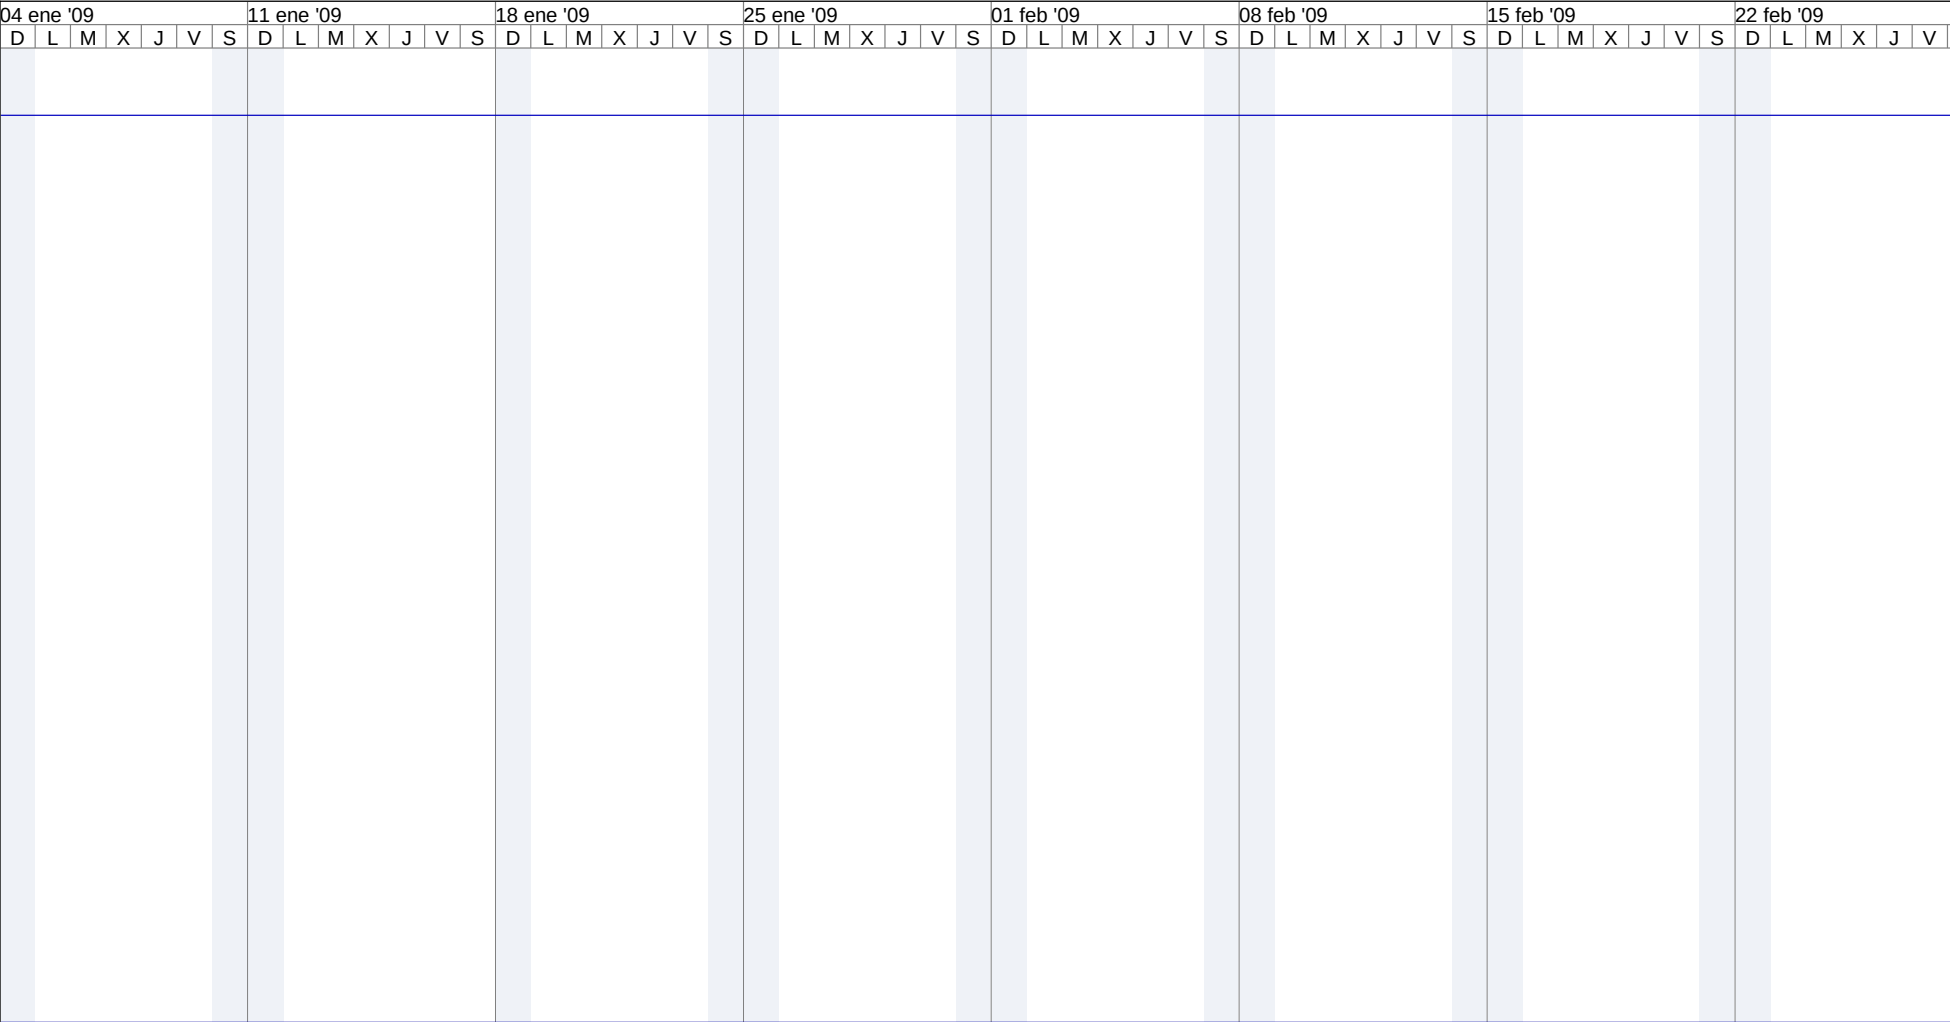

Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External MileTask

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progress

Split



Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External MileTask

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progress


Split

[illegible]

Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

[illegible]

Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

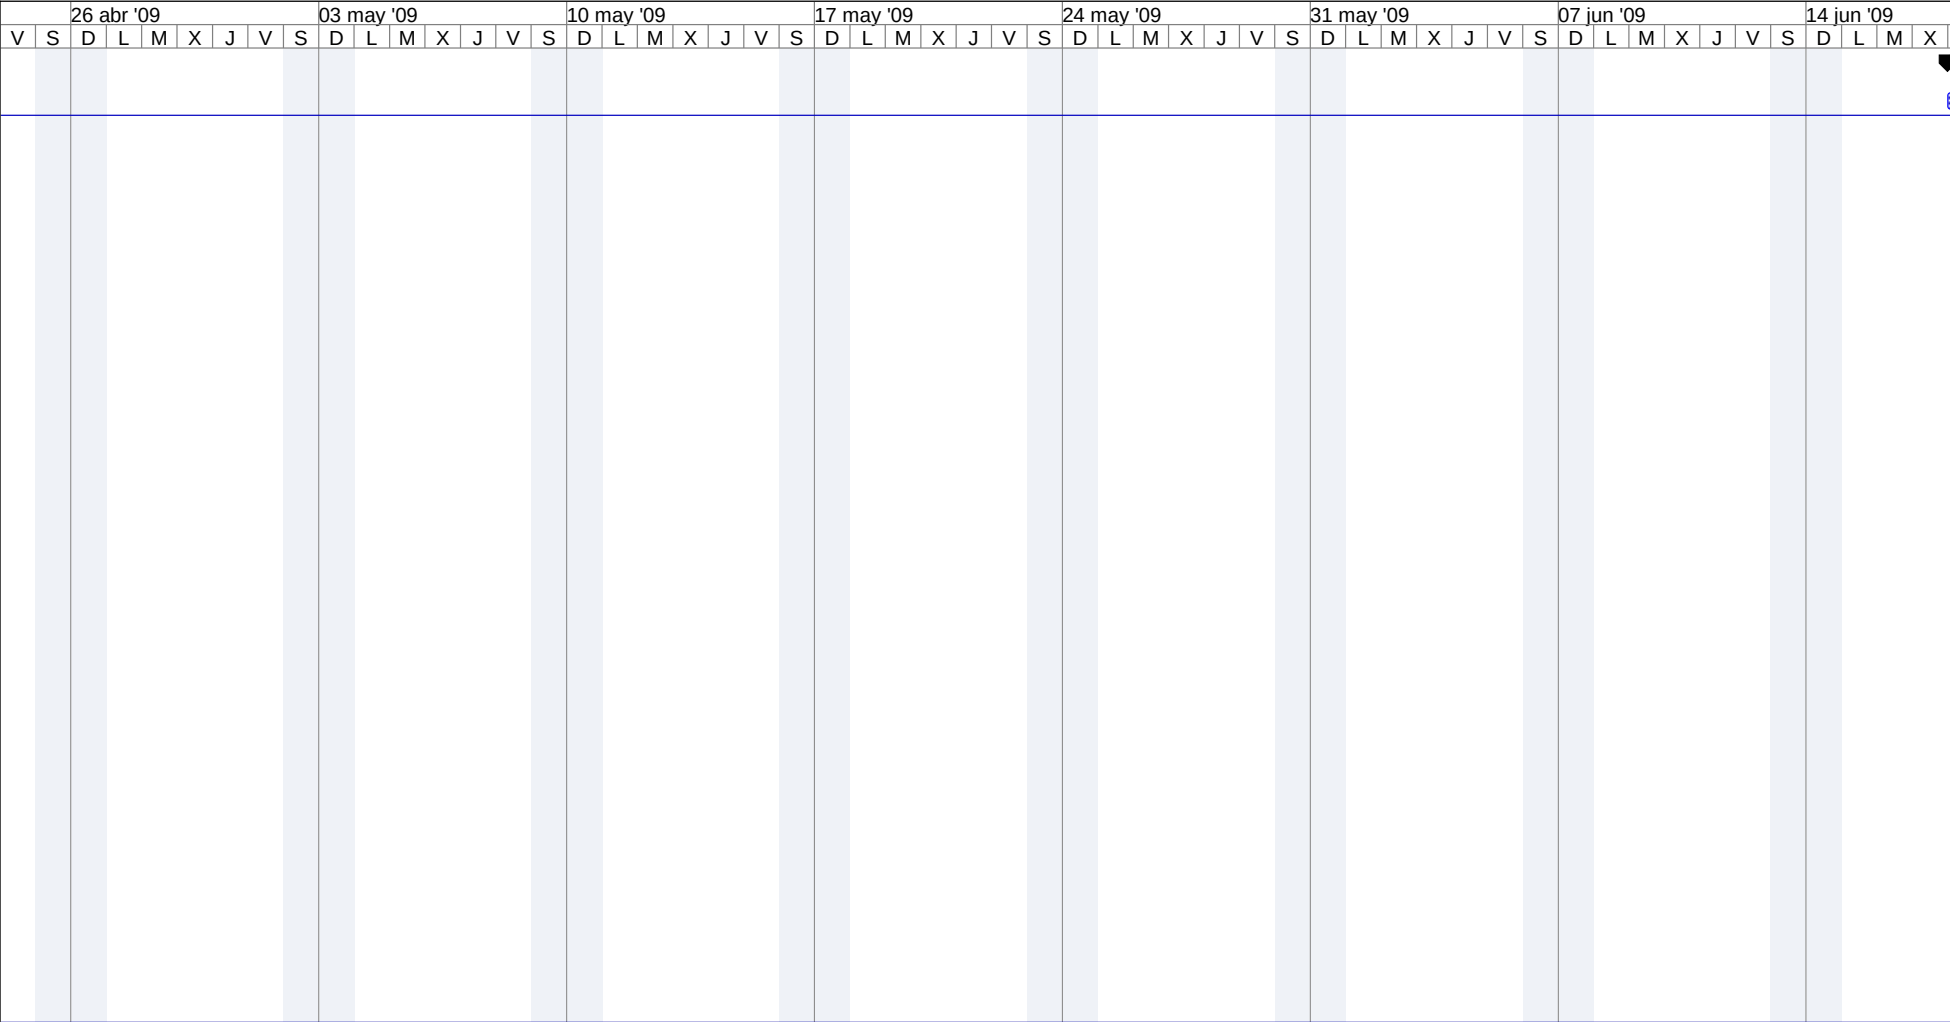

Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External MileTask

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual


Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progress

Split

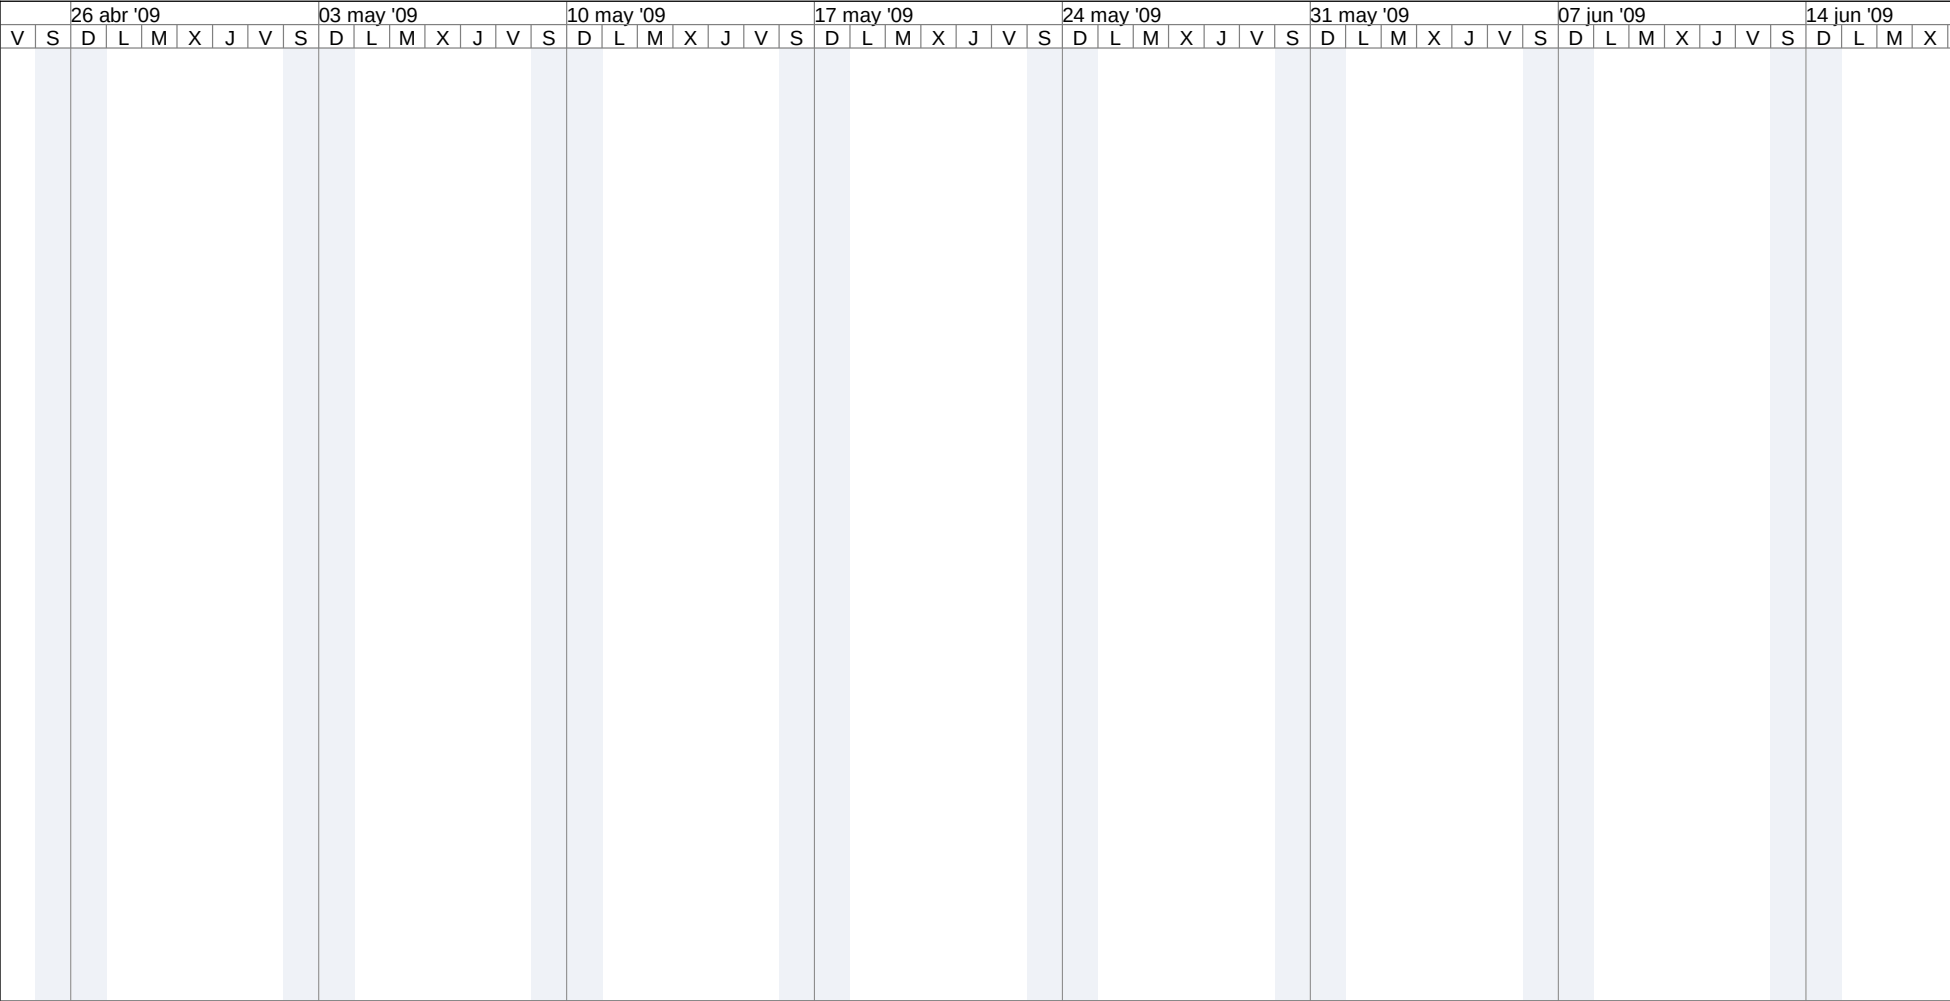


Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
Project Summary		Tarea manual		Progress	
External Tasks		Sólo duración		Split	


26 abr '09							03 may '09							10 may '09							17 may '09							24 may '09							31 may '09							07 jun '09							14 jun '09						
V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X								

--

Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

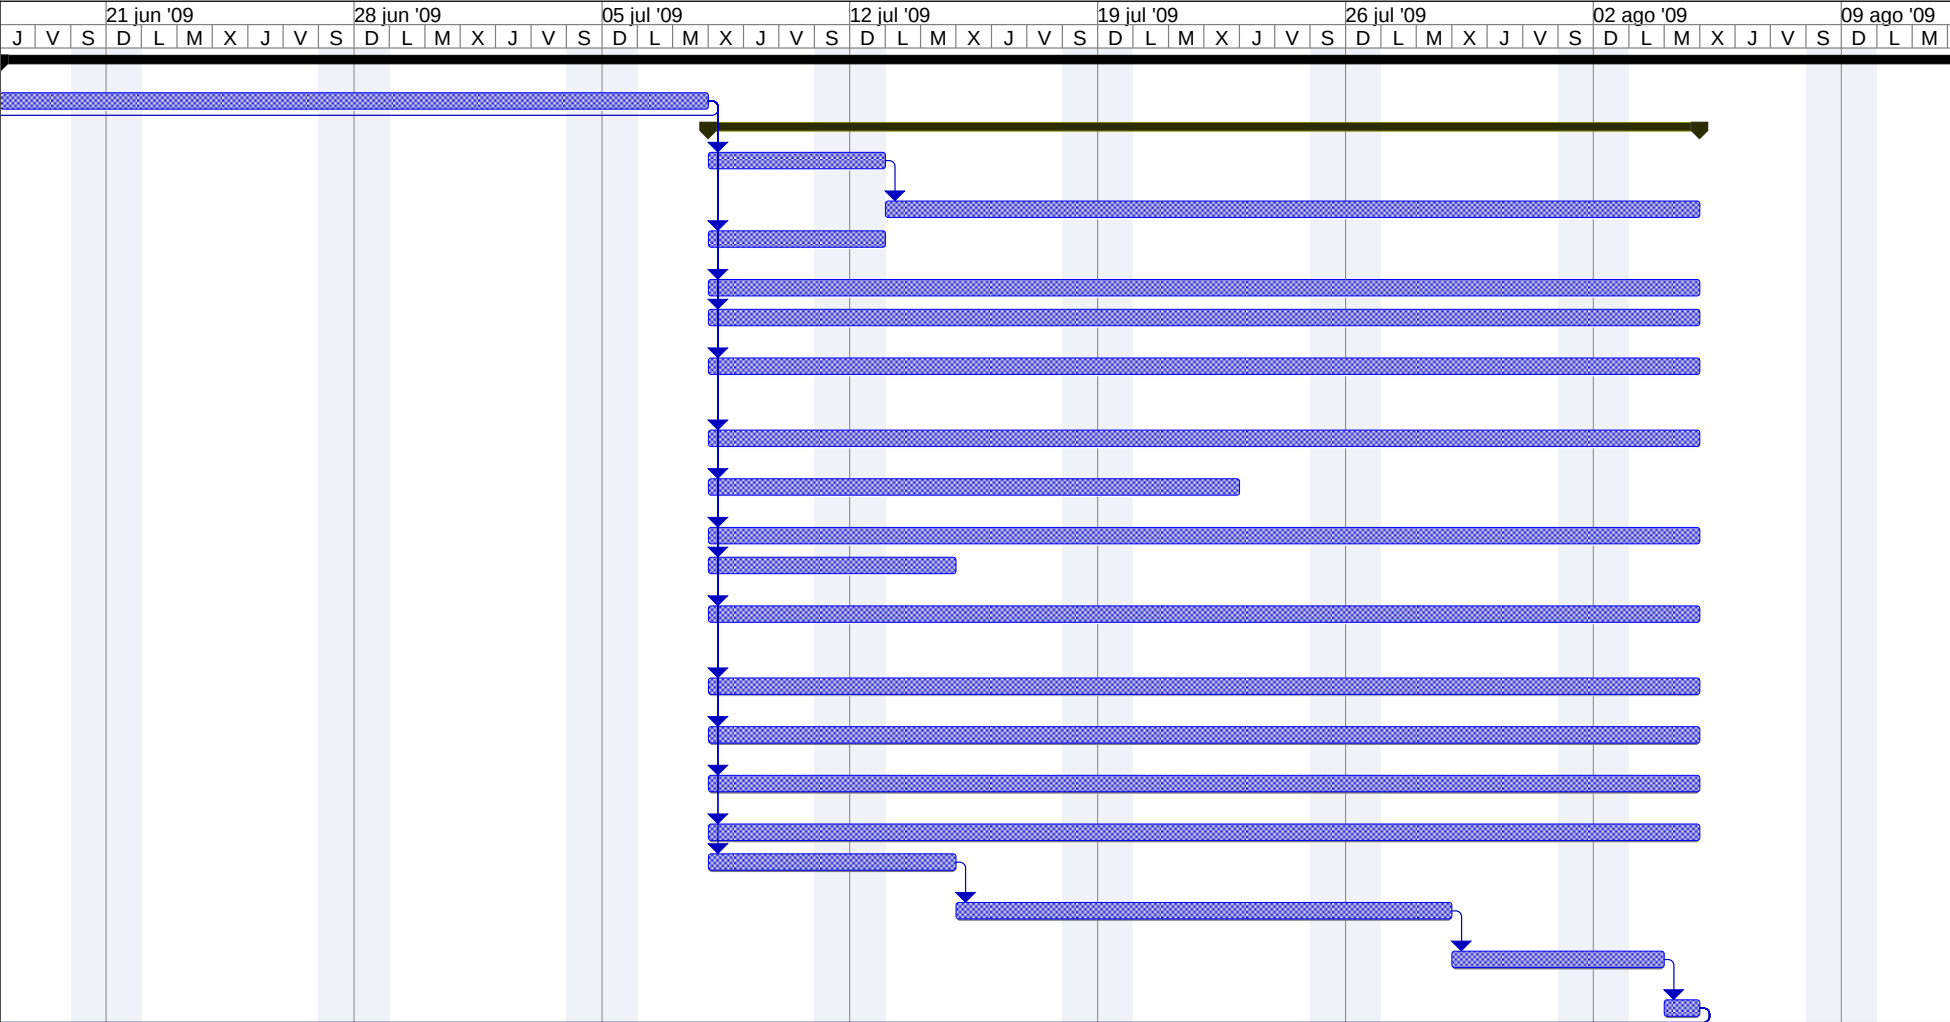


Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

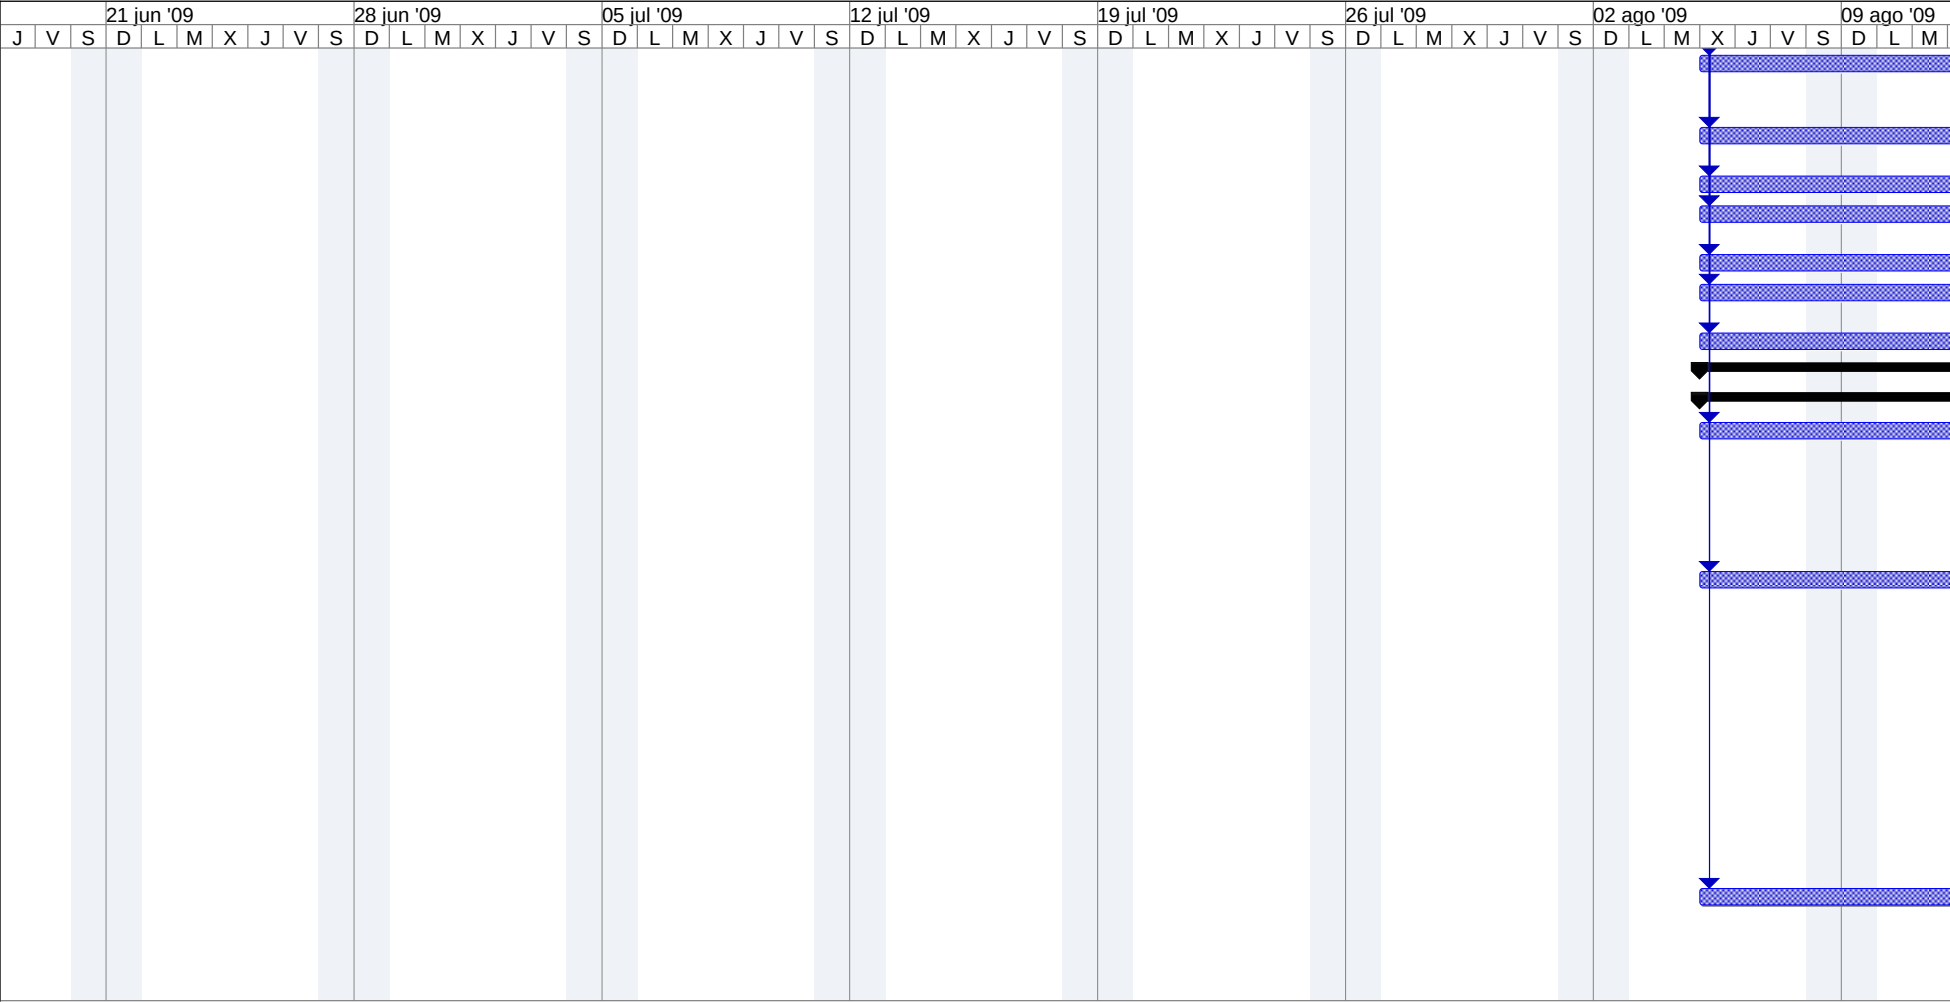



Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

[illegible]


Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

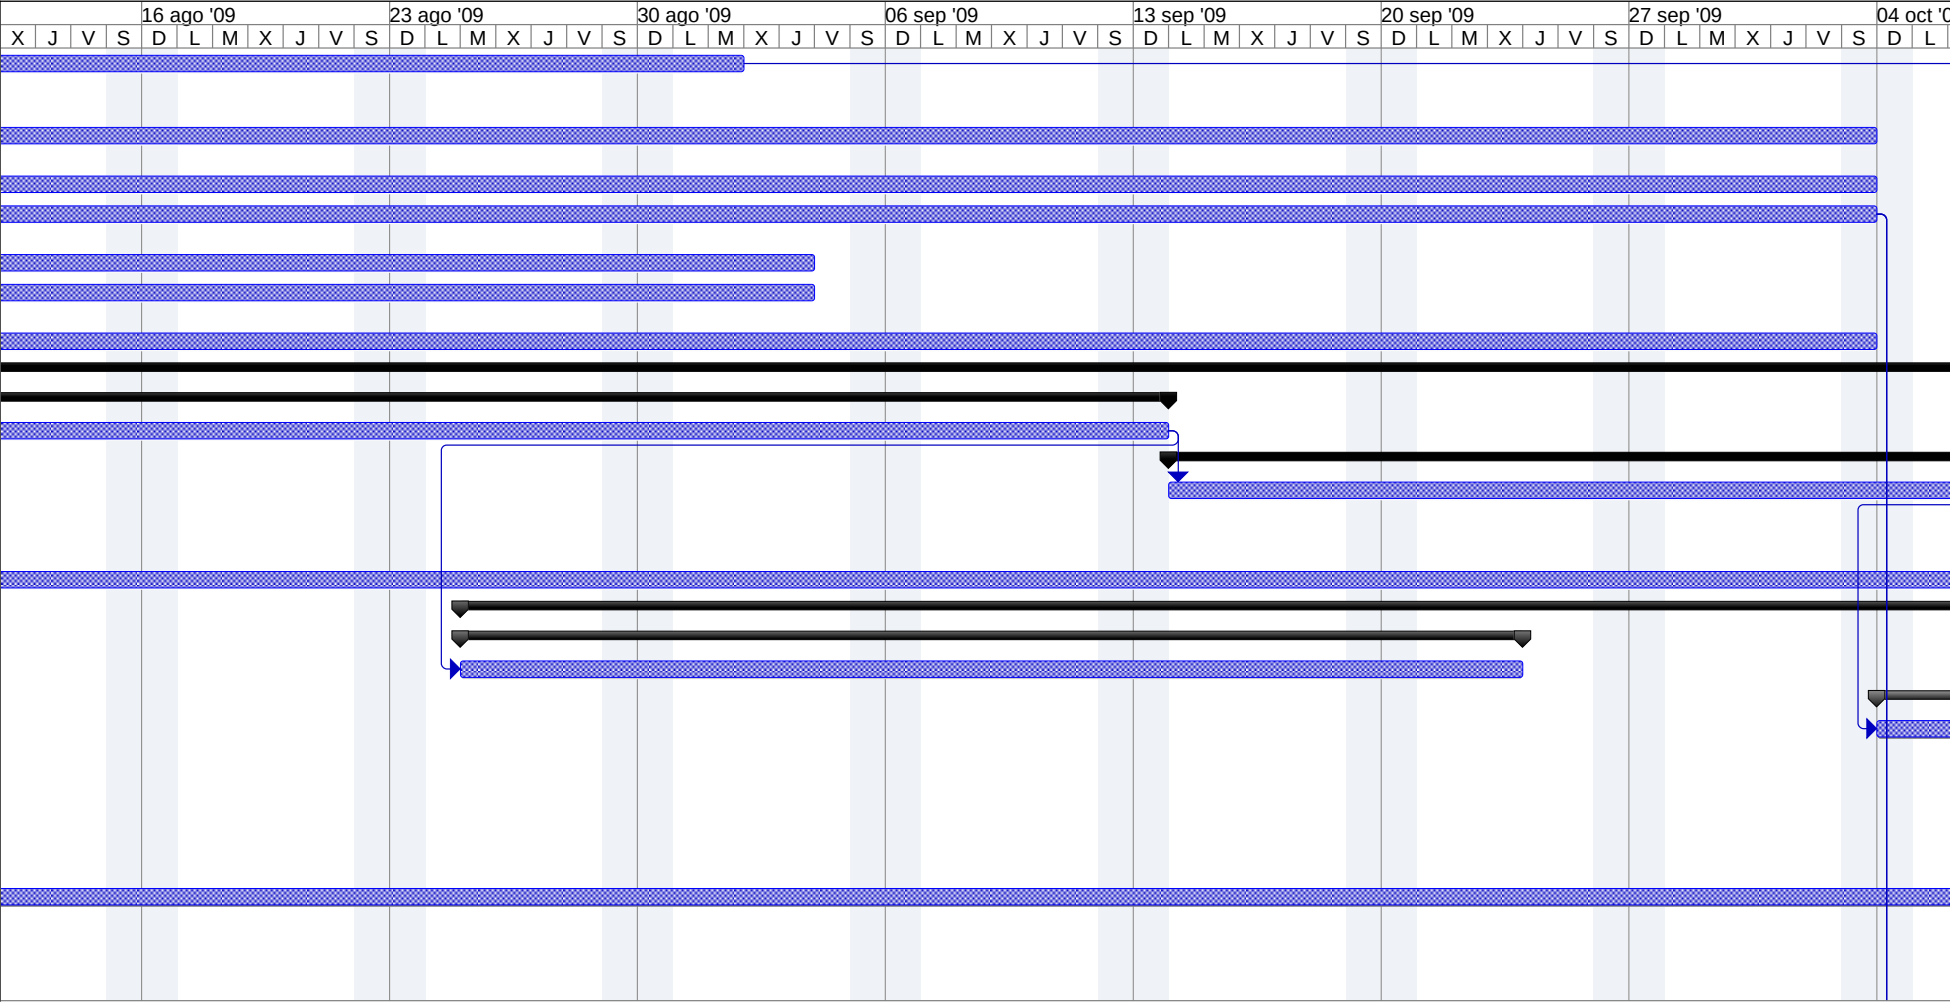

Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

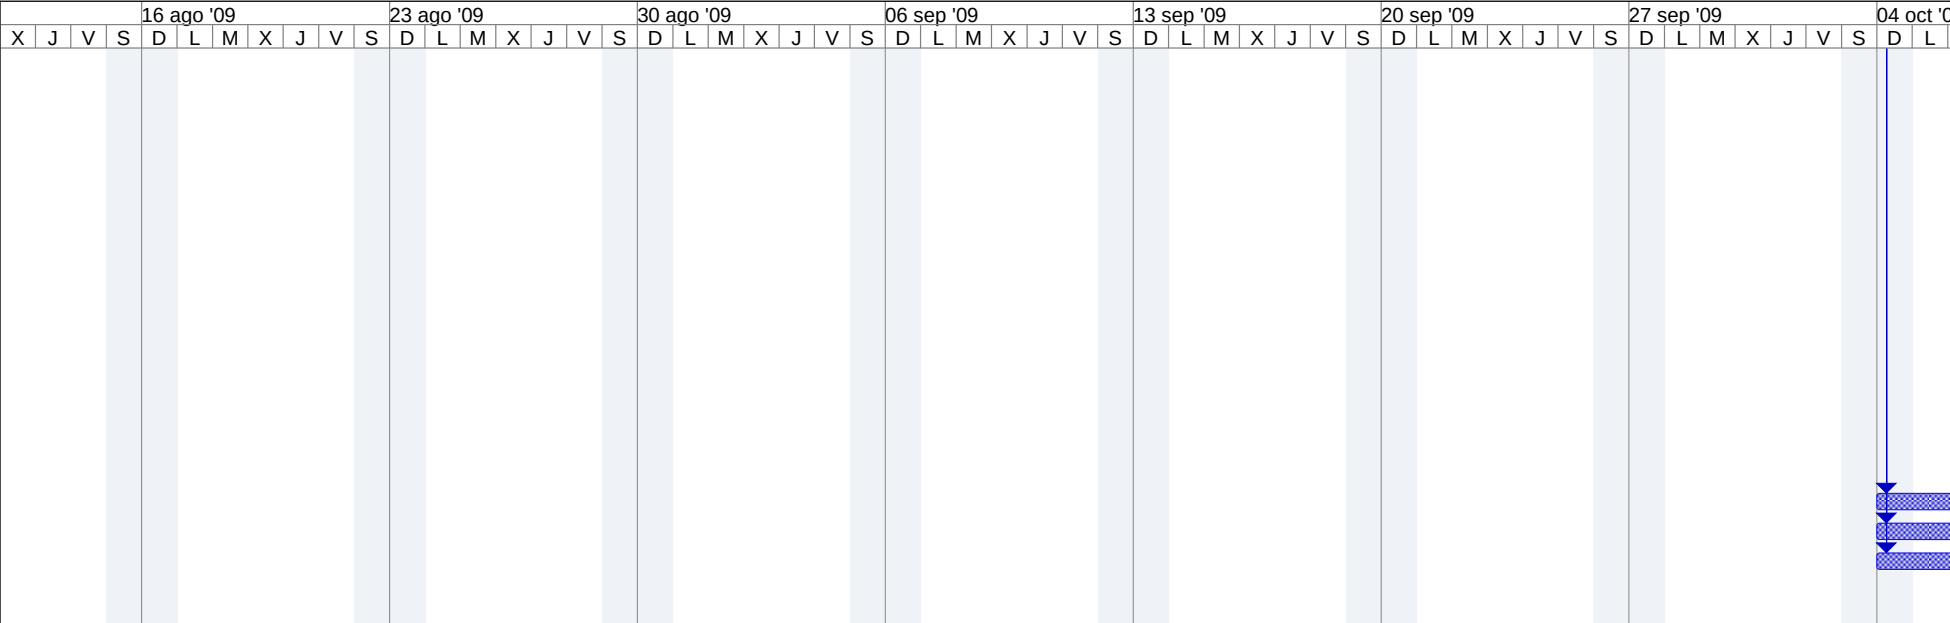

Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

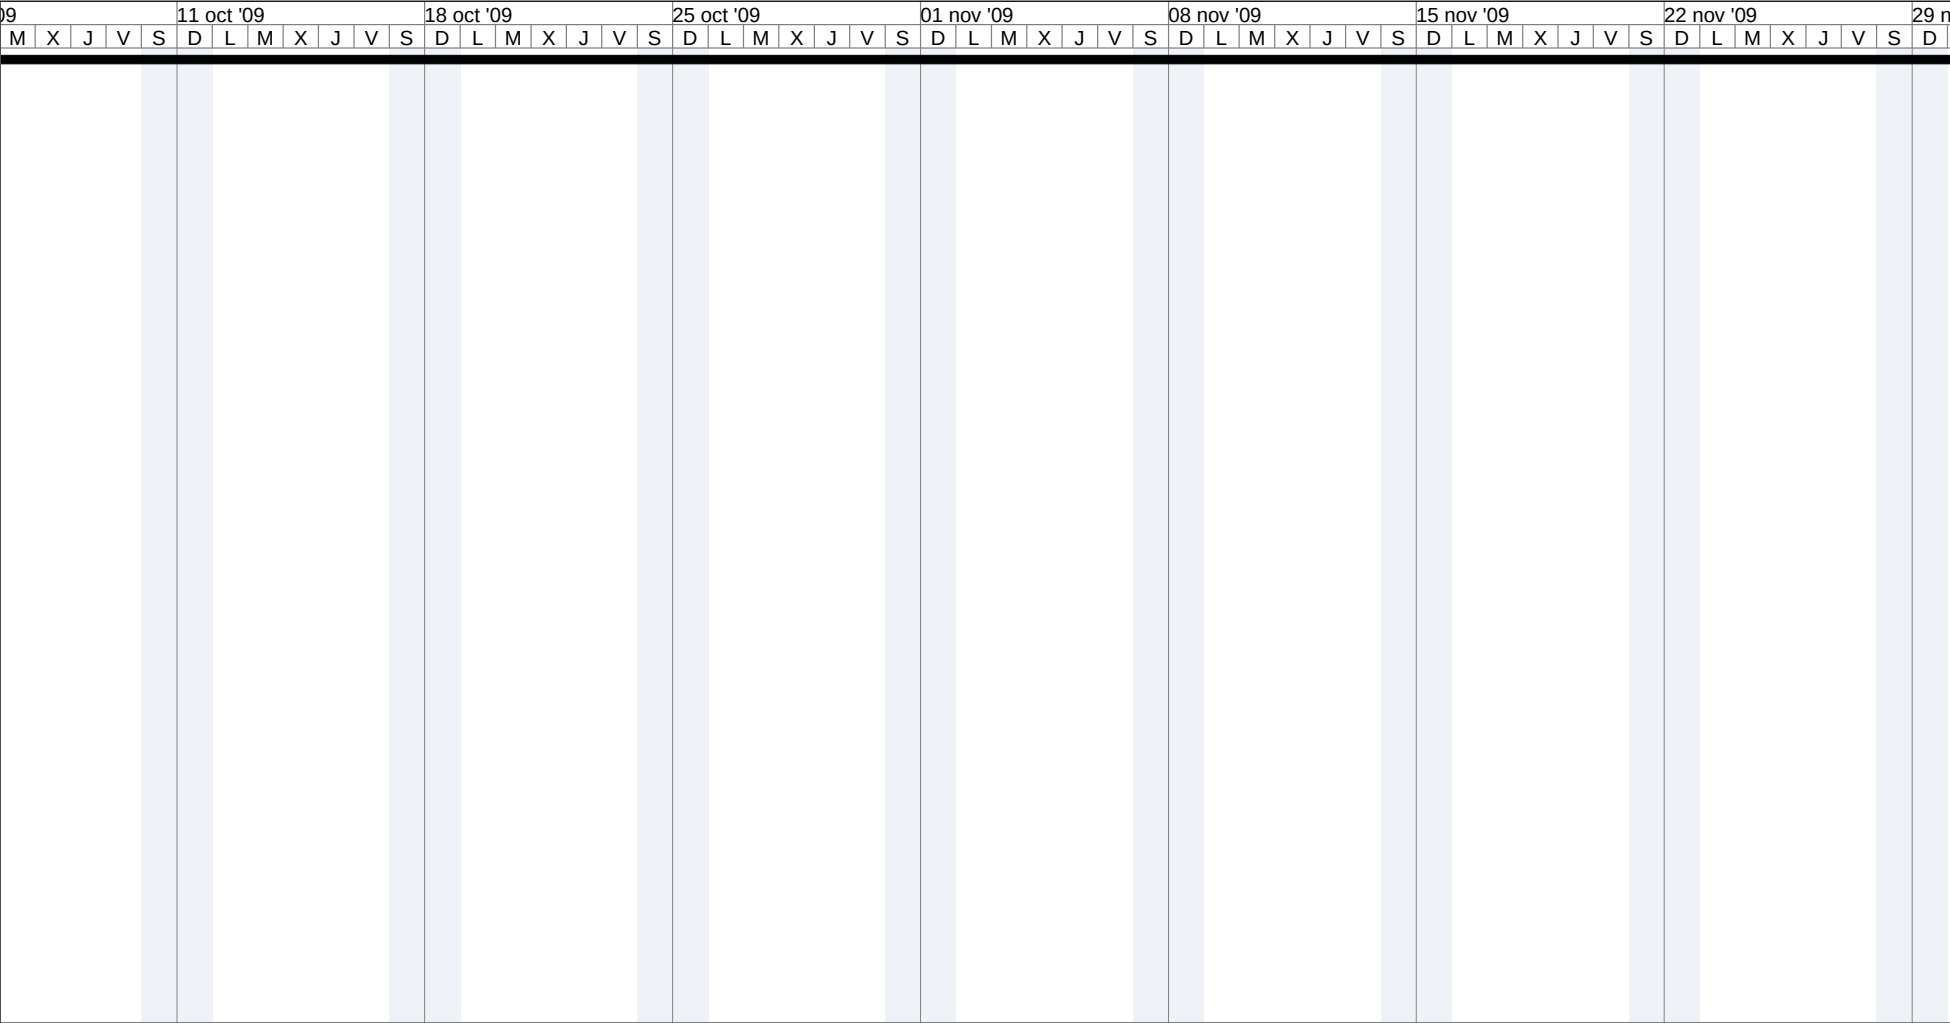

Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External MileTask

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual


Resumen manual

Sólo el comienzo


Sólo fin

Progress

Split

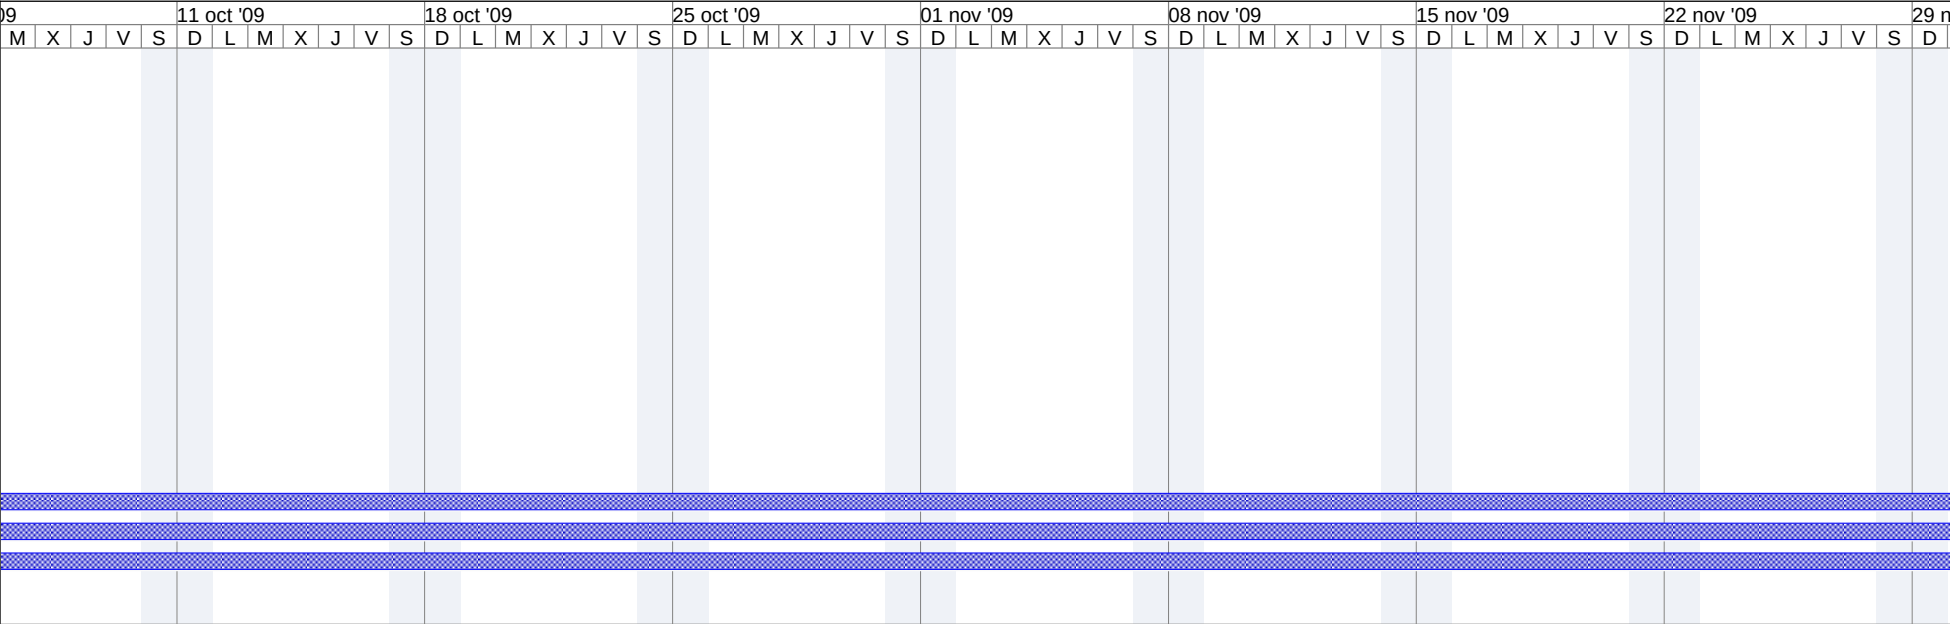

Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

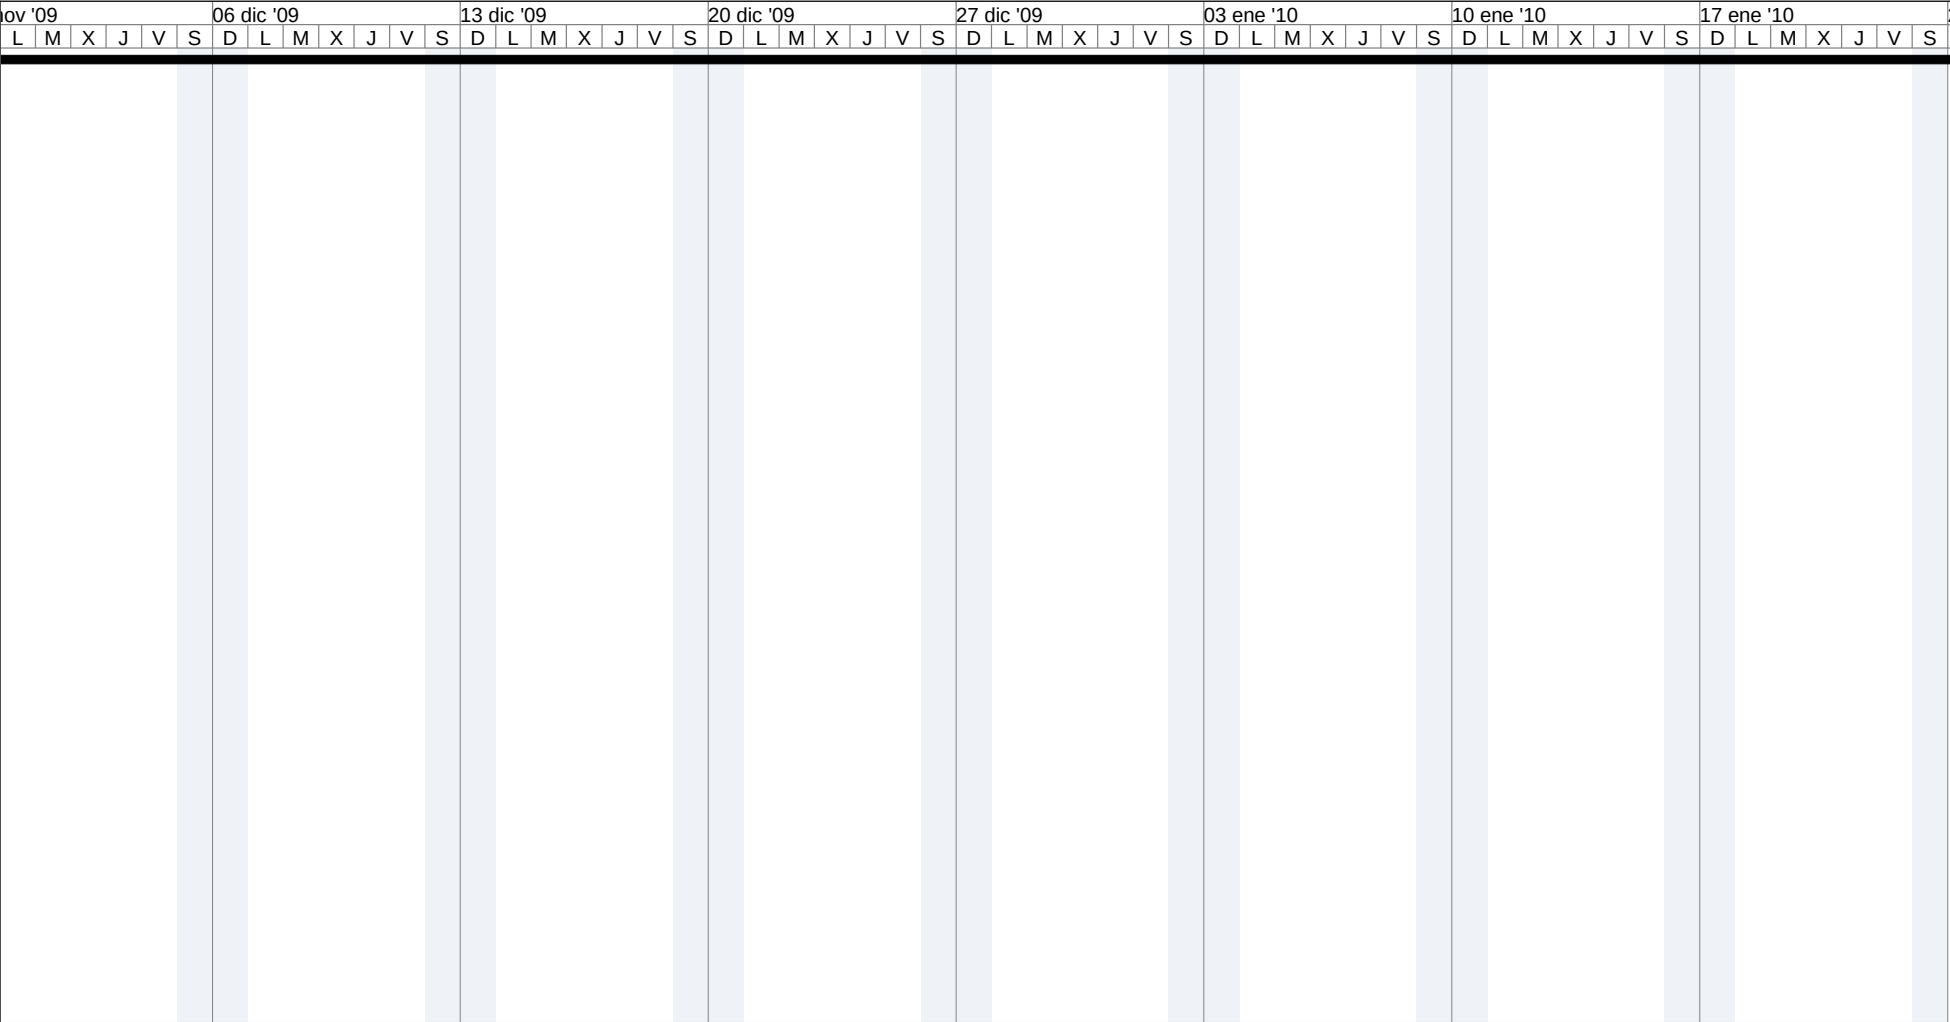

Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External MileTask

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual


Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin


Progress

Split

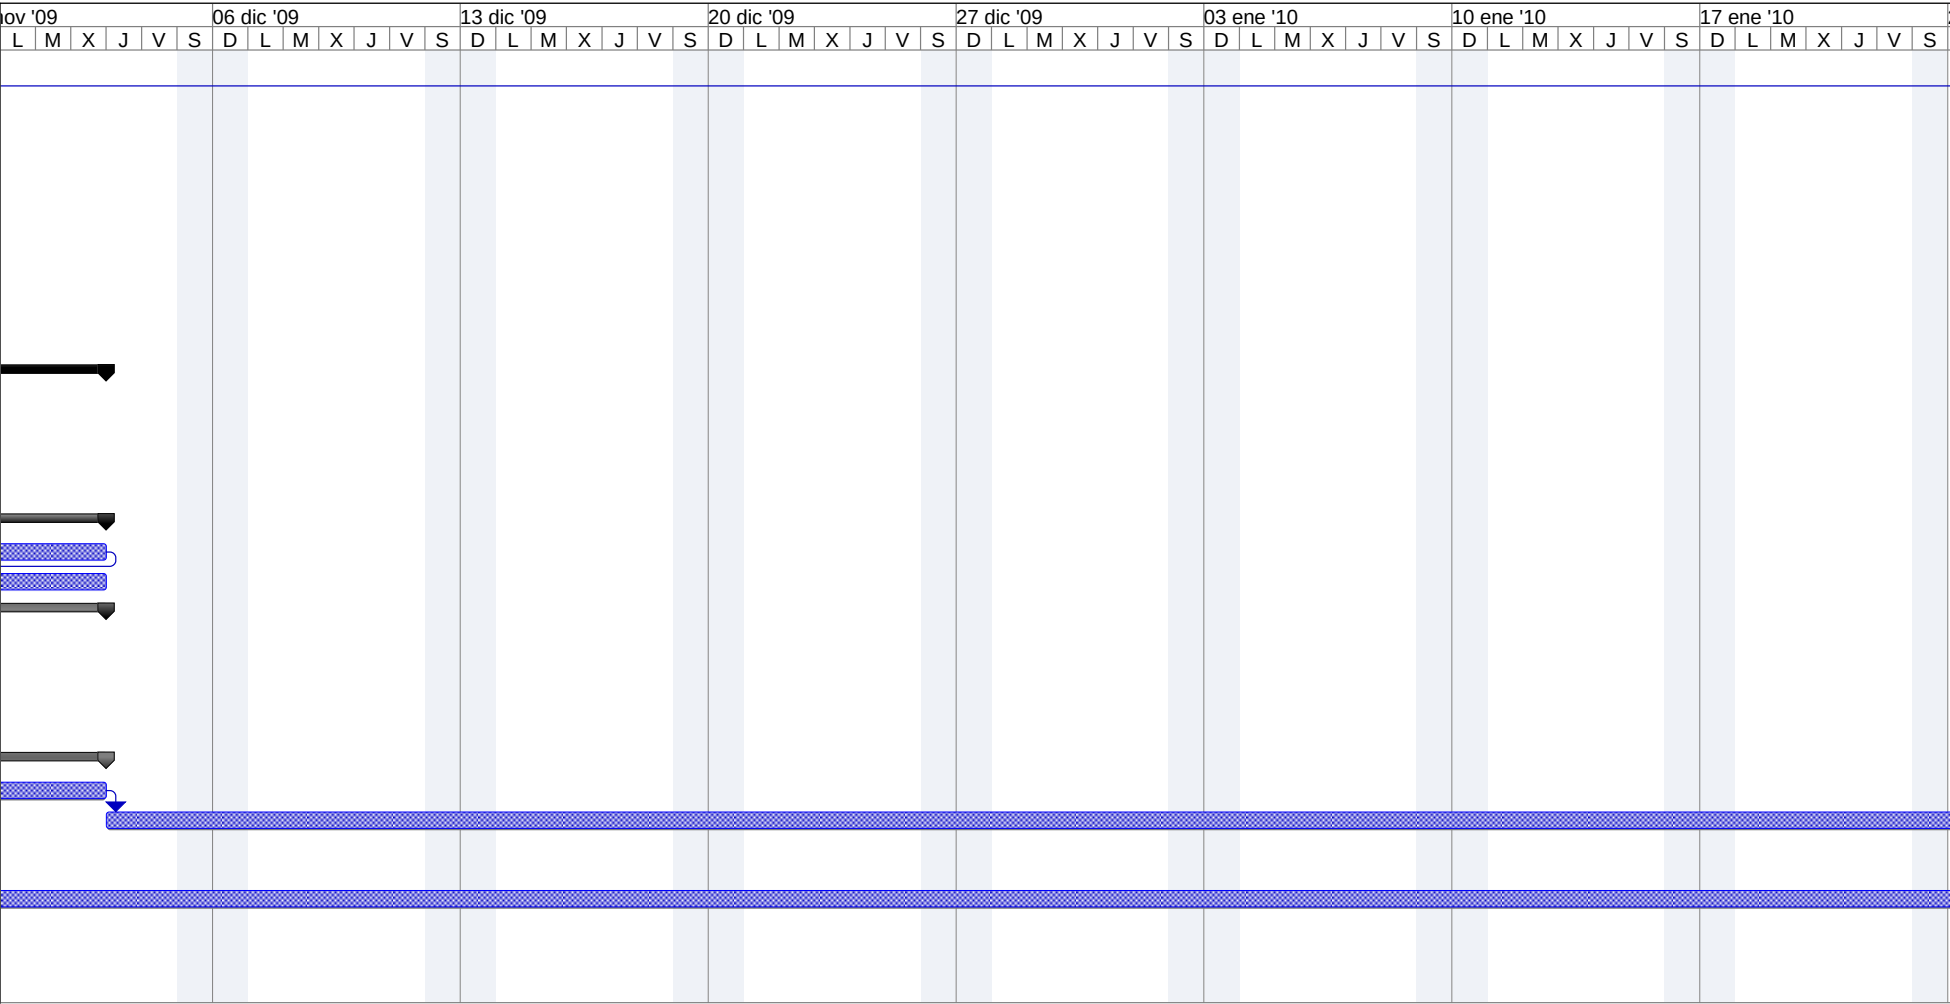


Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
Project Summary		Tarea manual		Progress	
External Tasks		Sólo duración		Split	

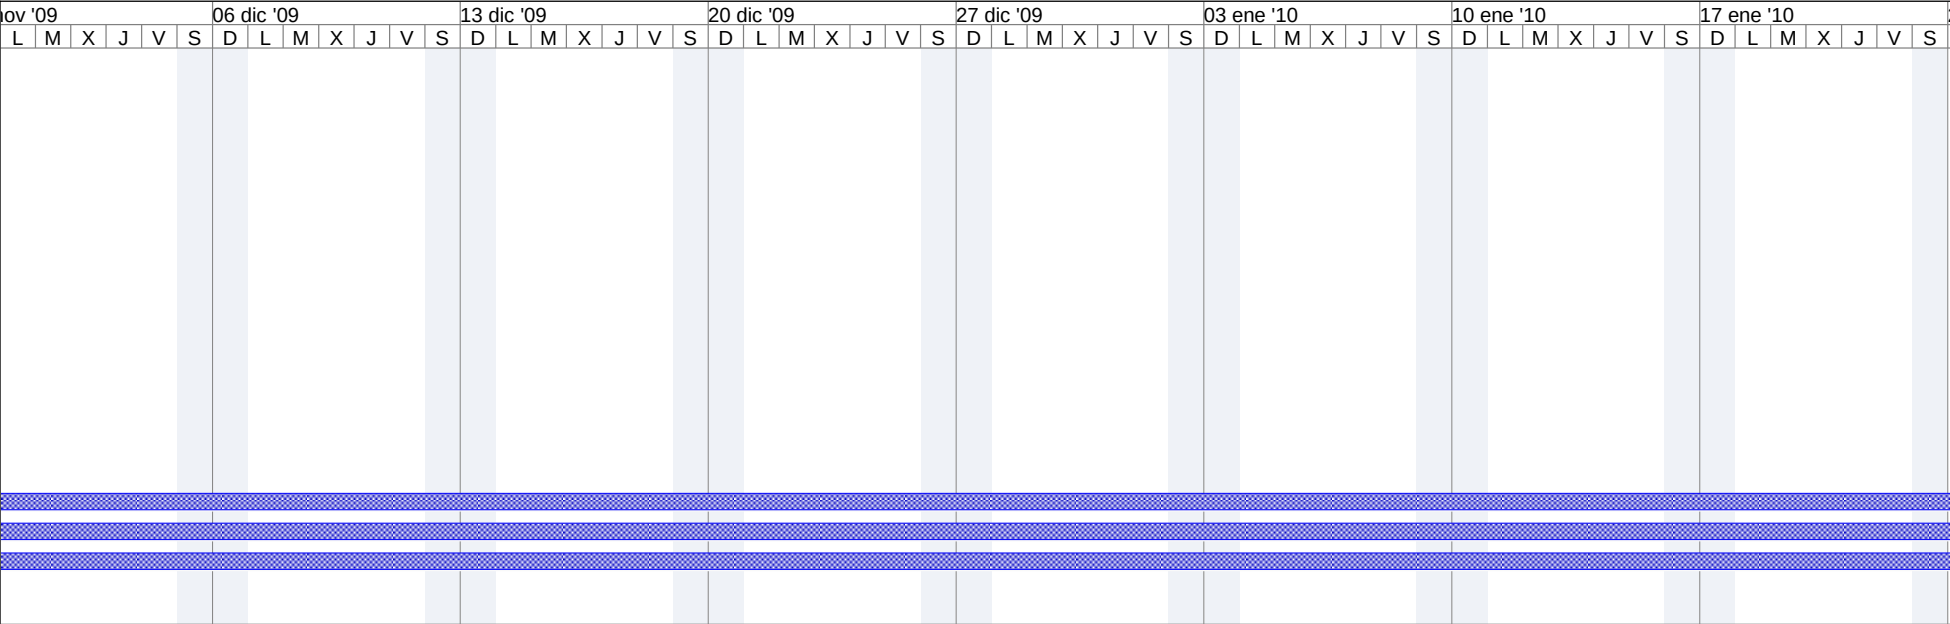


Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

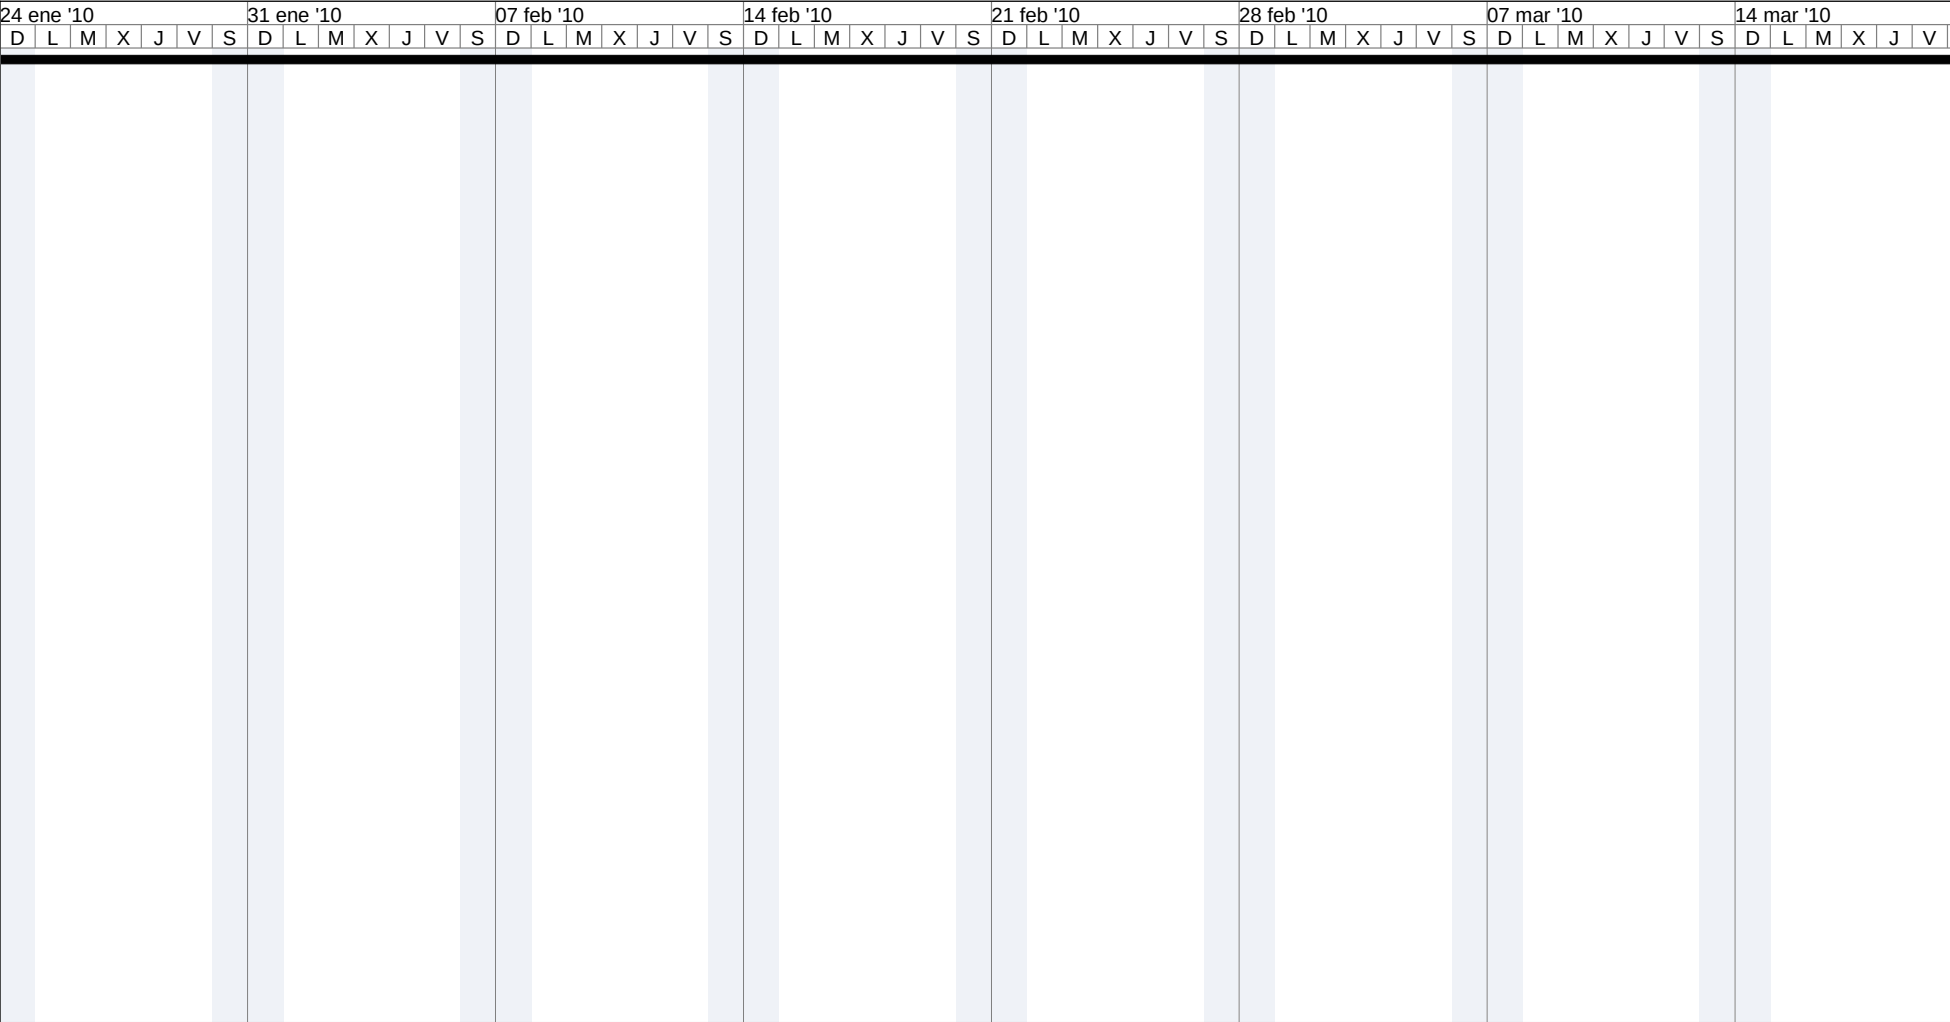


Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16


Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
Project Summary		Tarea manual		Progress	
External Tasks		Sólo duración		Split	

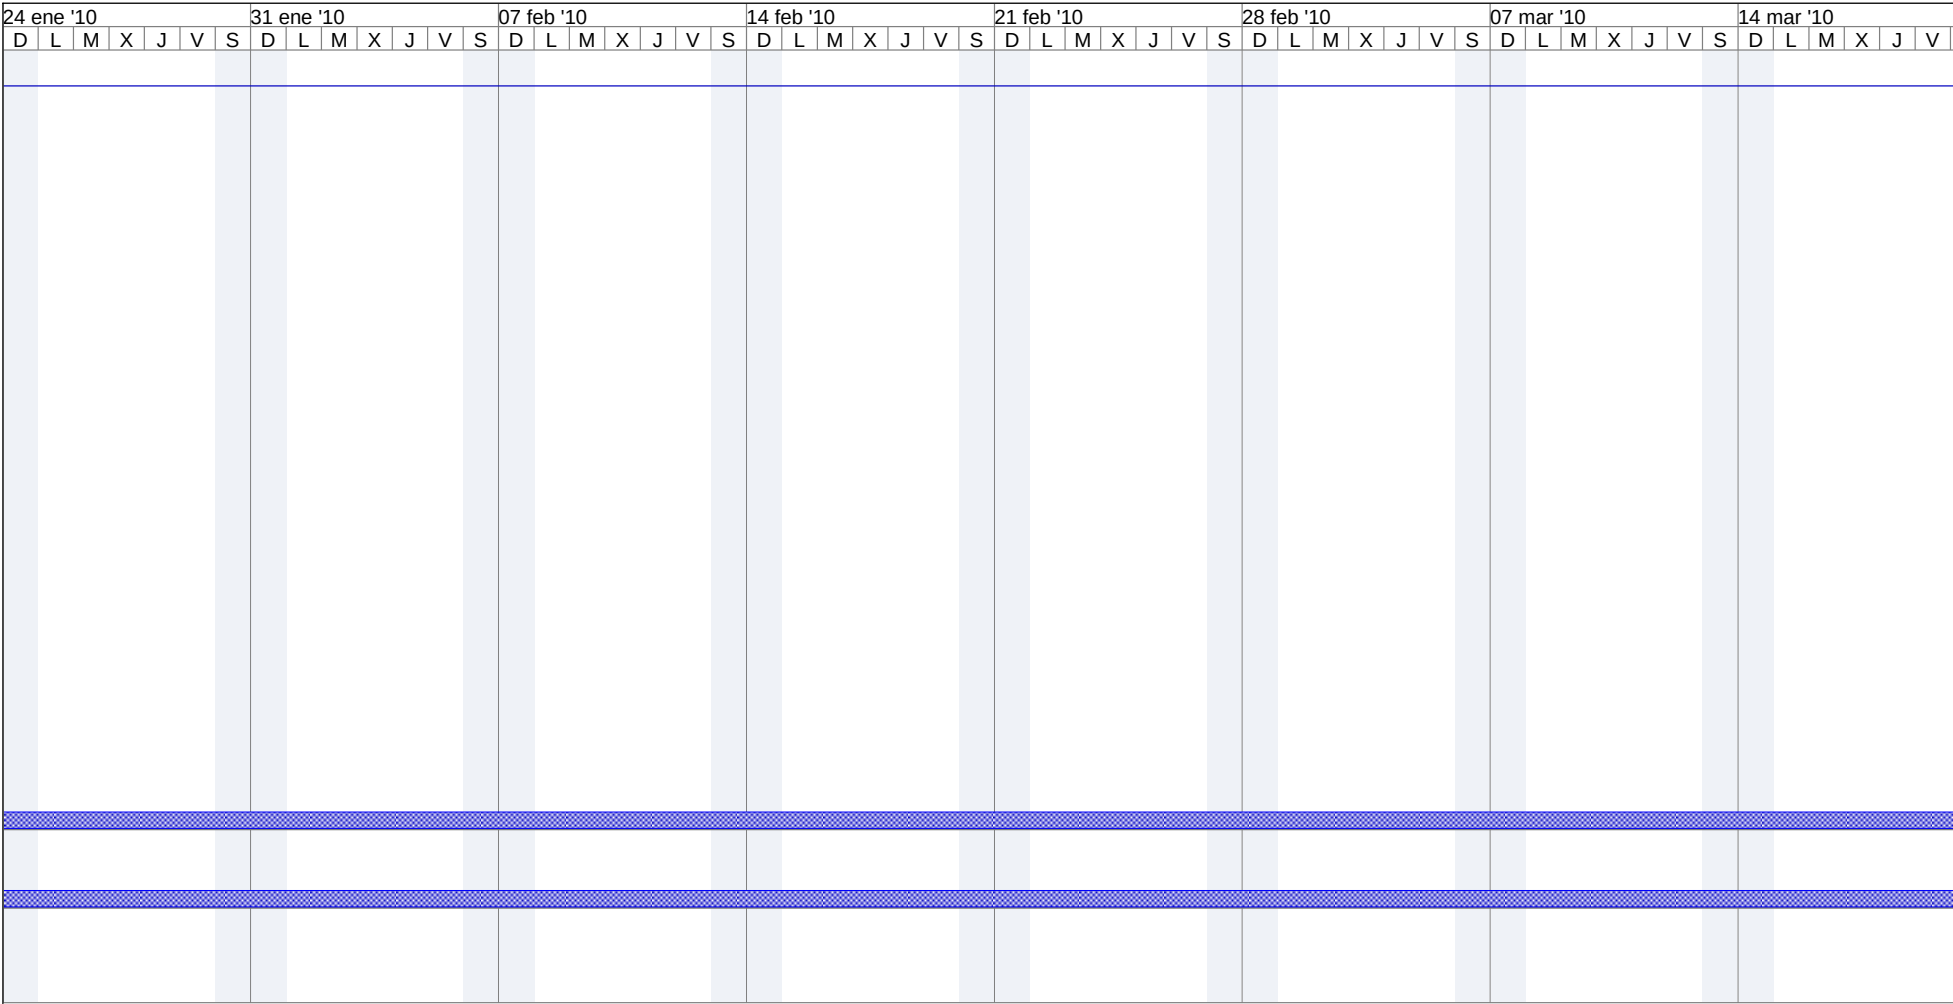

Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

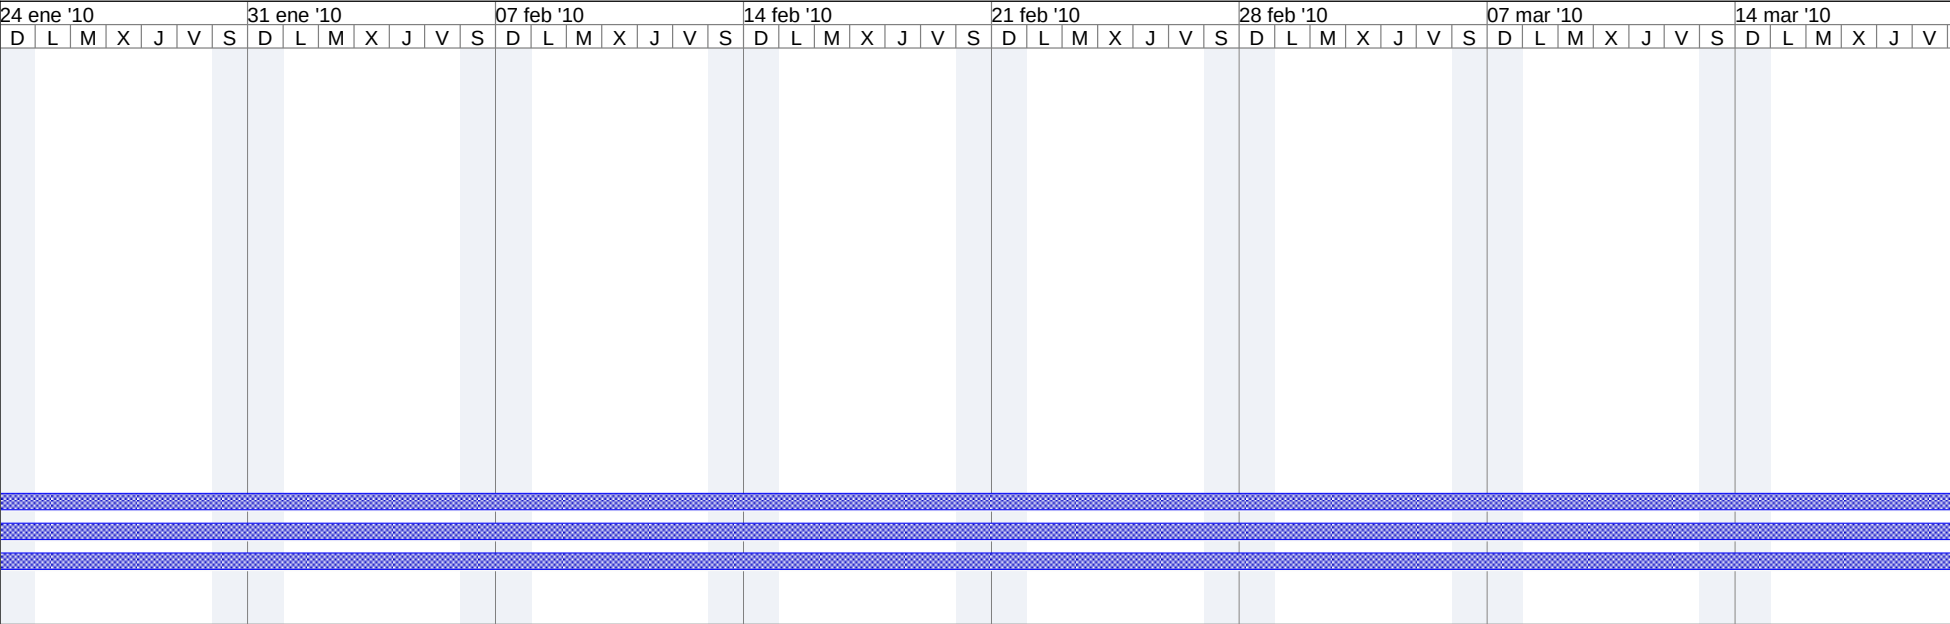

Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

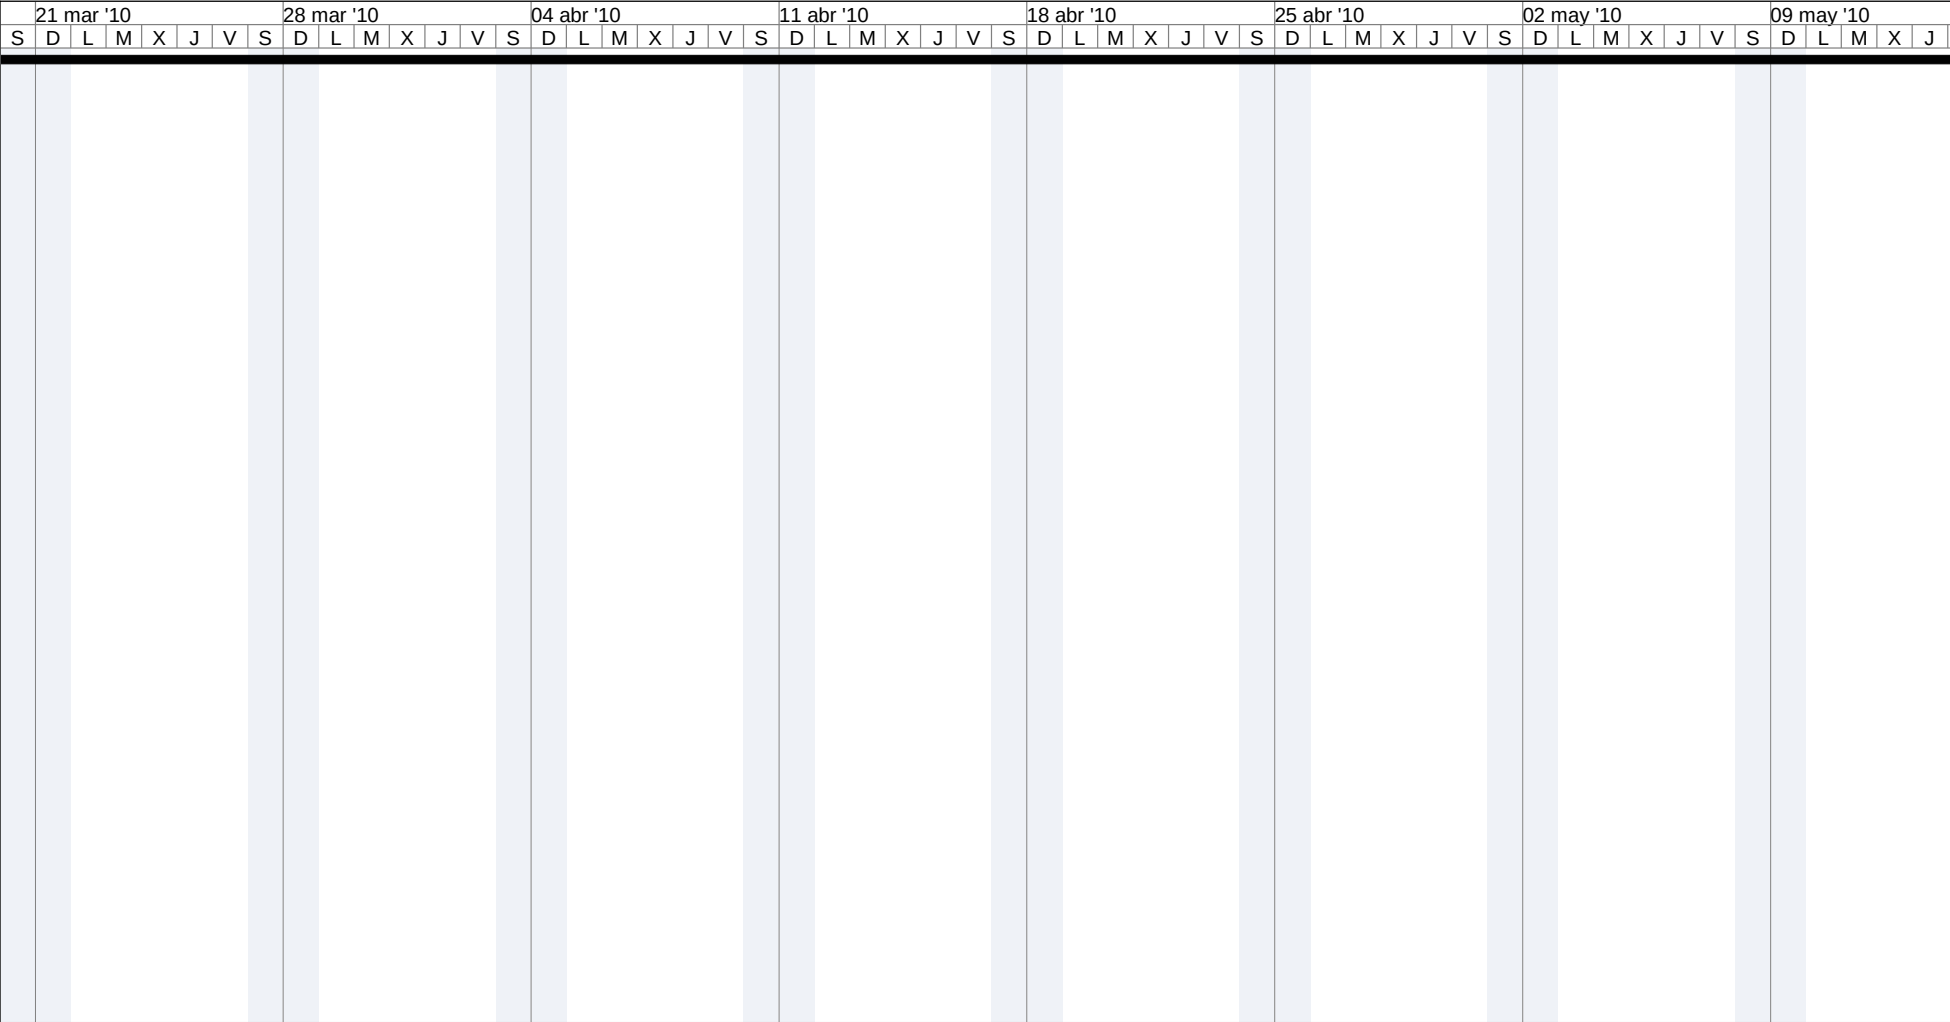

Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External MileTask

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual


Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin


Progress

Split

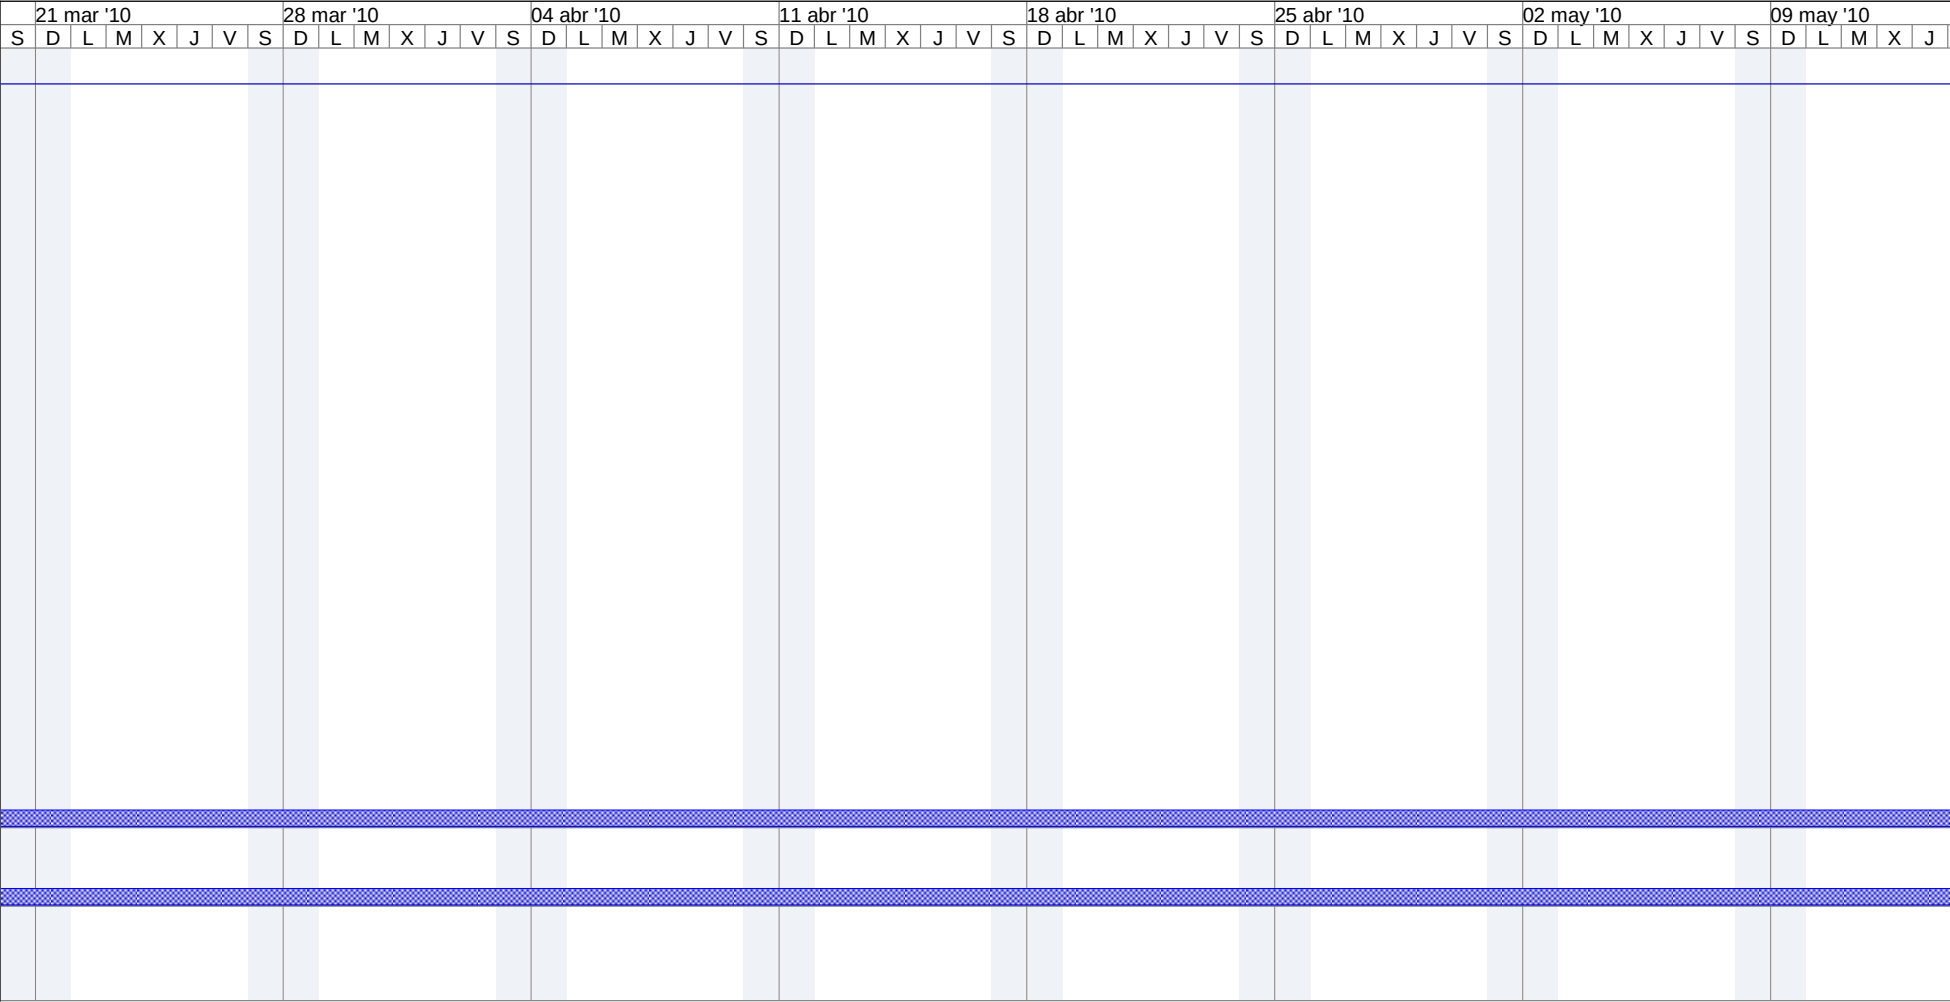

Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
Project Summary		Tarea manual		Progress	
External Tasks		Sólo duración		Split	

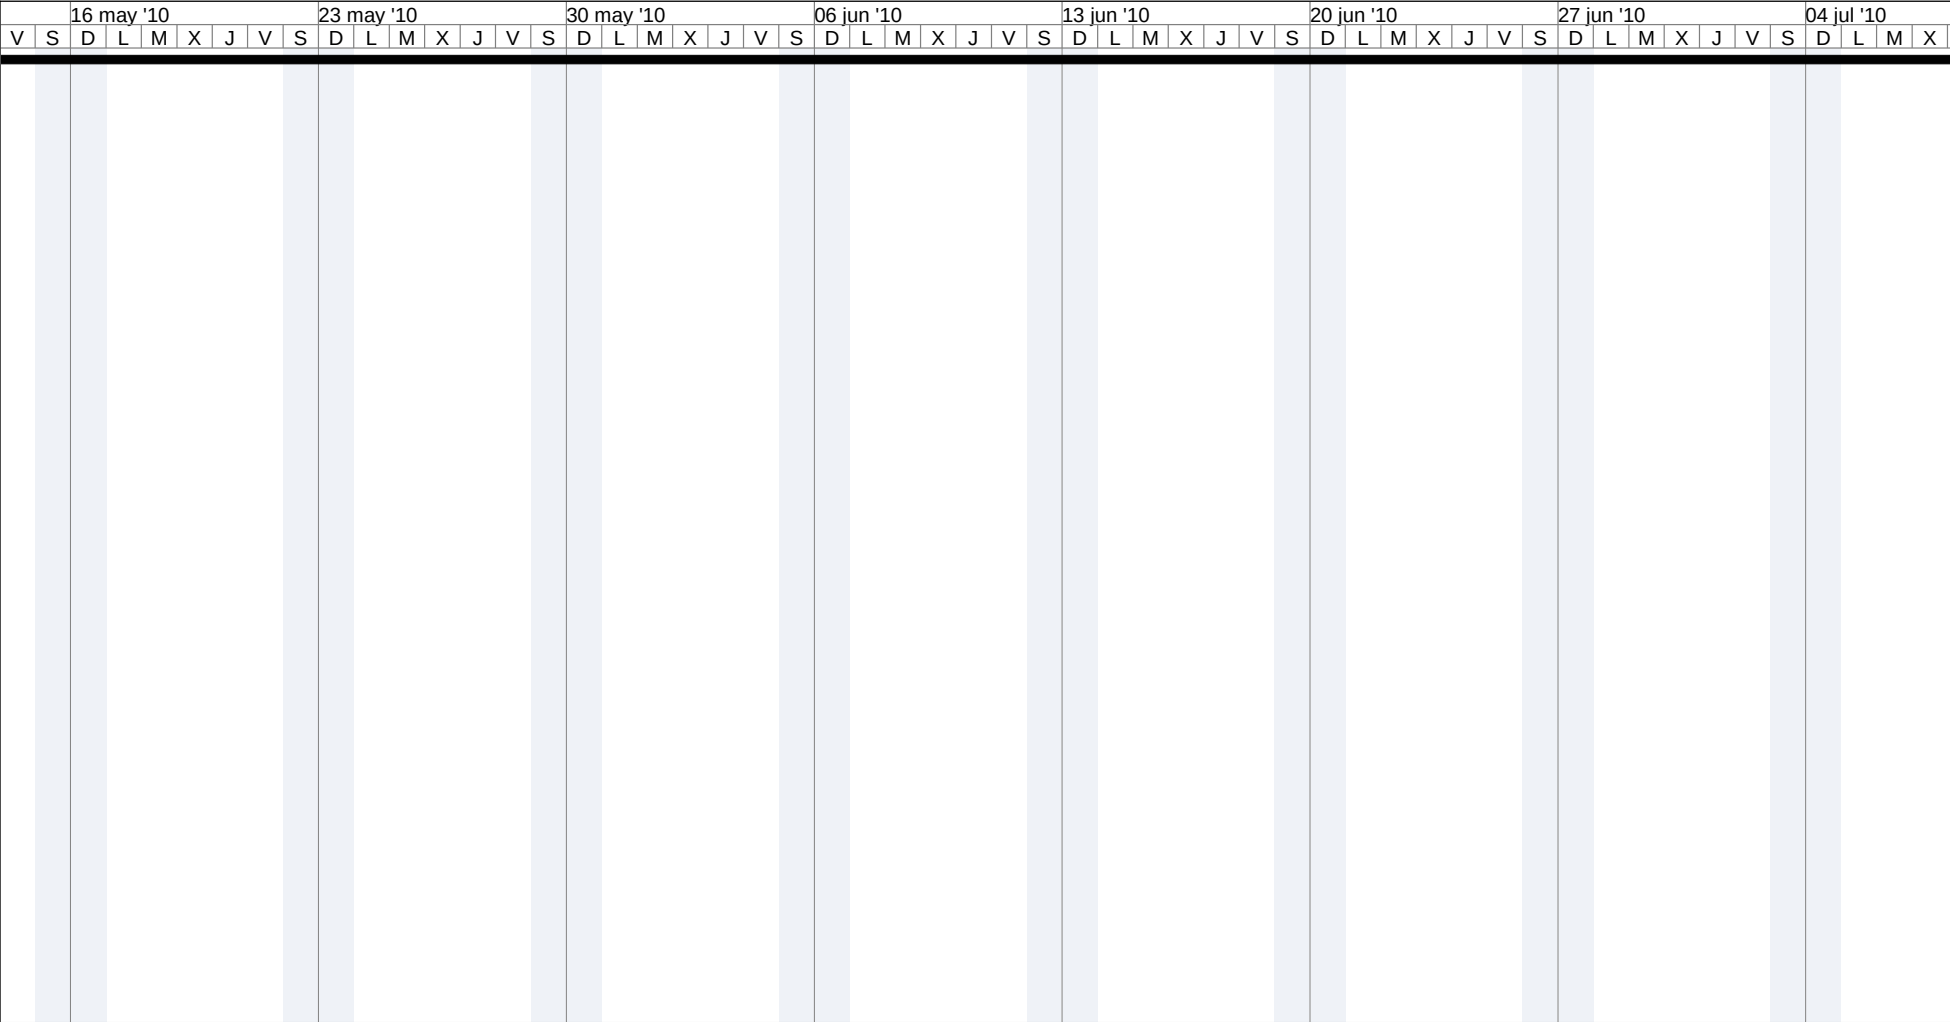

Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External MileTask

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual


Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin


Progress

Split

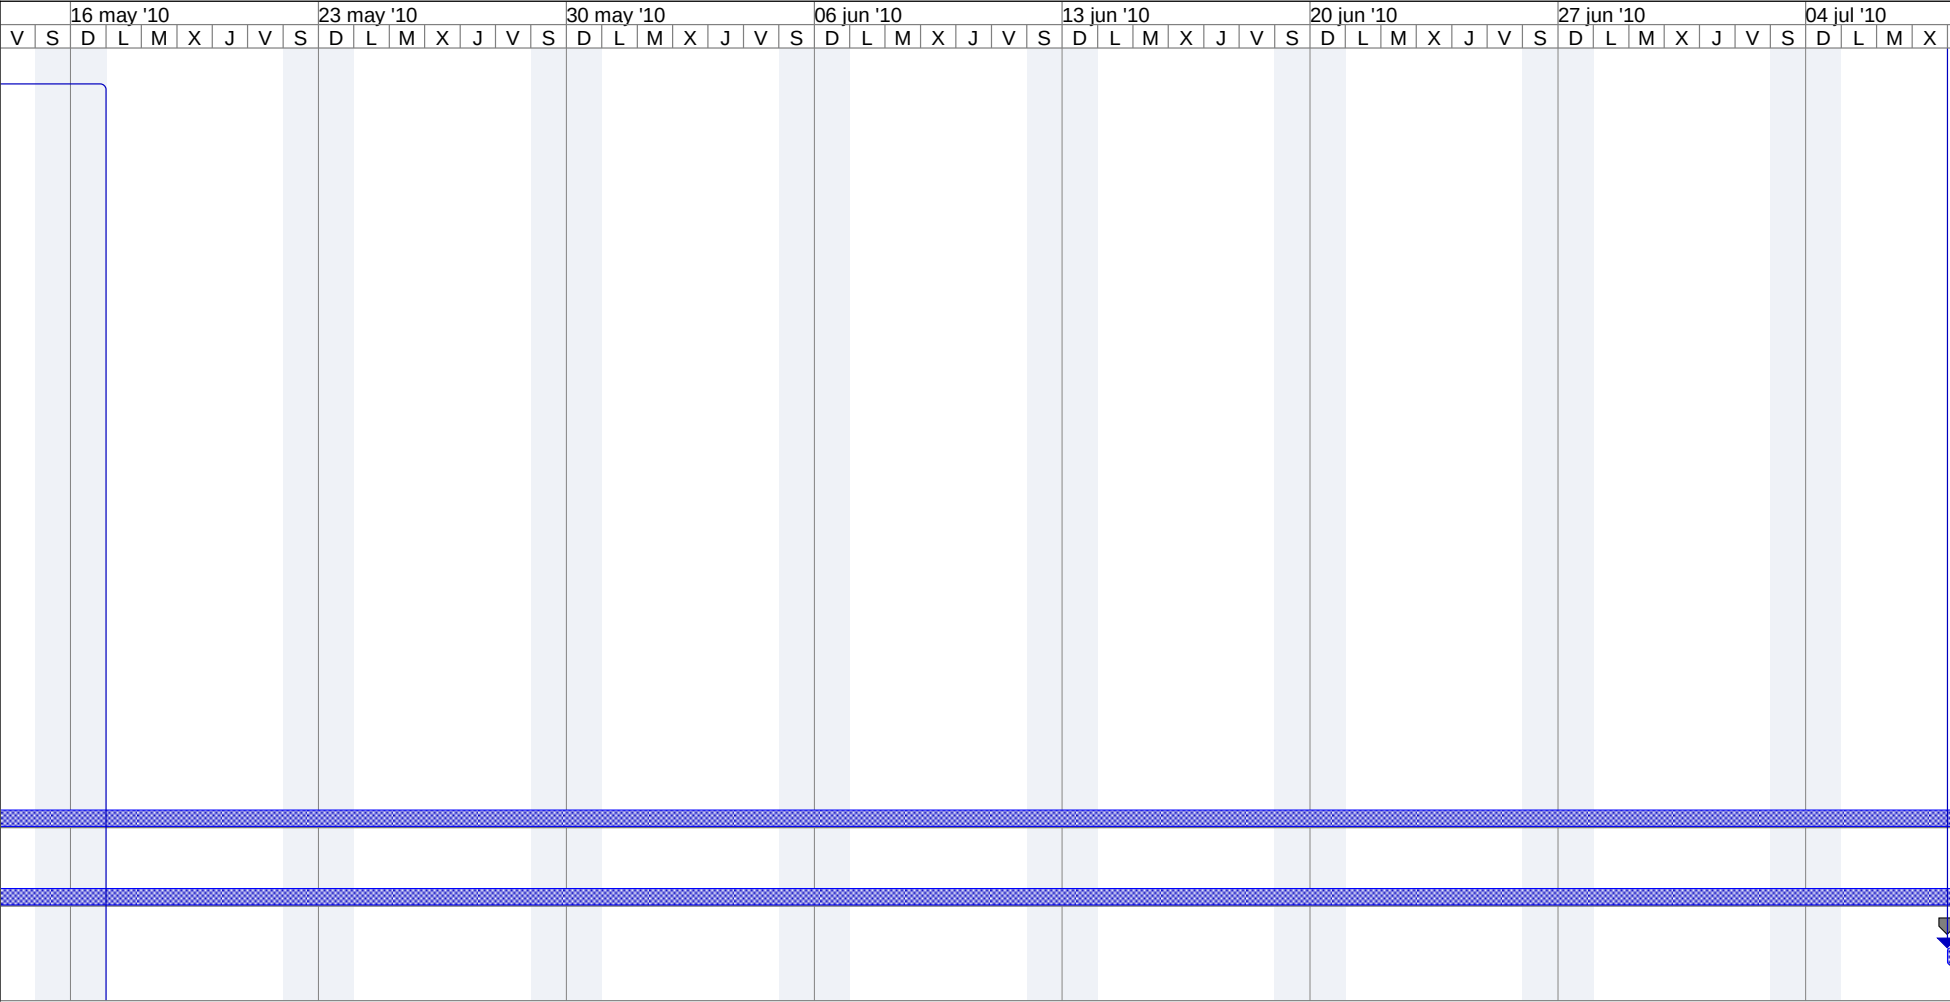

Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16


Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
Project Summary		Tarea manual		Progress	
External Tasks		Sólo duración		Split	

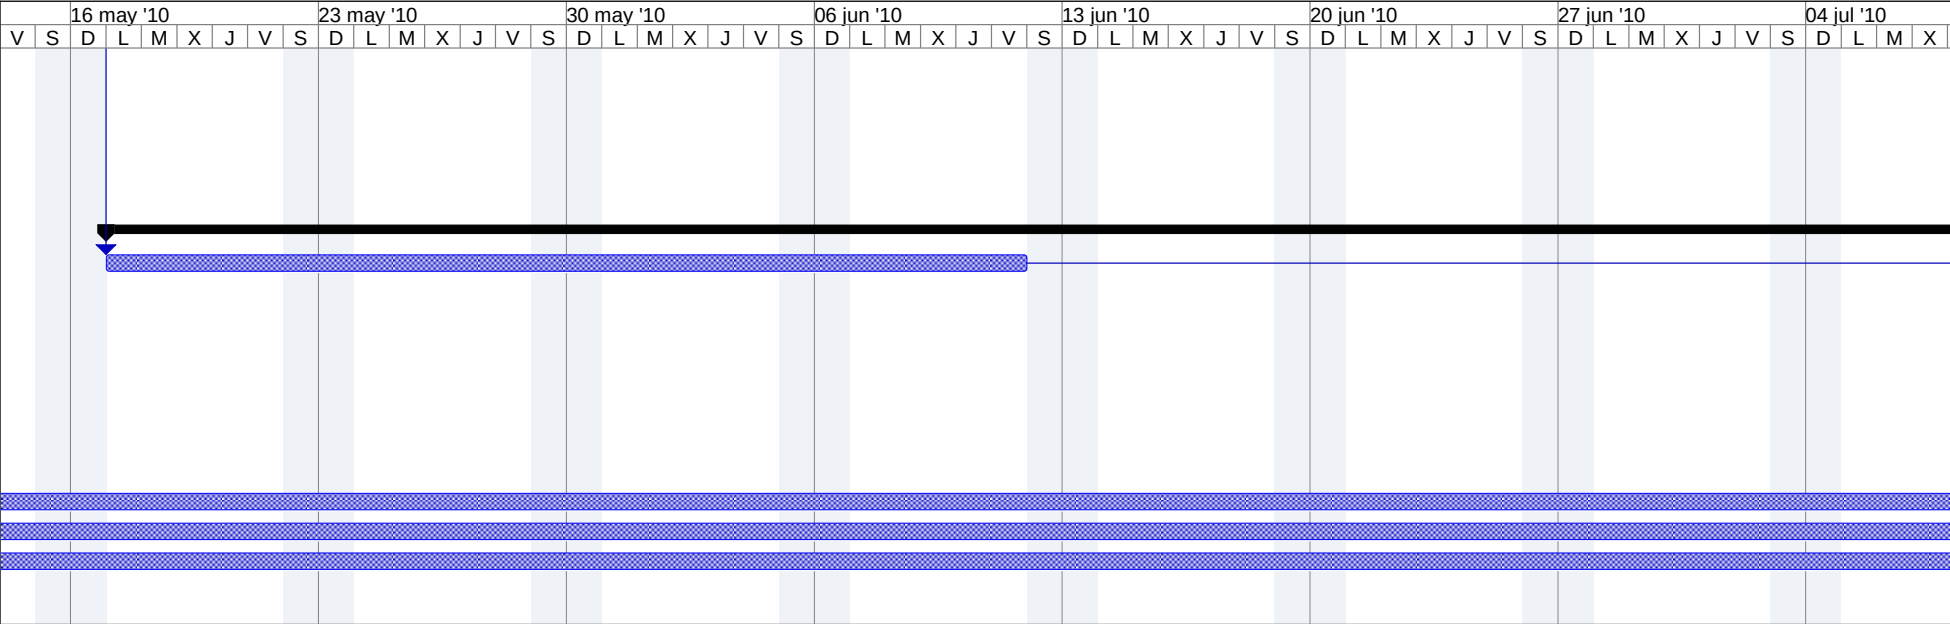

Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

[illegible]

Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

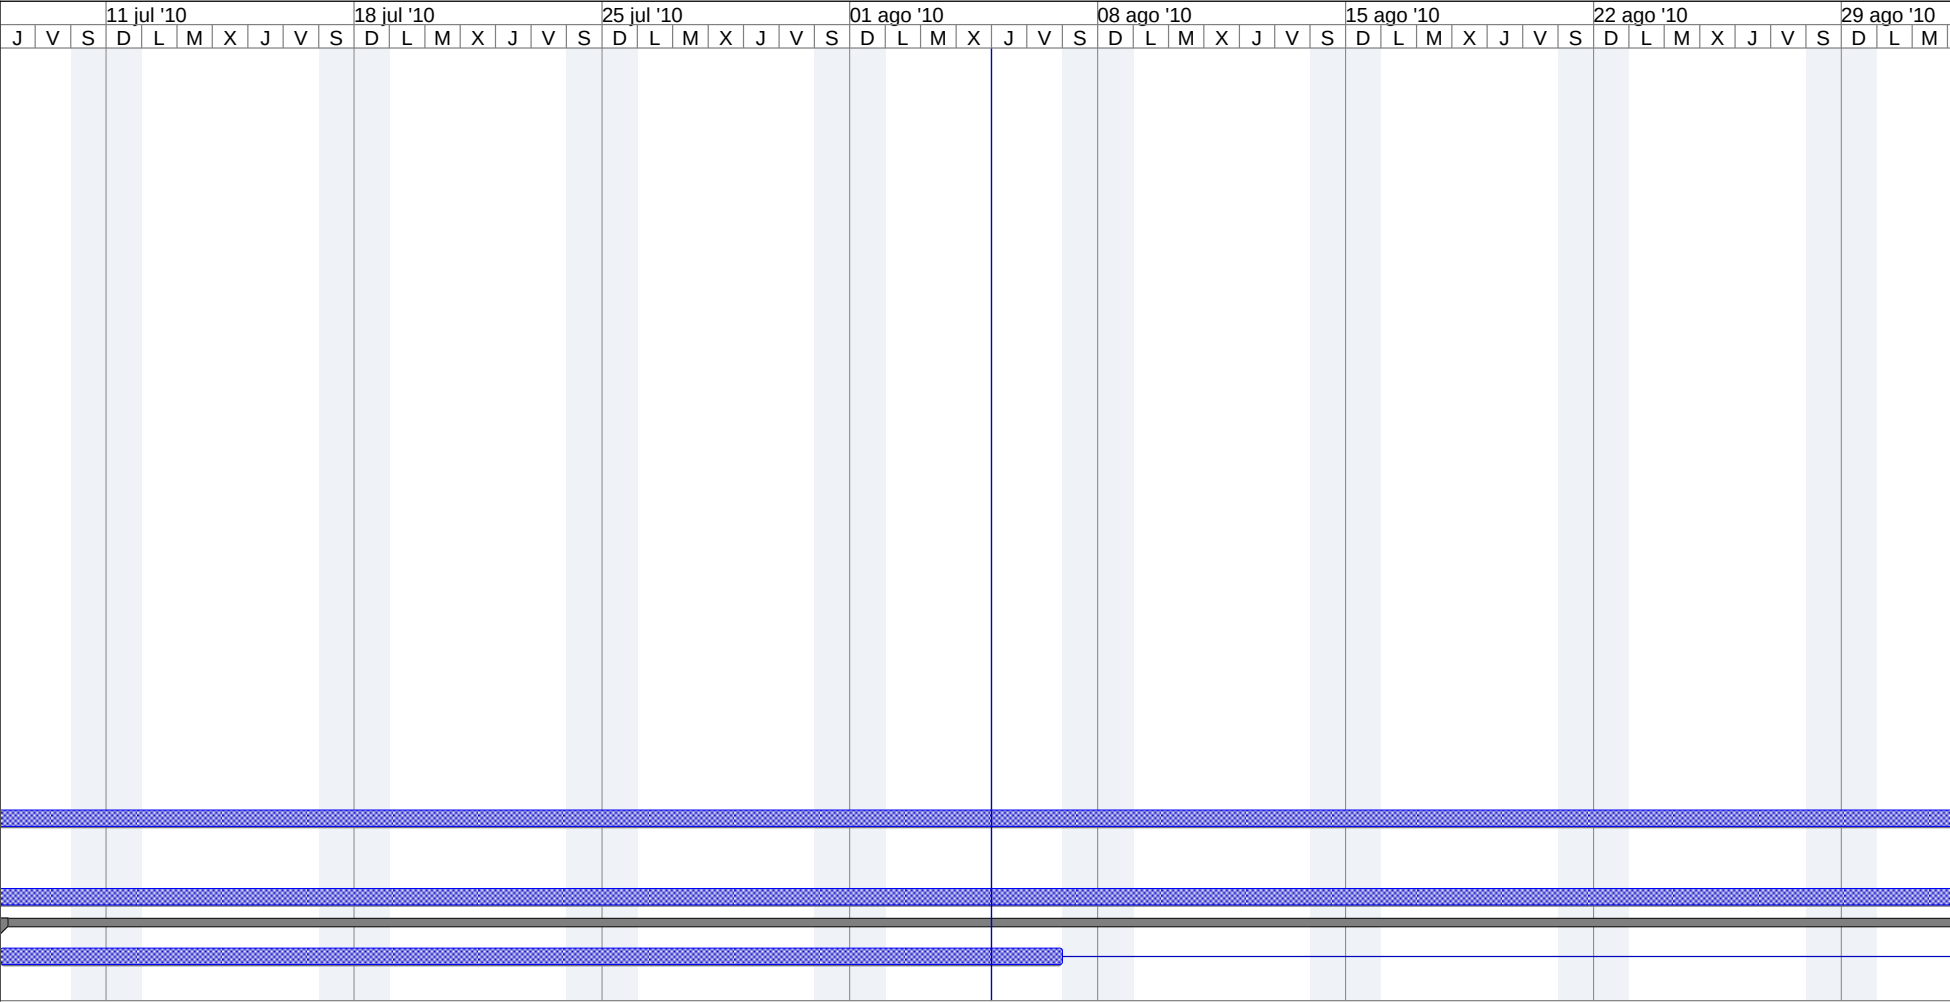


Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
Project Summary		Tarea manual		Progress	
External Tasks		Sólo duración		Split	


[illegible]

Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

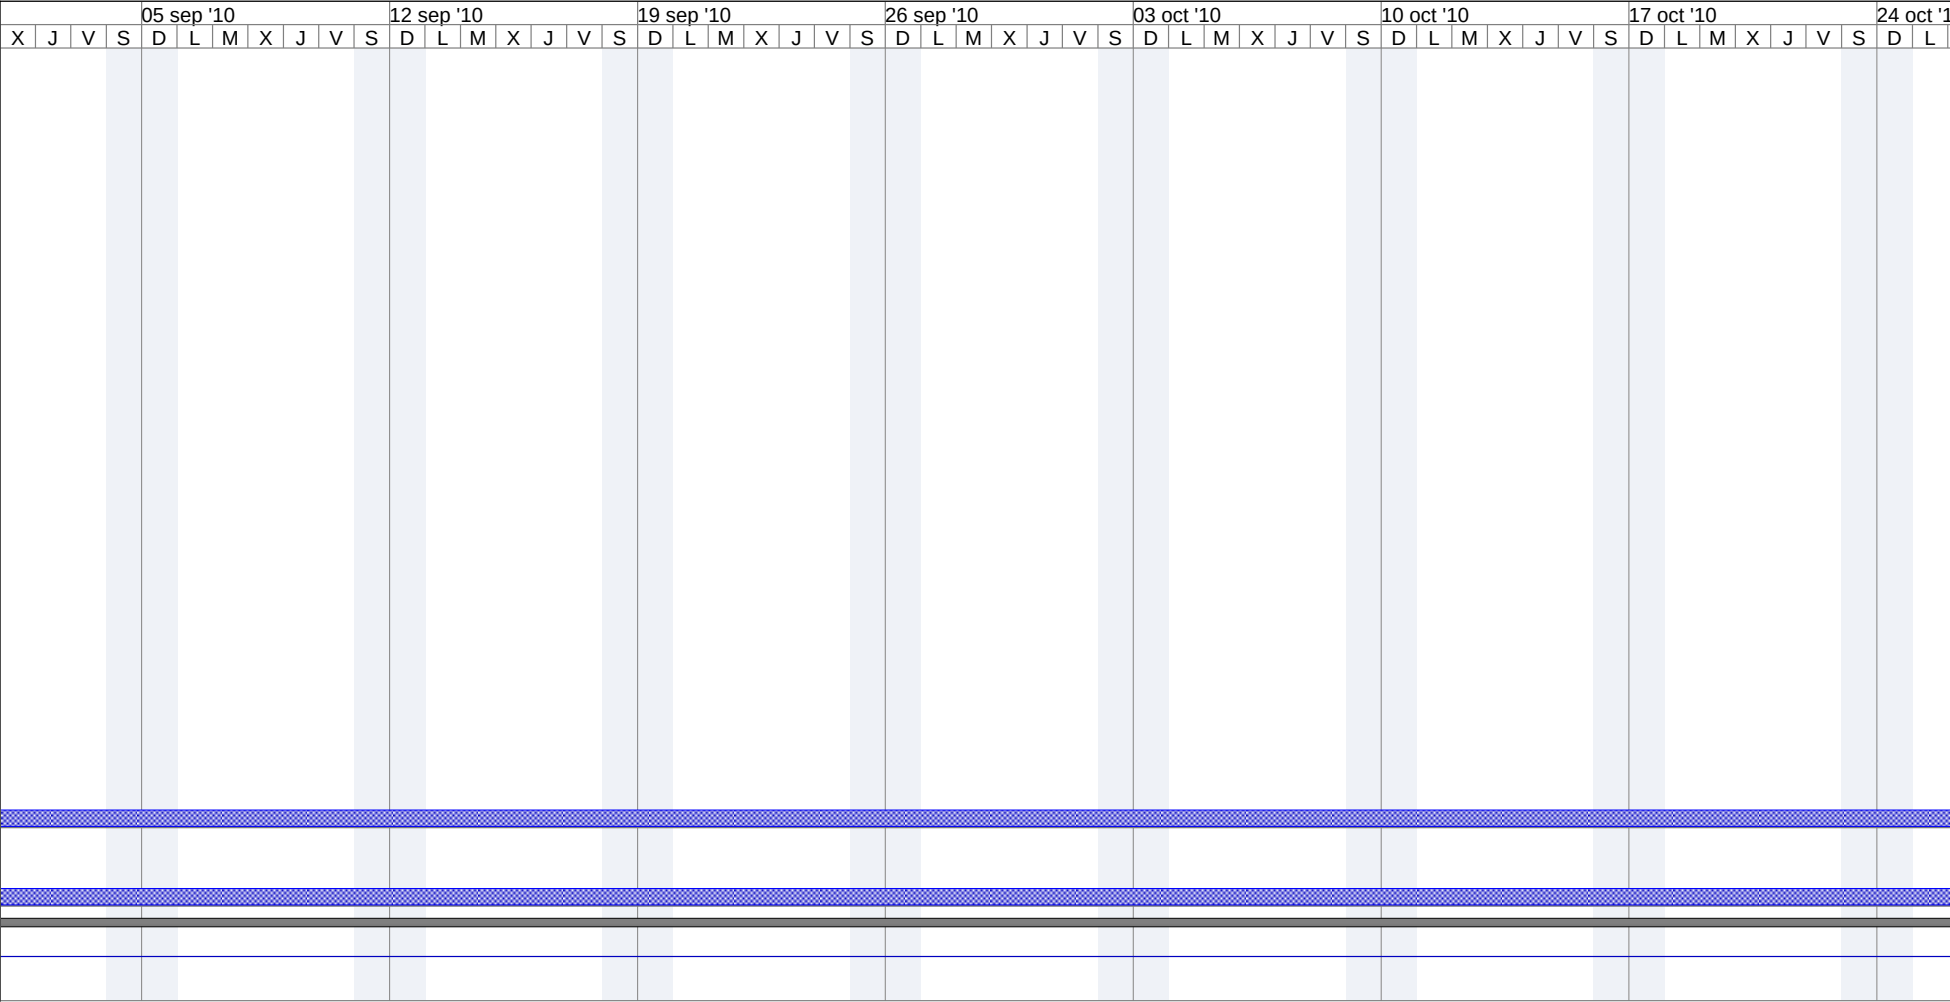

Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
Project Summary		Tarea manual		Progress	
External Tasks		Sólo duración		Split	

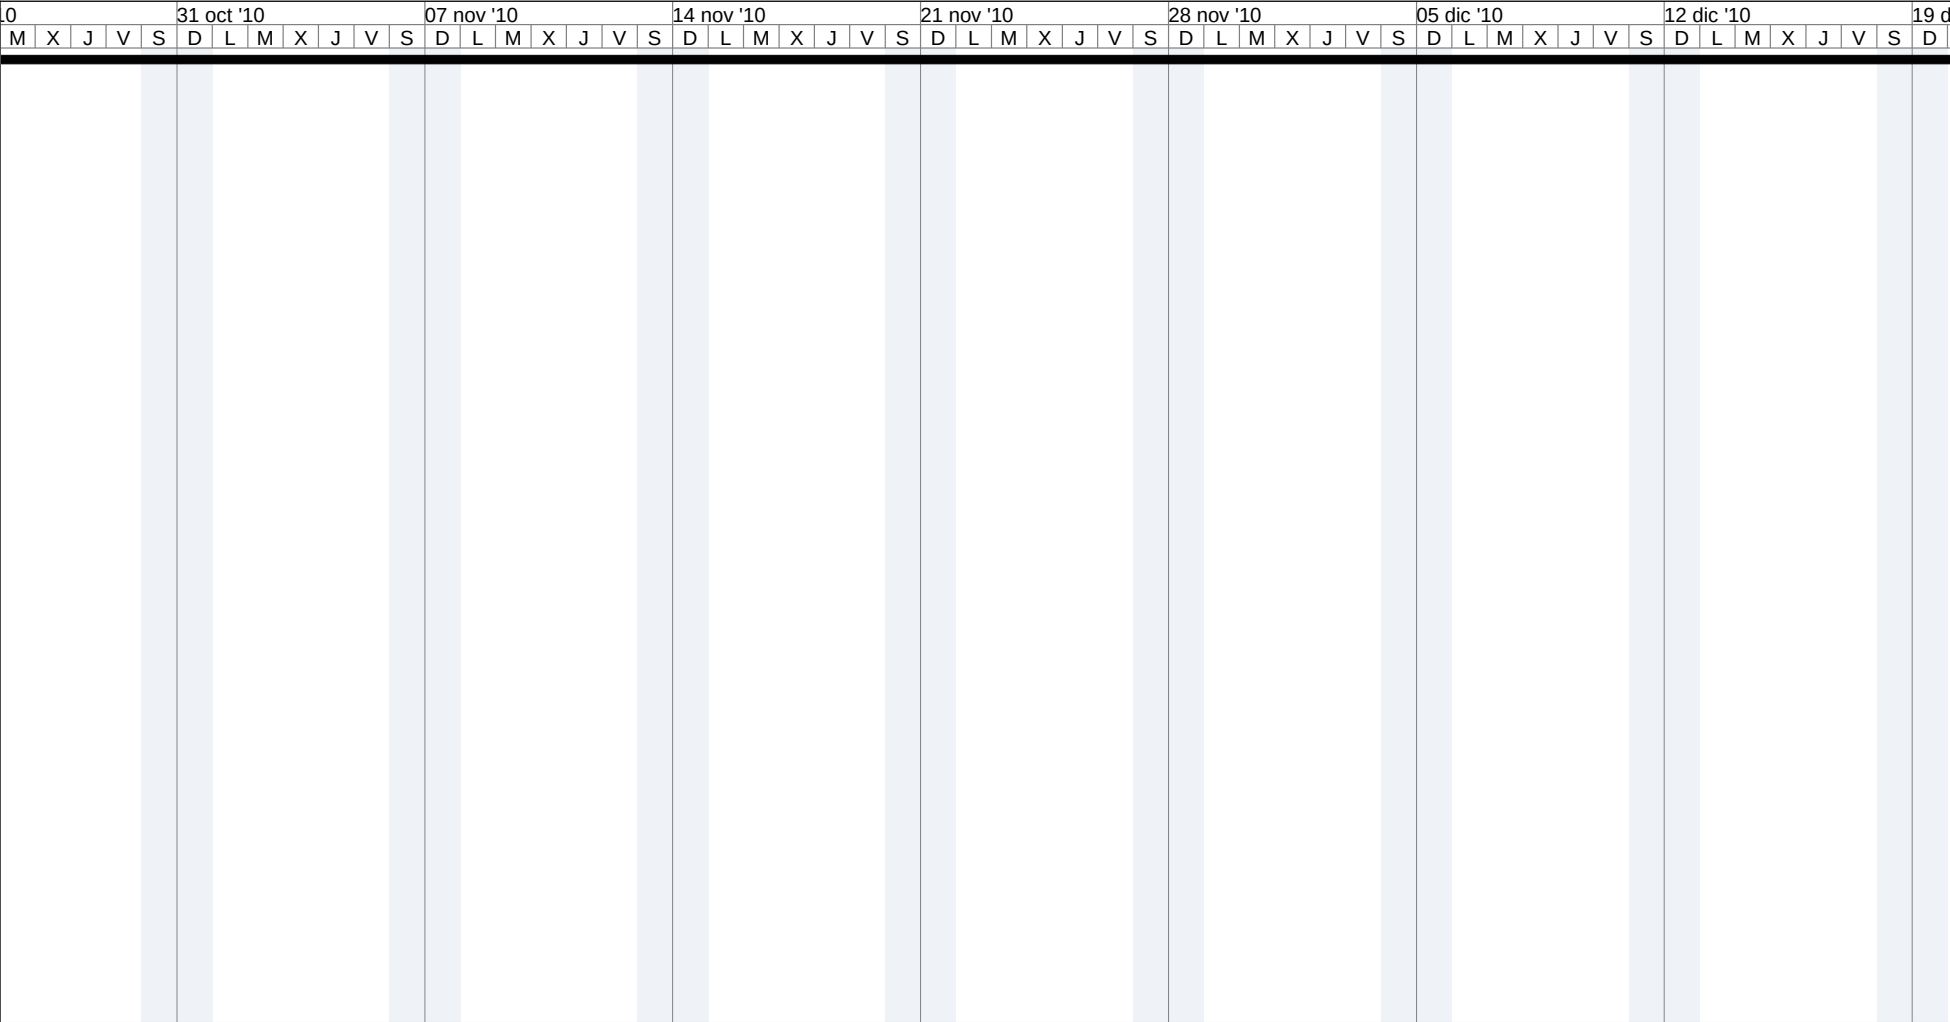

Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External MileTask

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual


Resumen manual

Sólo el comienzo


Sólo fin

Progress

Split

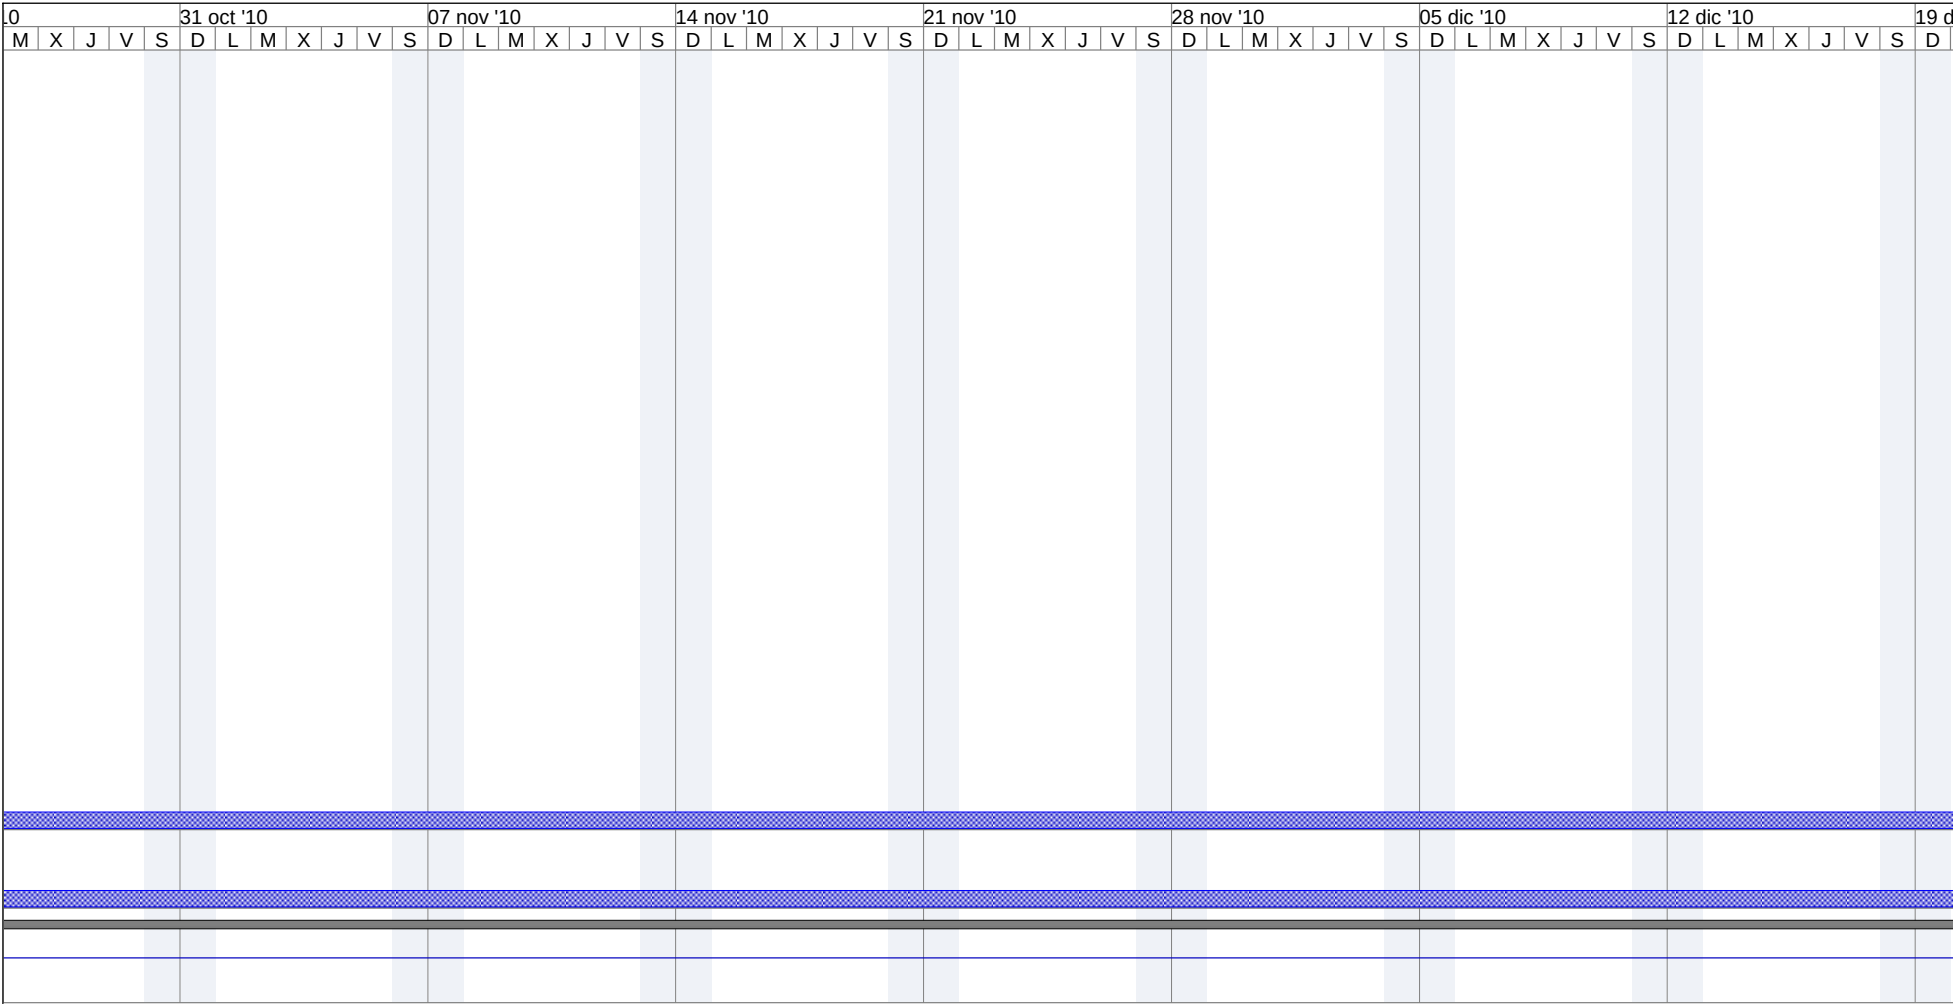

Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

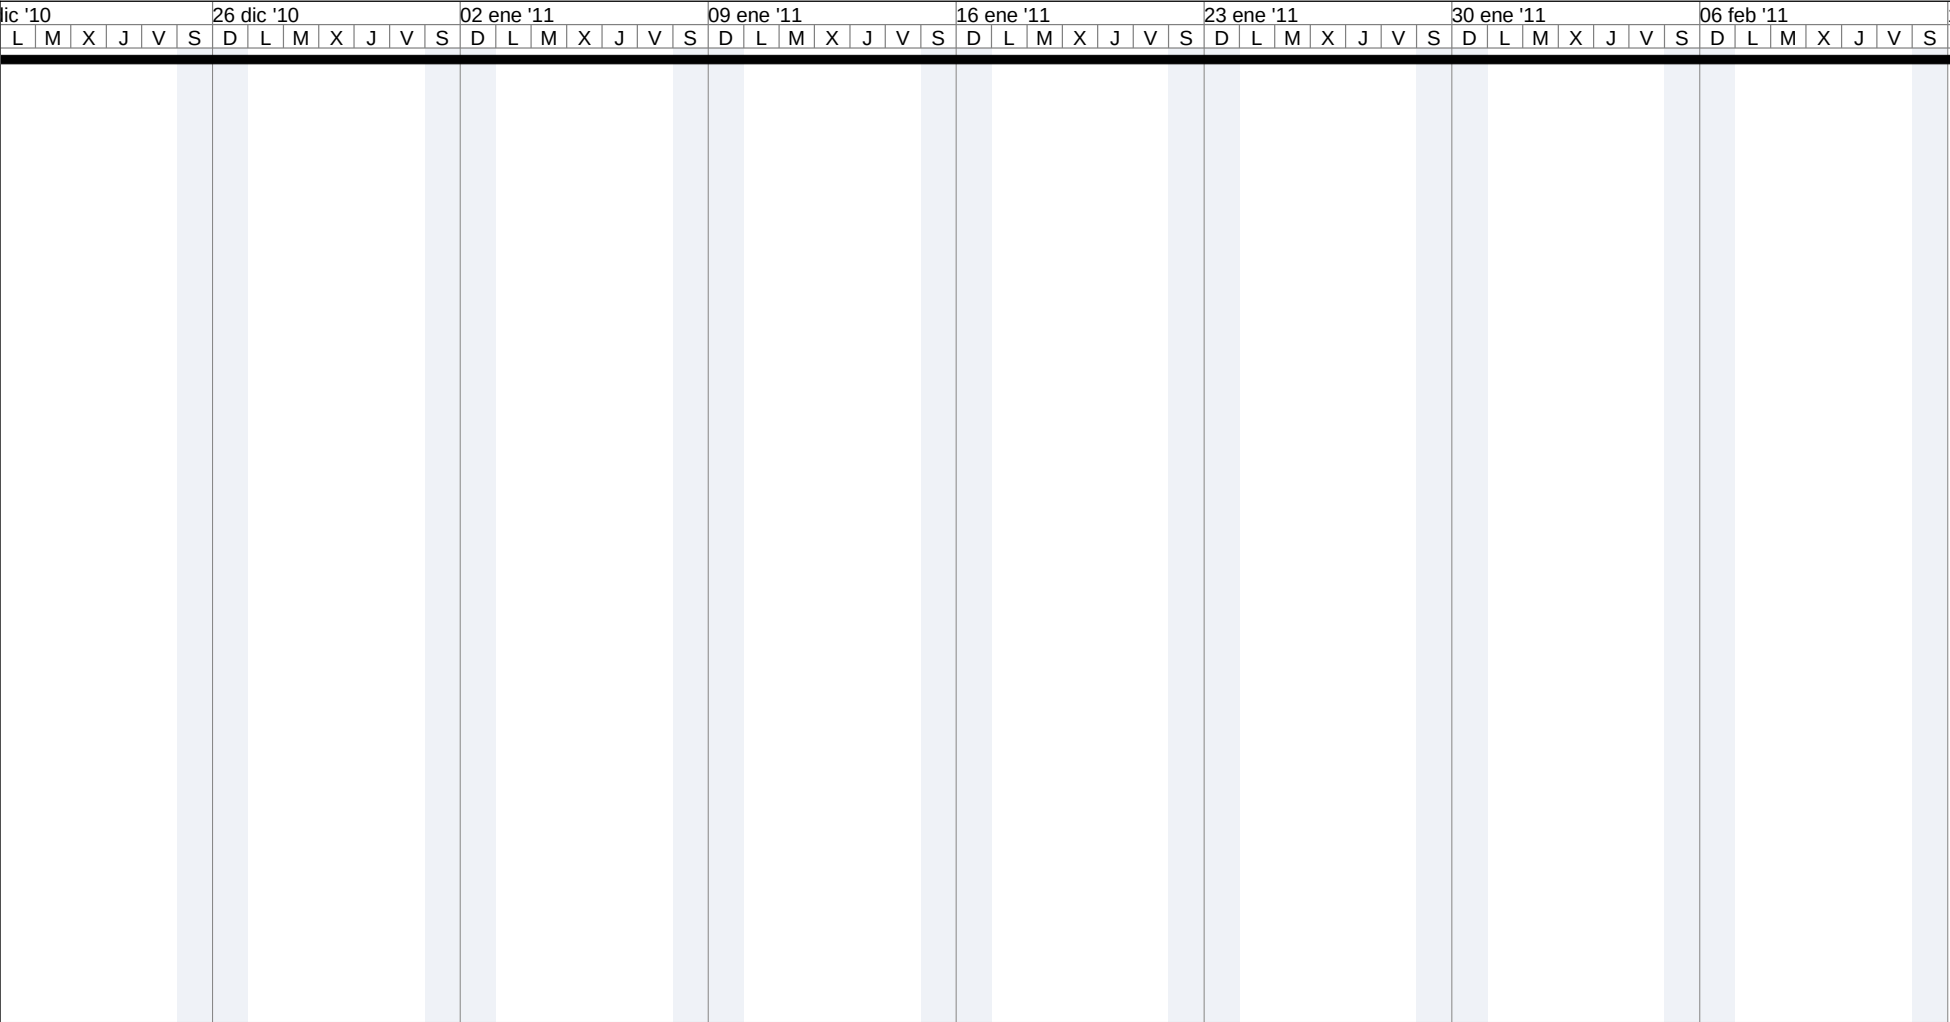

Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External MileTask

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual


Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin


Progress

Split

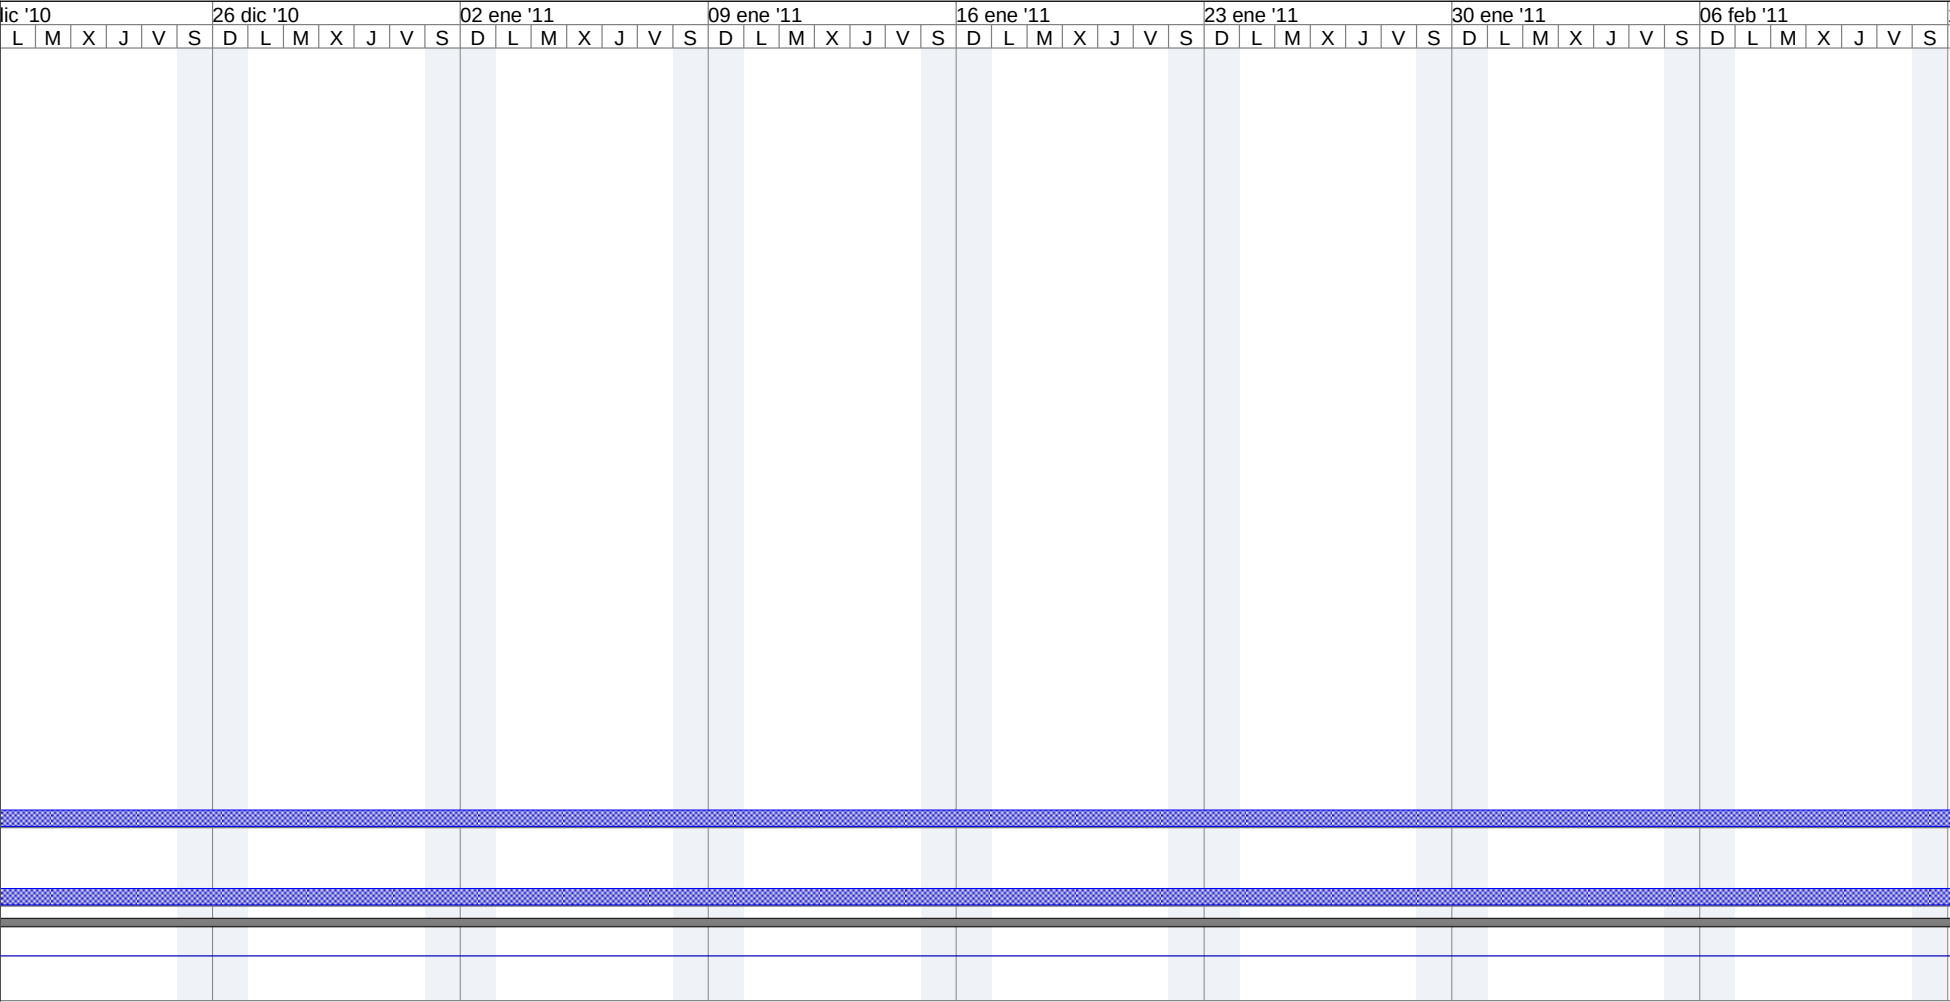


Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
Project Summary		Tarea manual		Progress	
External Tasks		Sólo duración		Split	

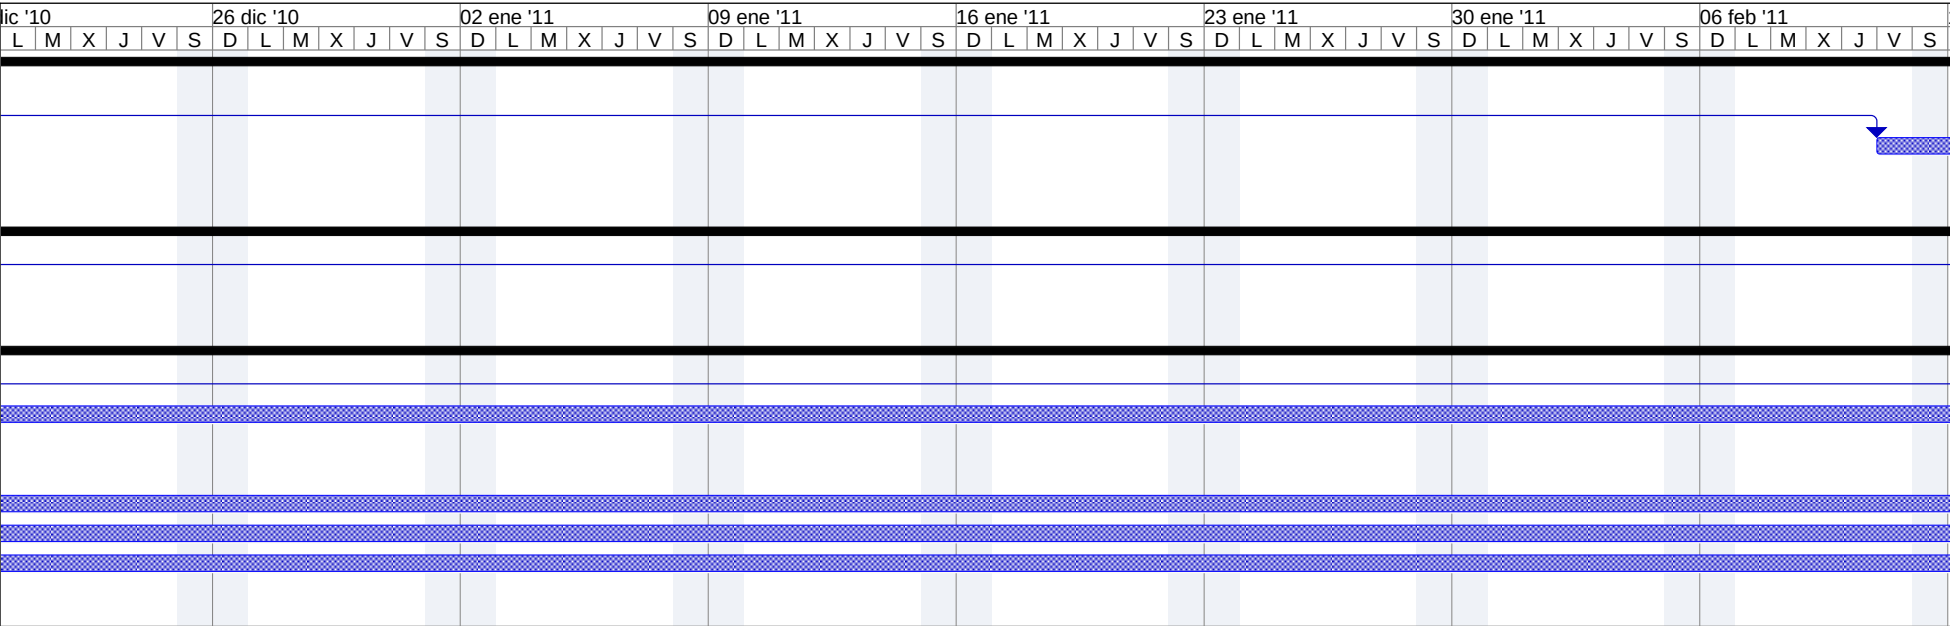


Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

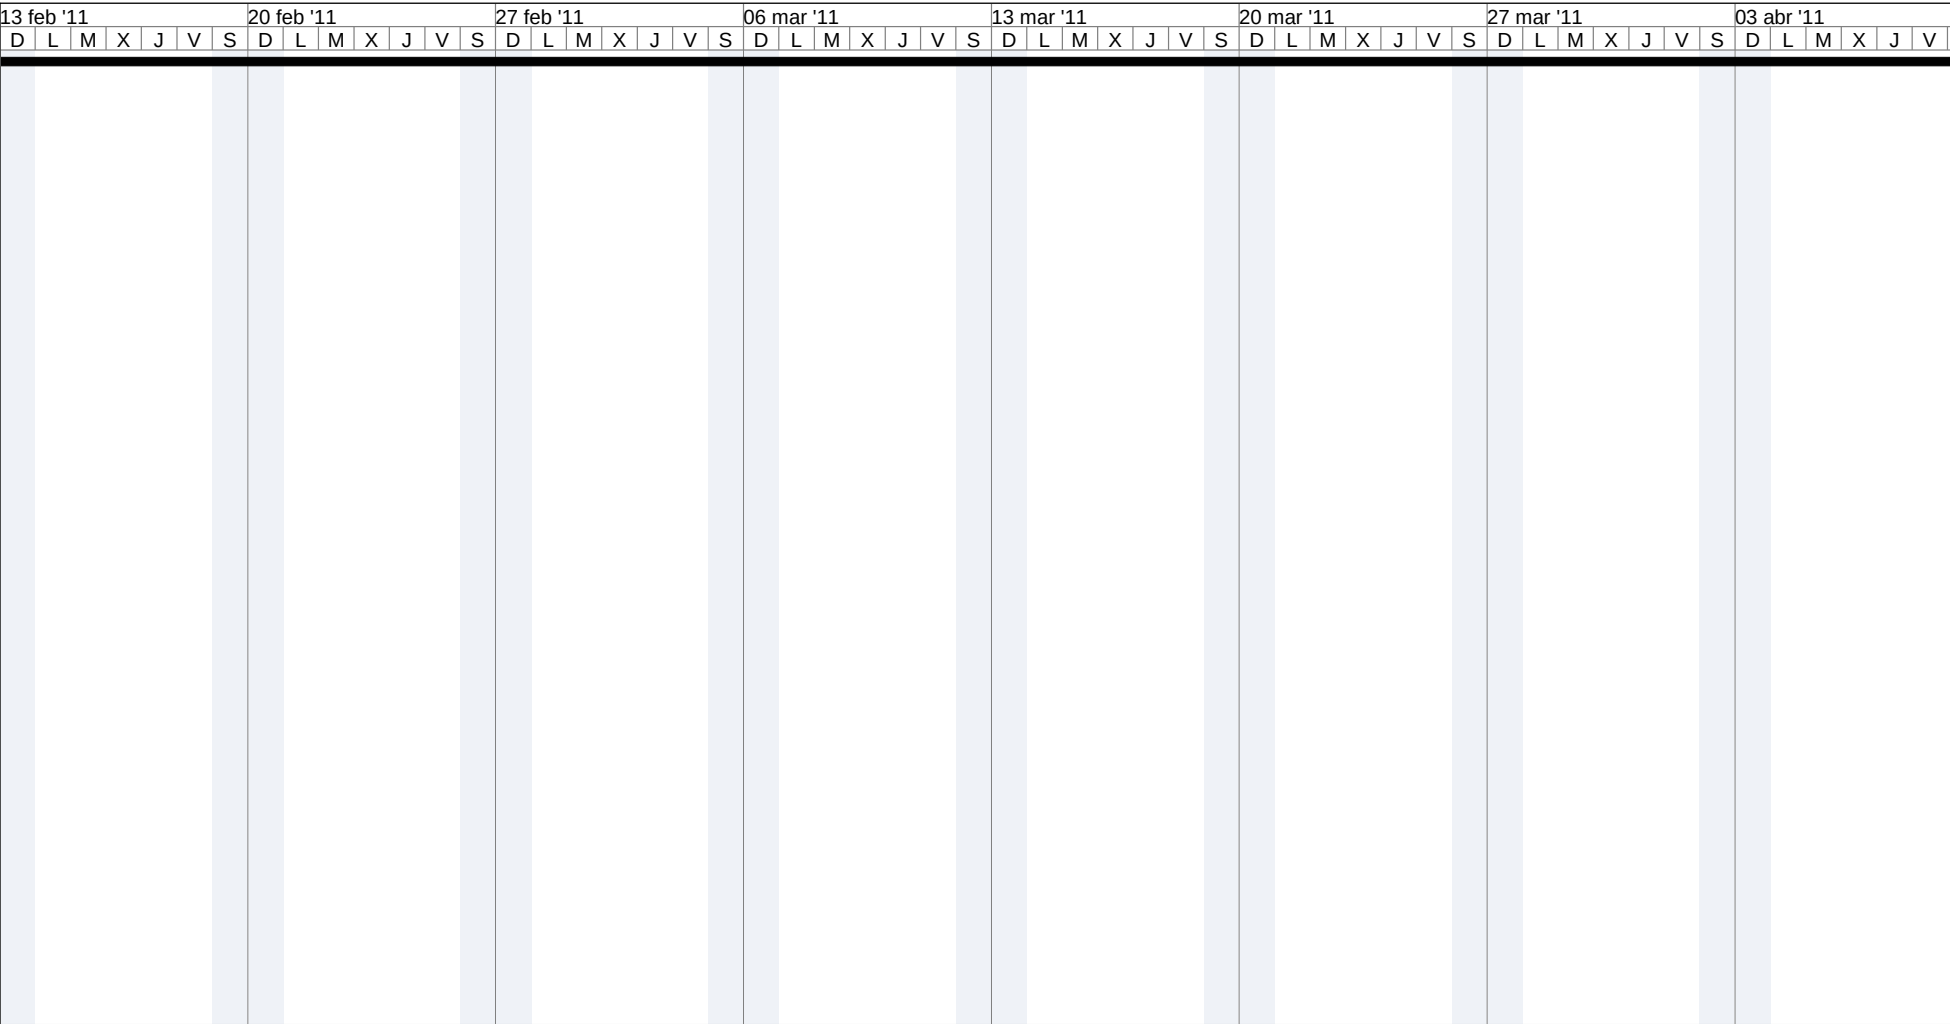


Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
Project Summary		Tarea manual		Progress	
External Tasks		Sólo duración		Split	

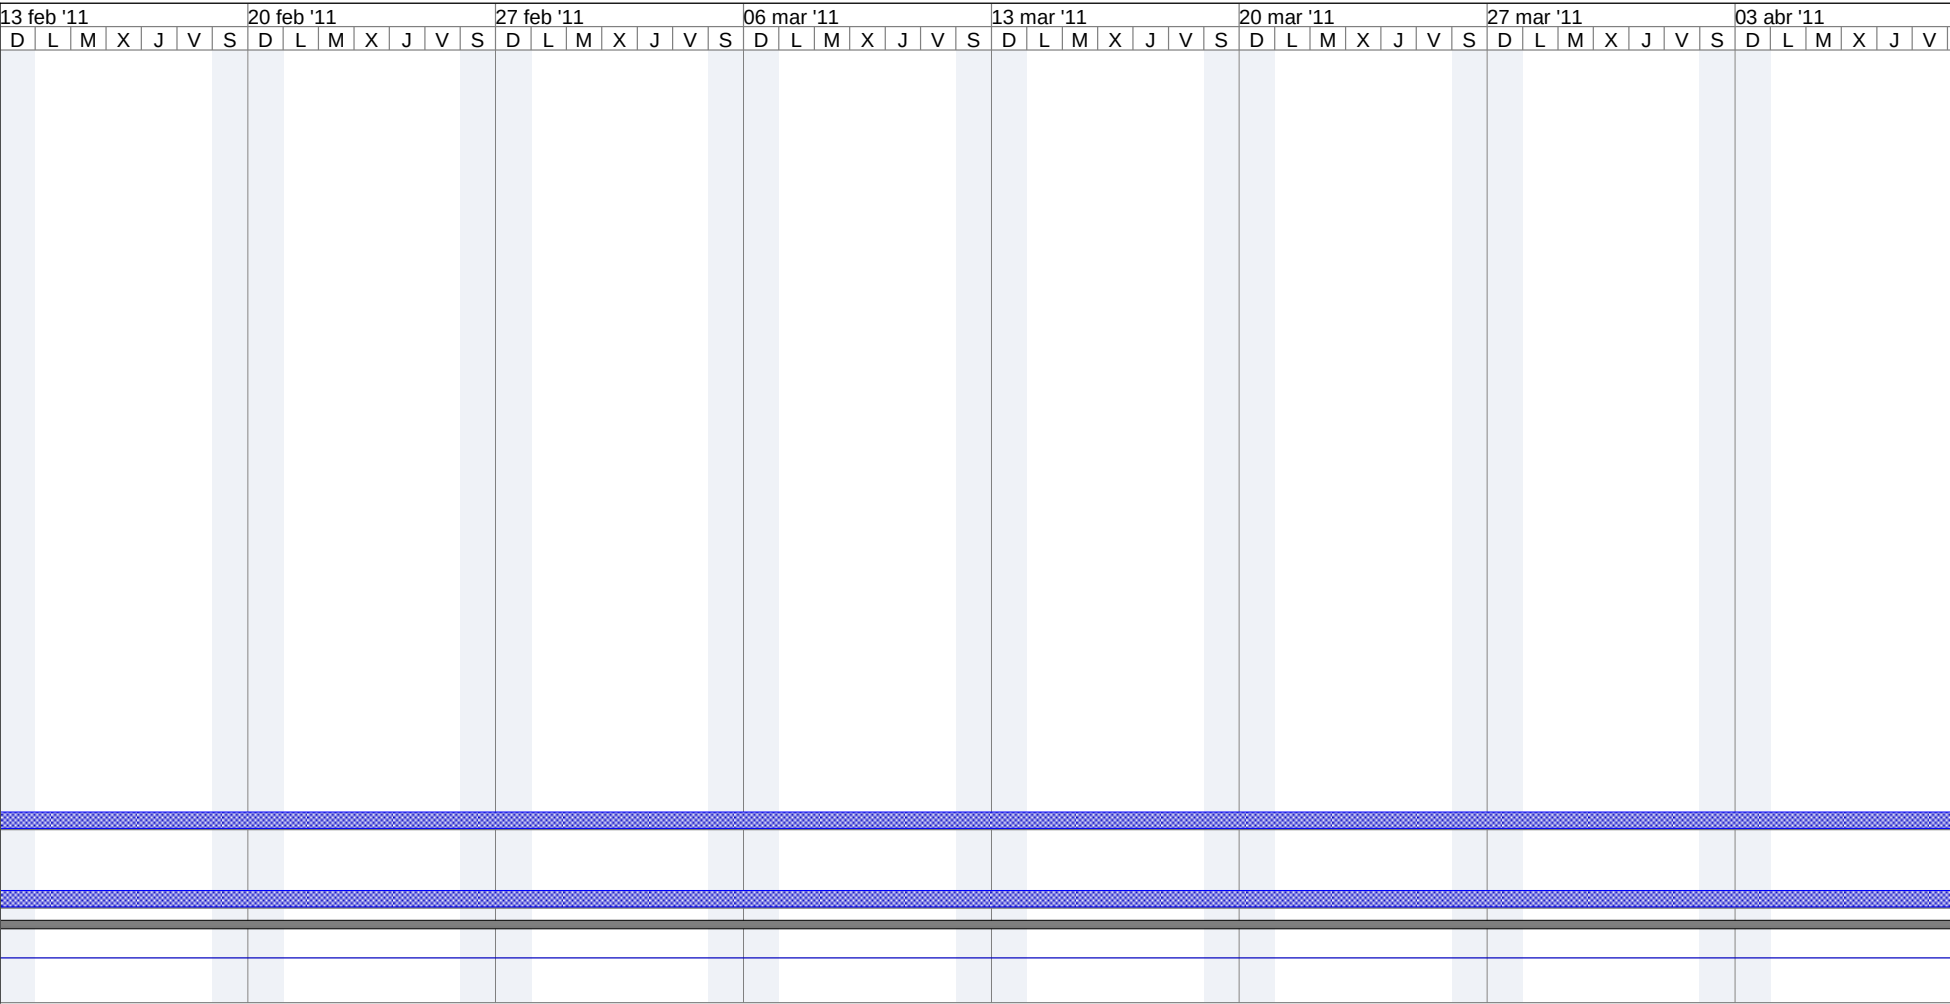


Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16


Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
Project Summary		Tarea manual		Progress	
External Tasks		Sólo duración		Split	

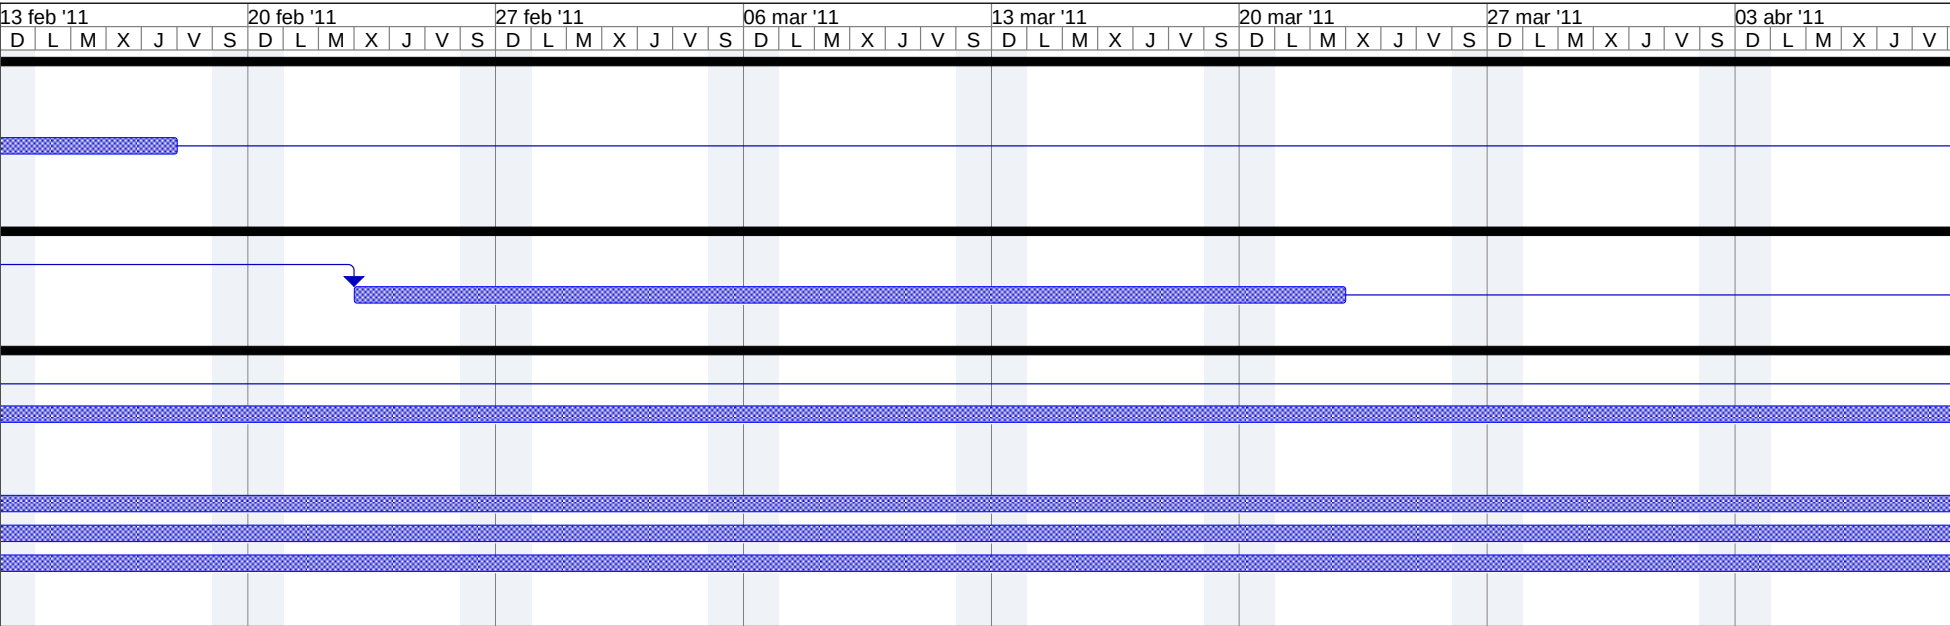

Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

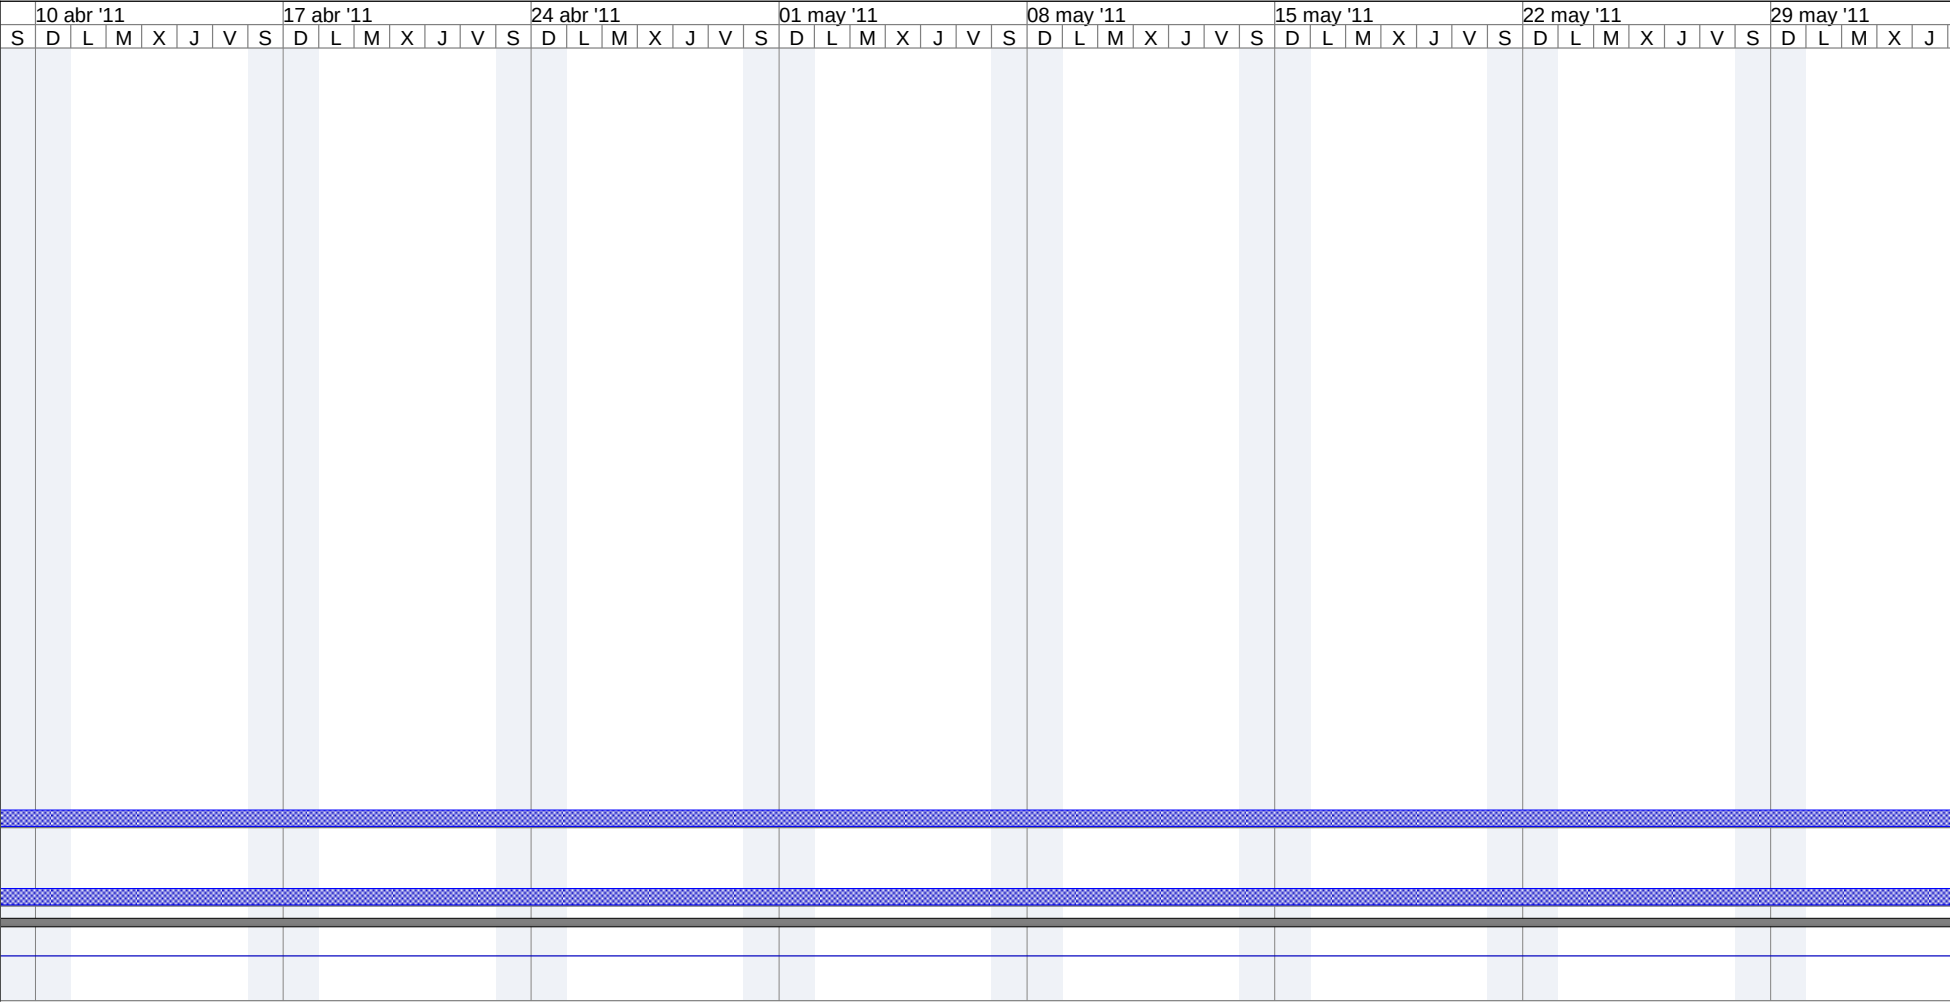

Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

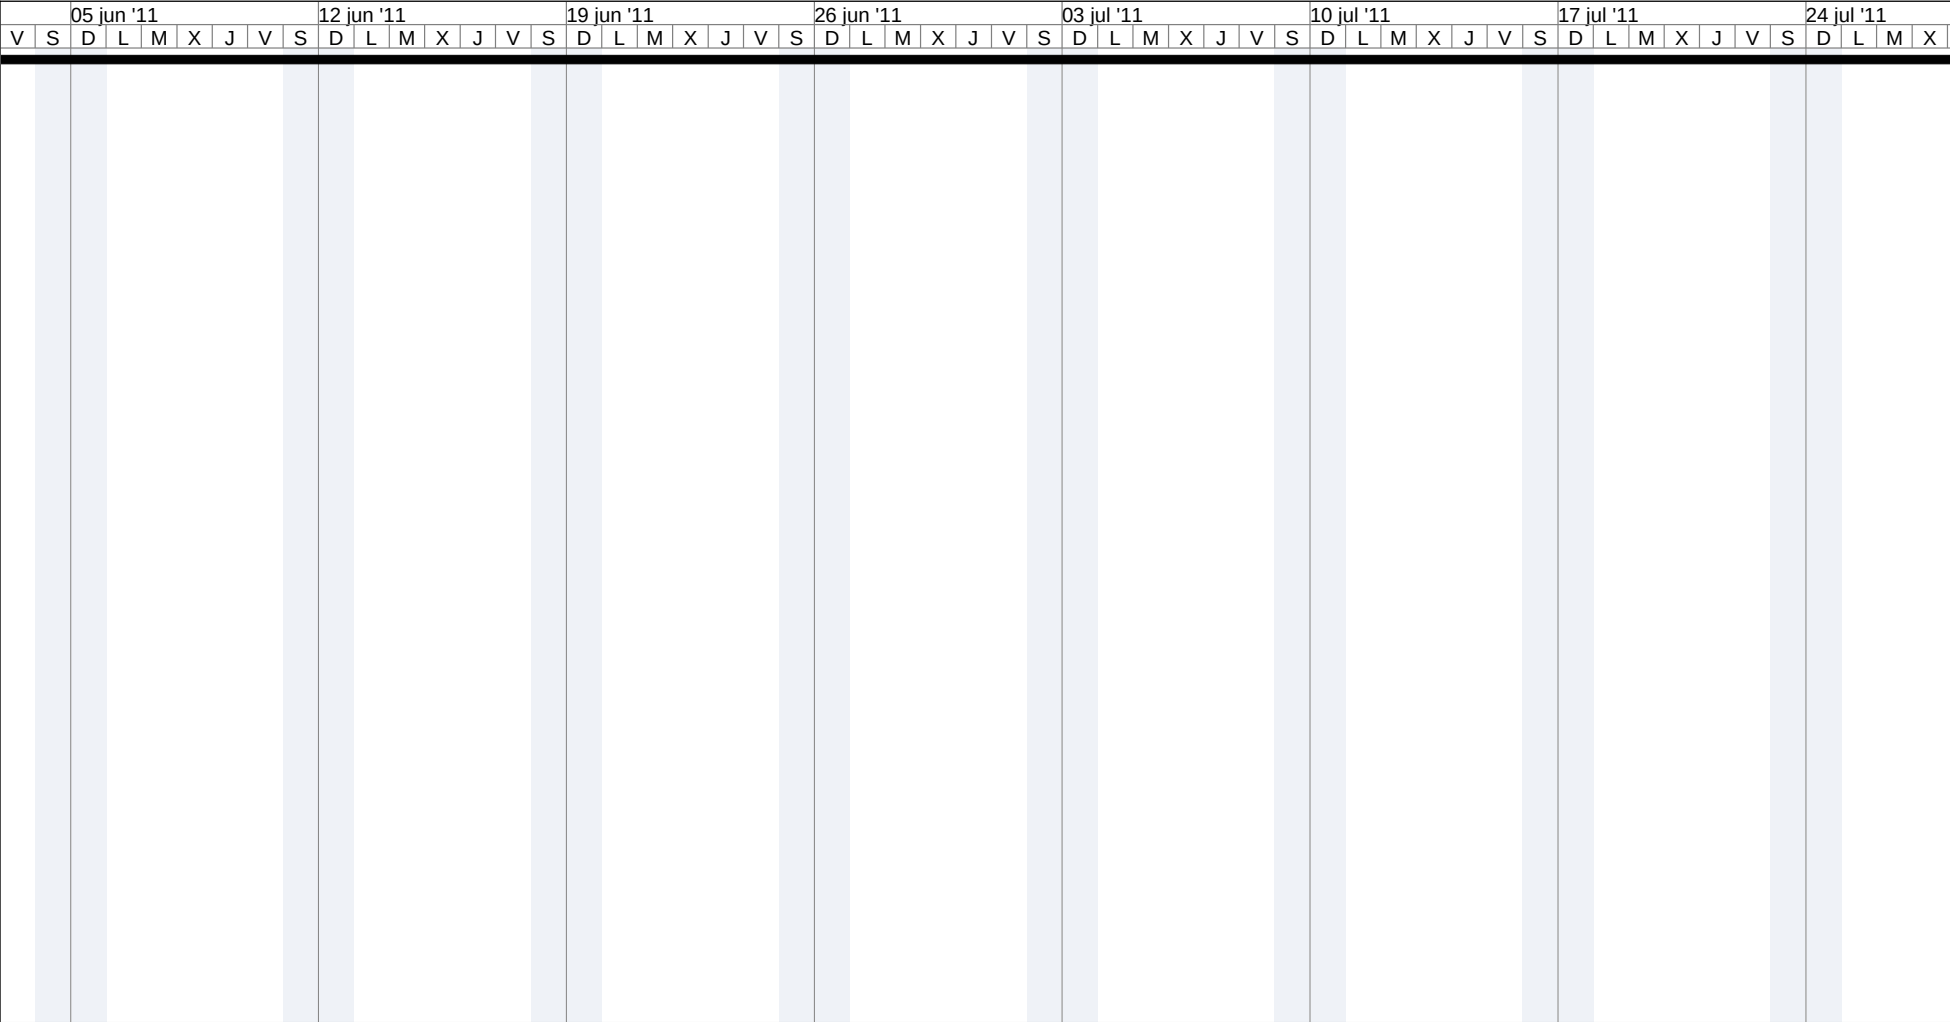


Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
Project Summary		Tarea manual		Progress	
External Tasks		Sólo duración		Split	

[illegible]


Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

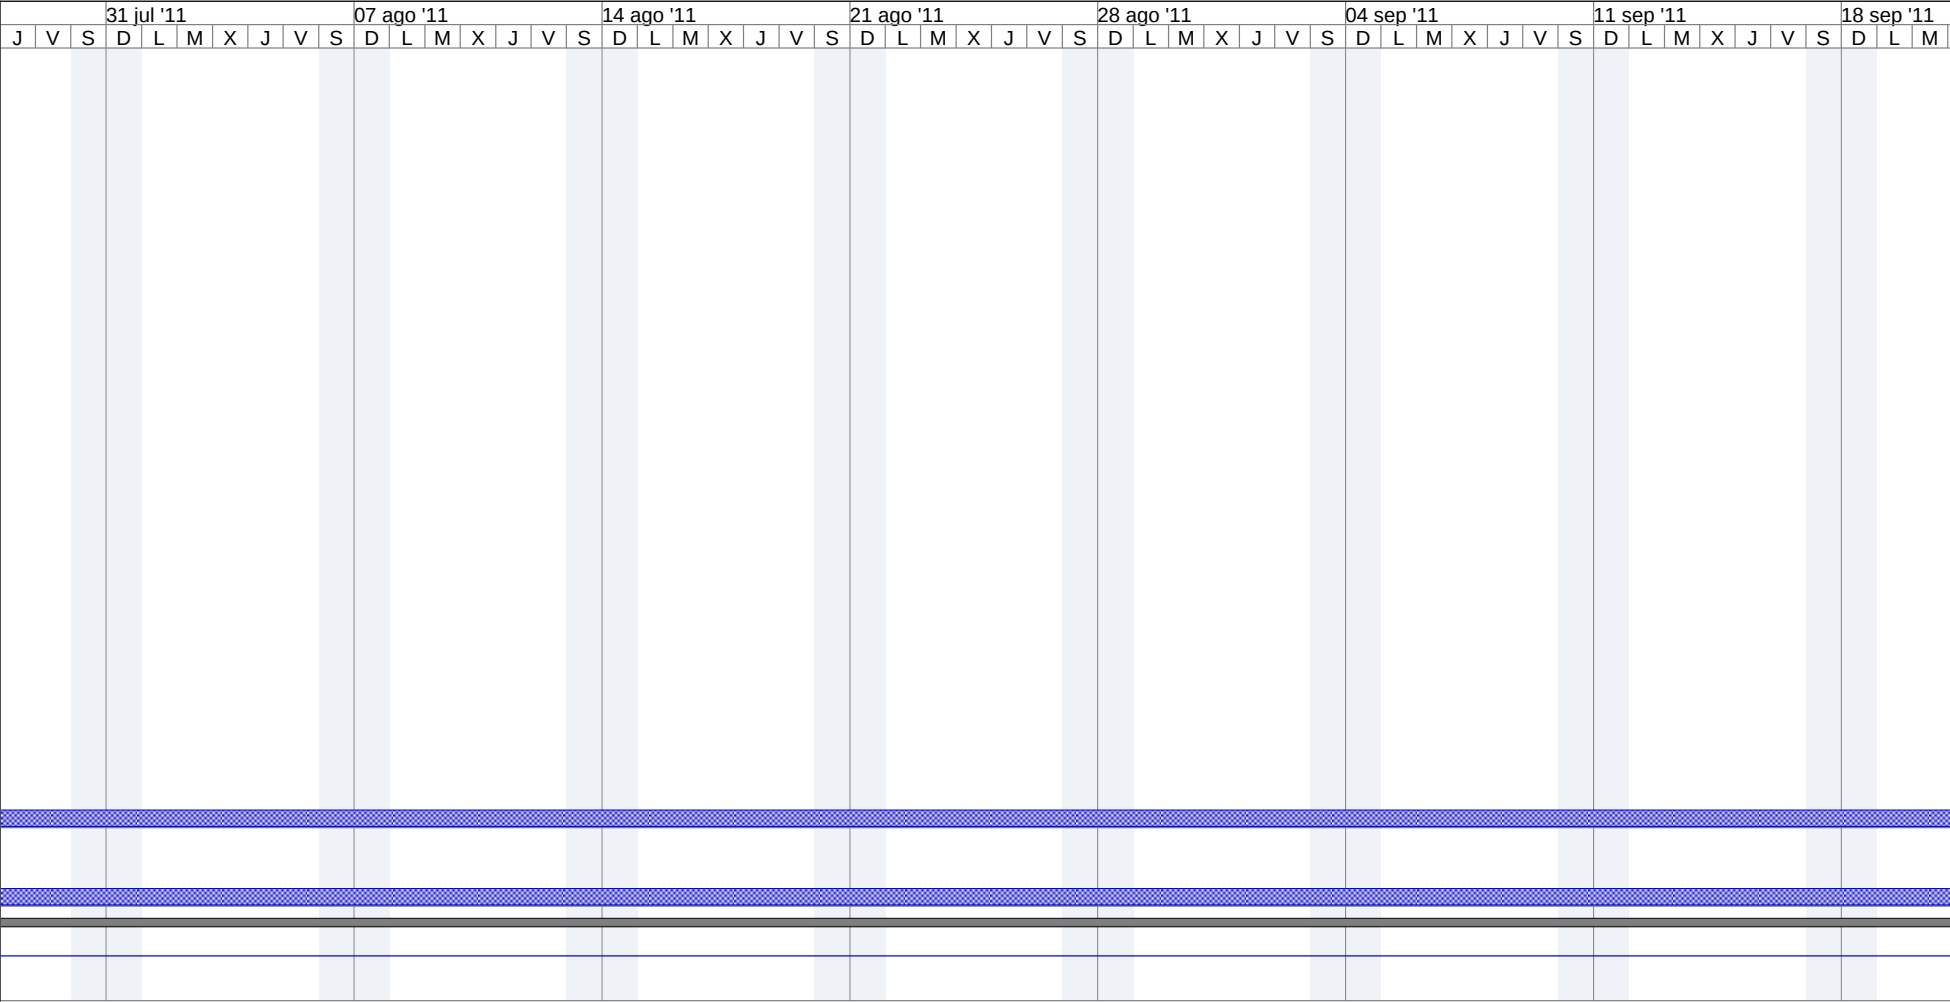

Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	


[illegible]

Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

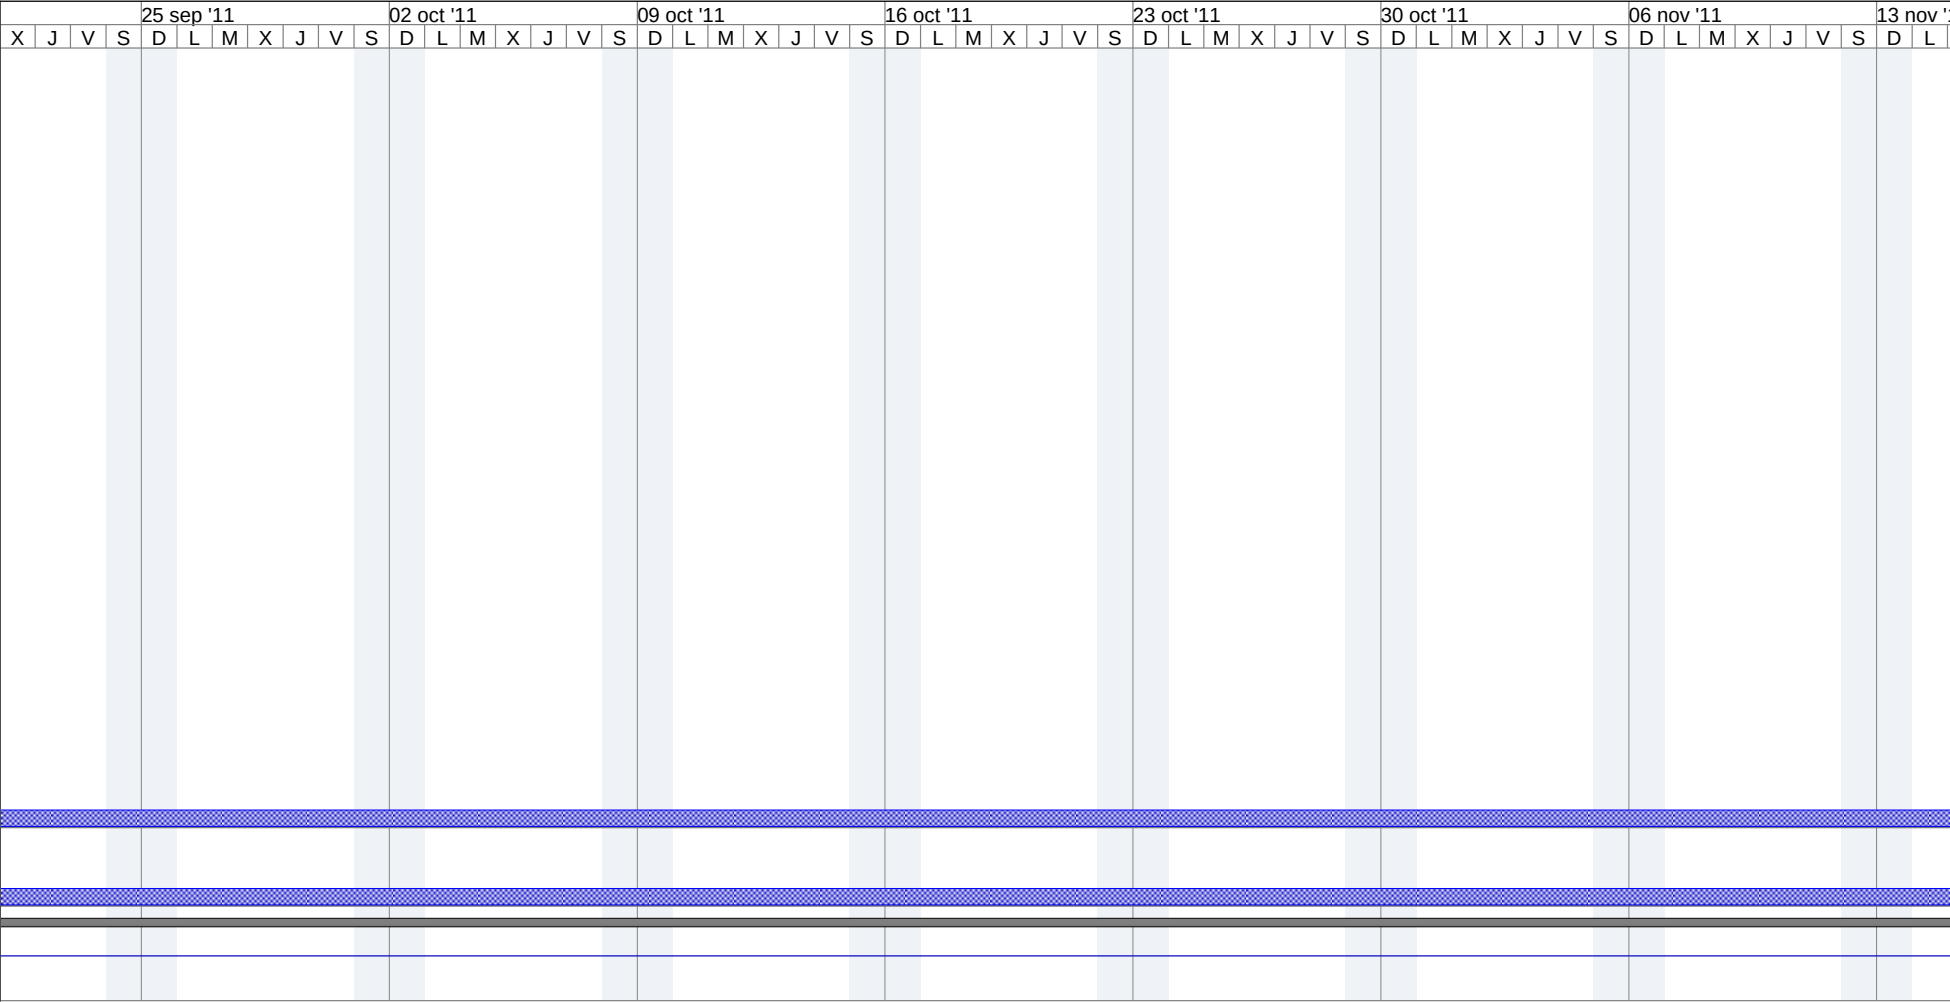


Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
Project Summary		Tarea manual		Progress	
External Tasks		Sólo duración		Split	

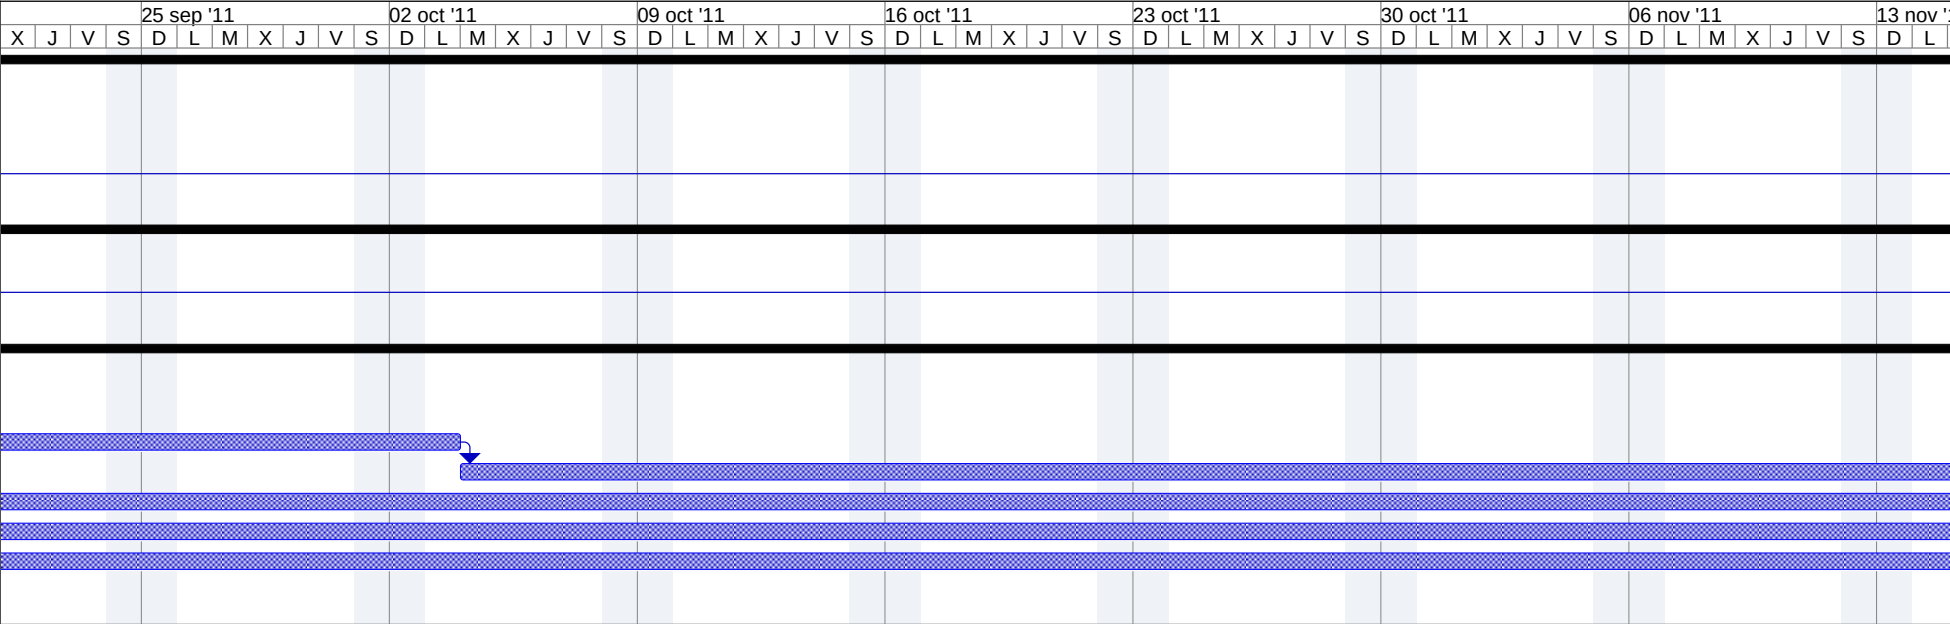


Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

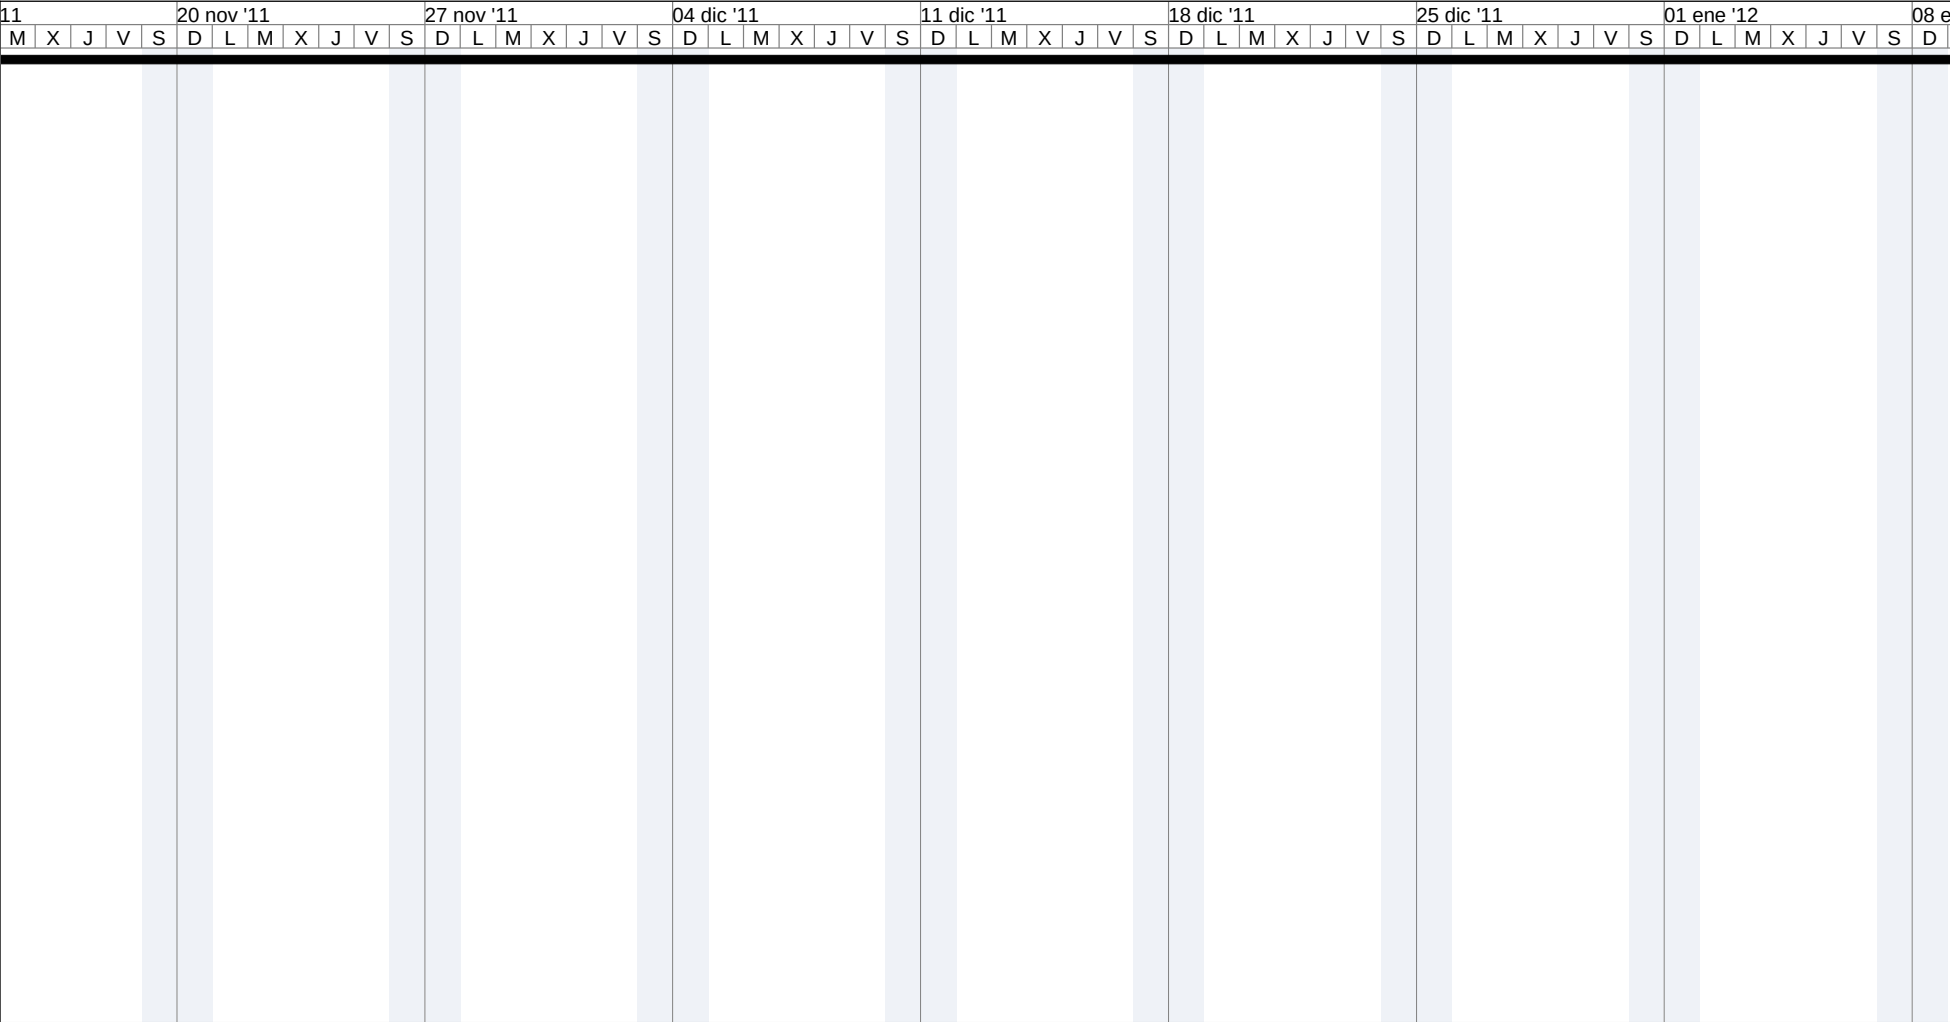


Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
Project Summary		Tarea manual		Progress	
External Tasks		Sólo duración		Split	

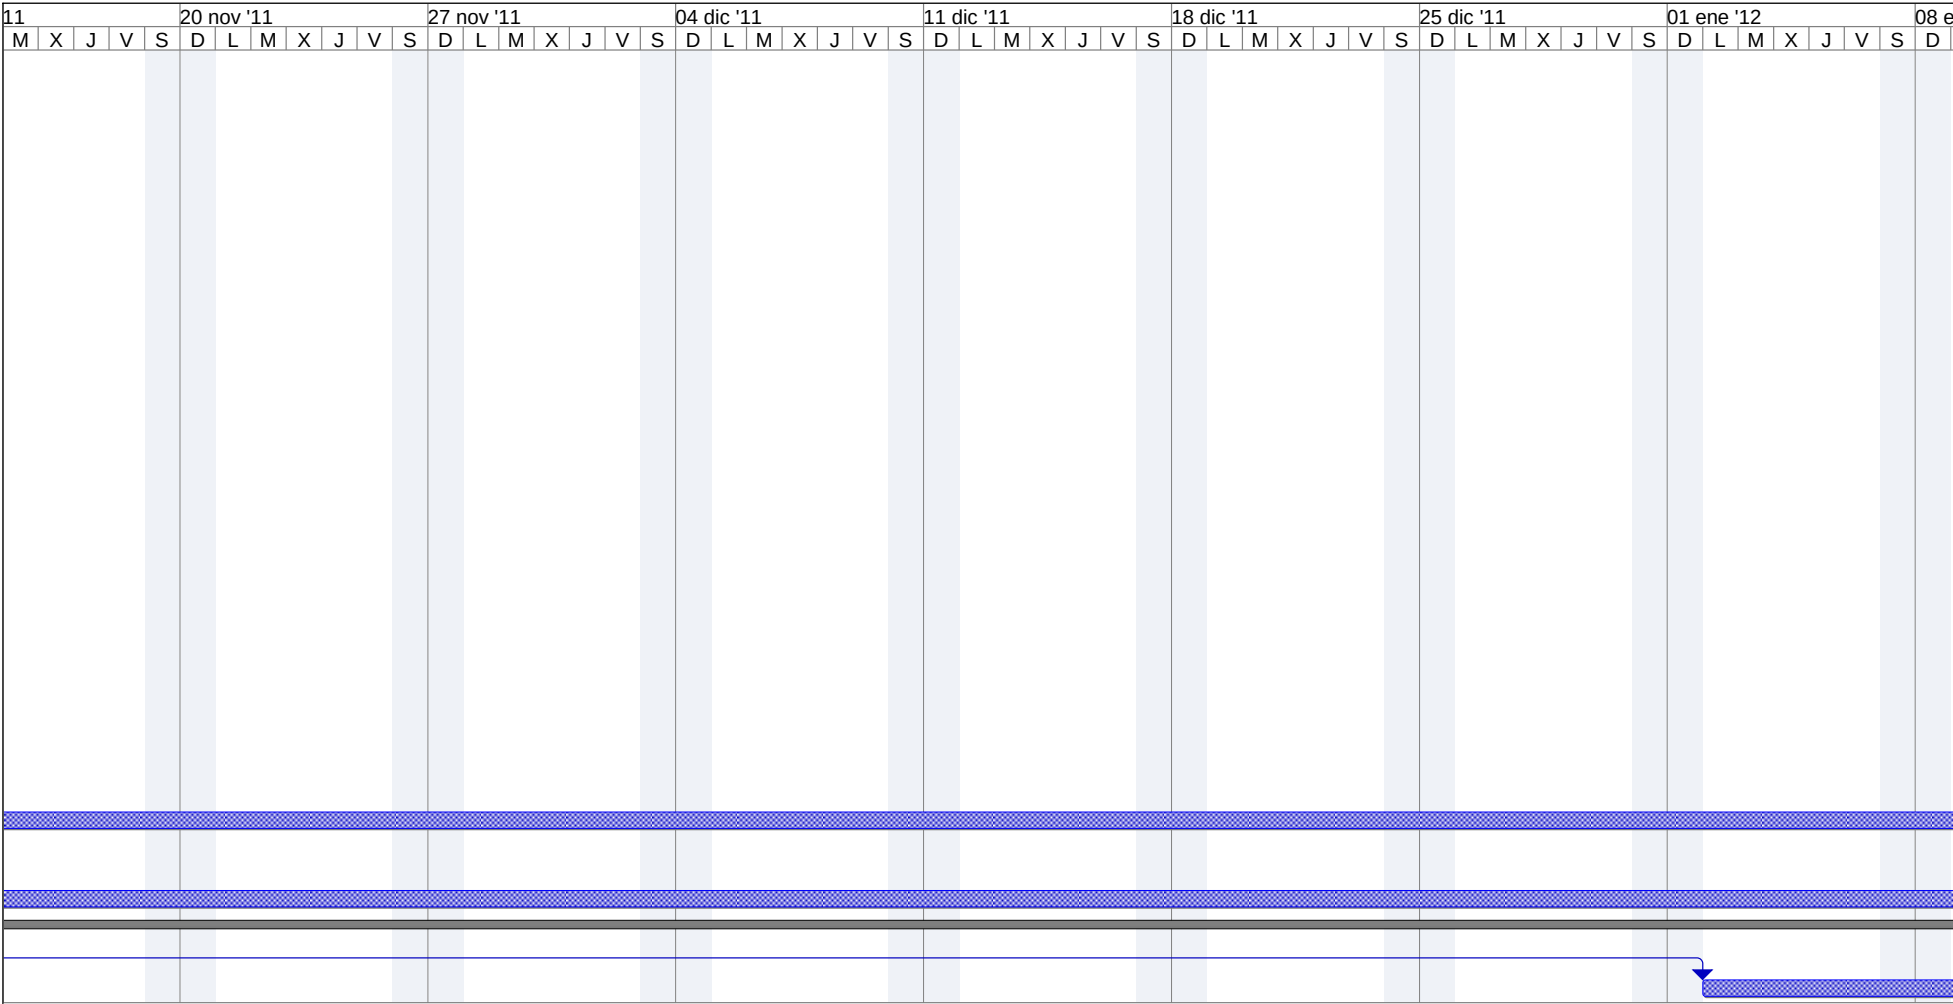


Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
Project Summary		Tarea manual		Progress	
External Tasks		Sólo duración		Split	

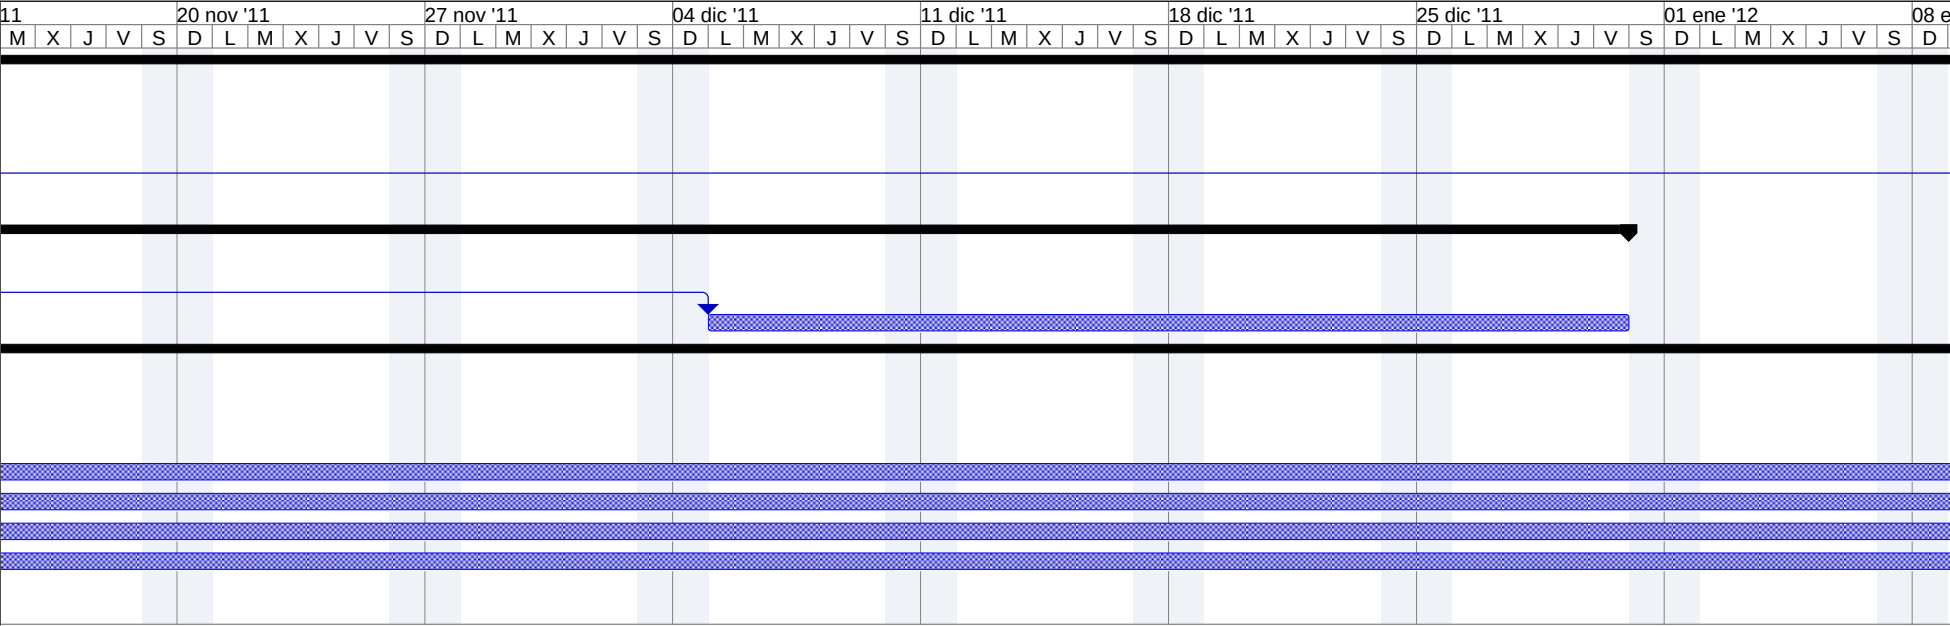

Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

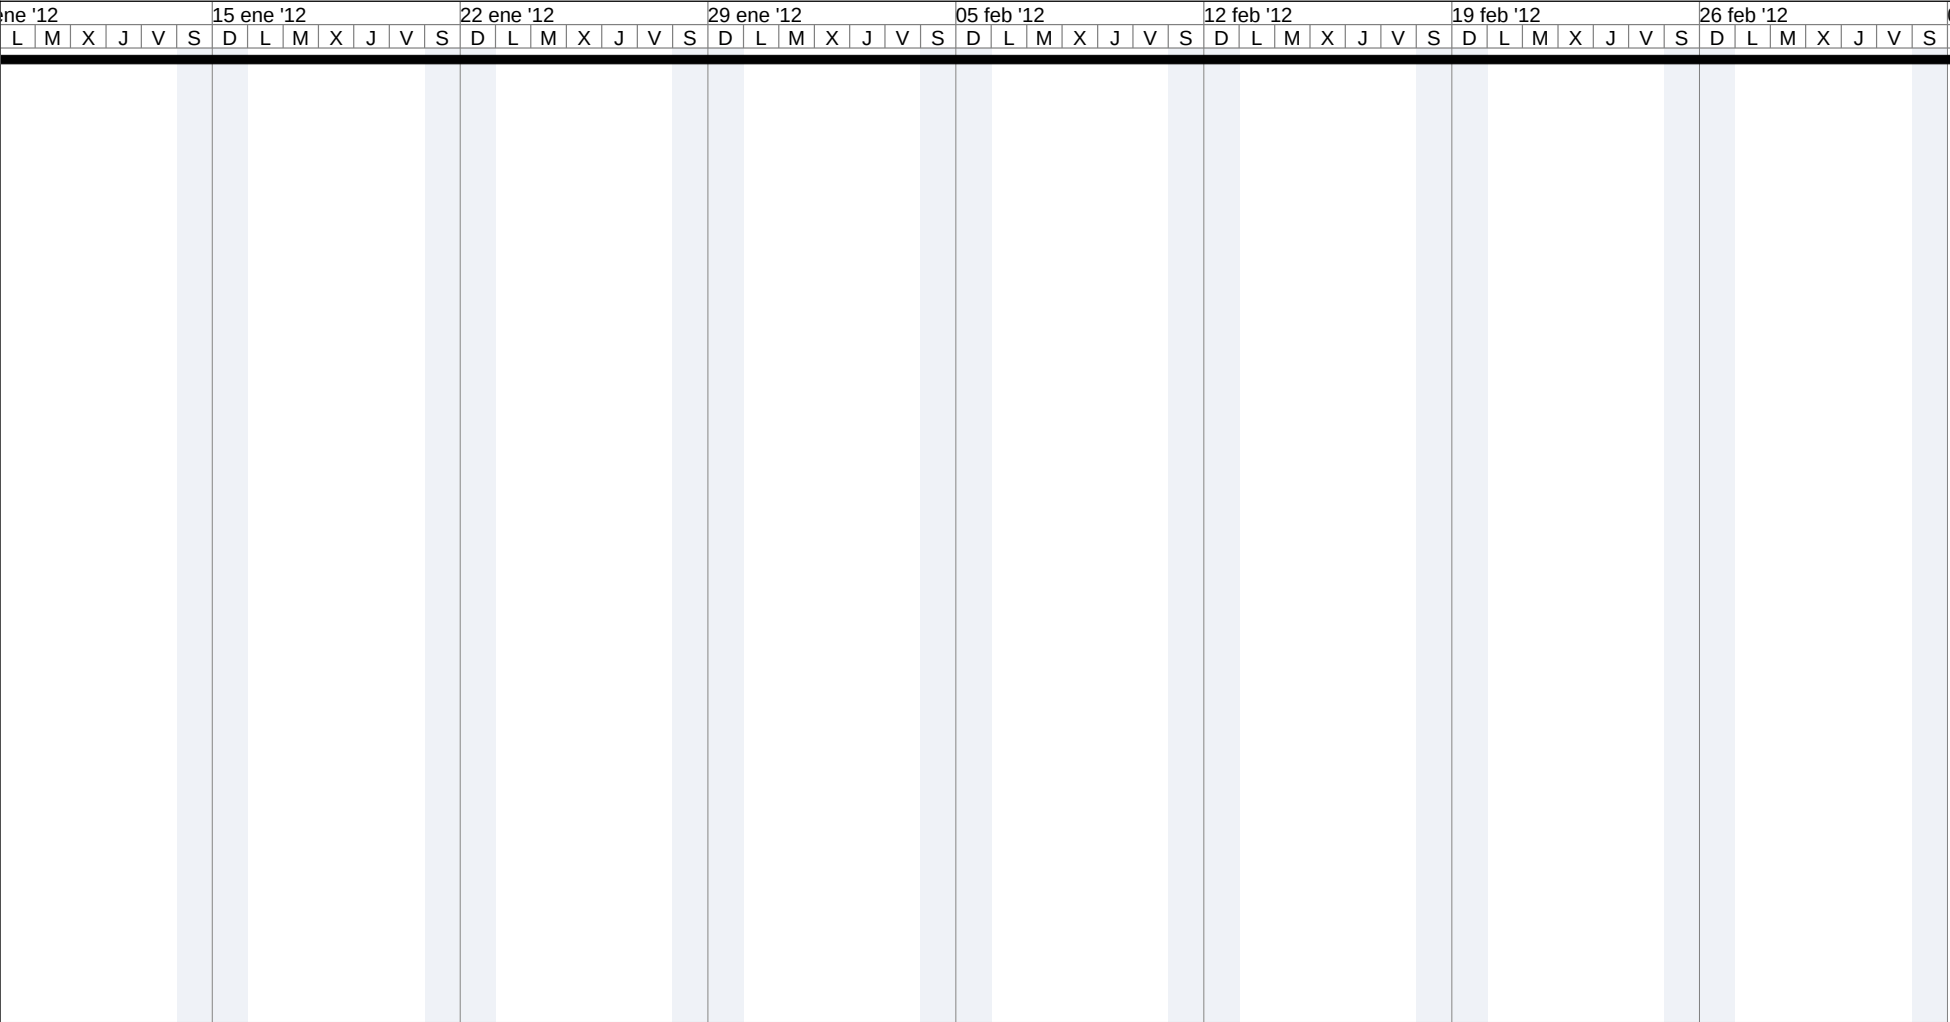

Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External MileTask

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual


Resumen manual

Sólo el comienzo


Sólo fin

Progress


Split

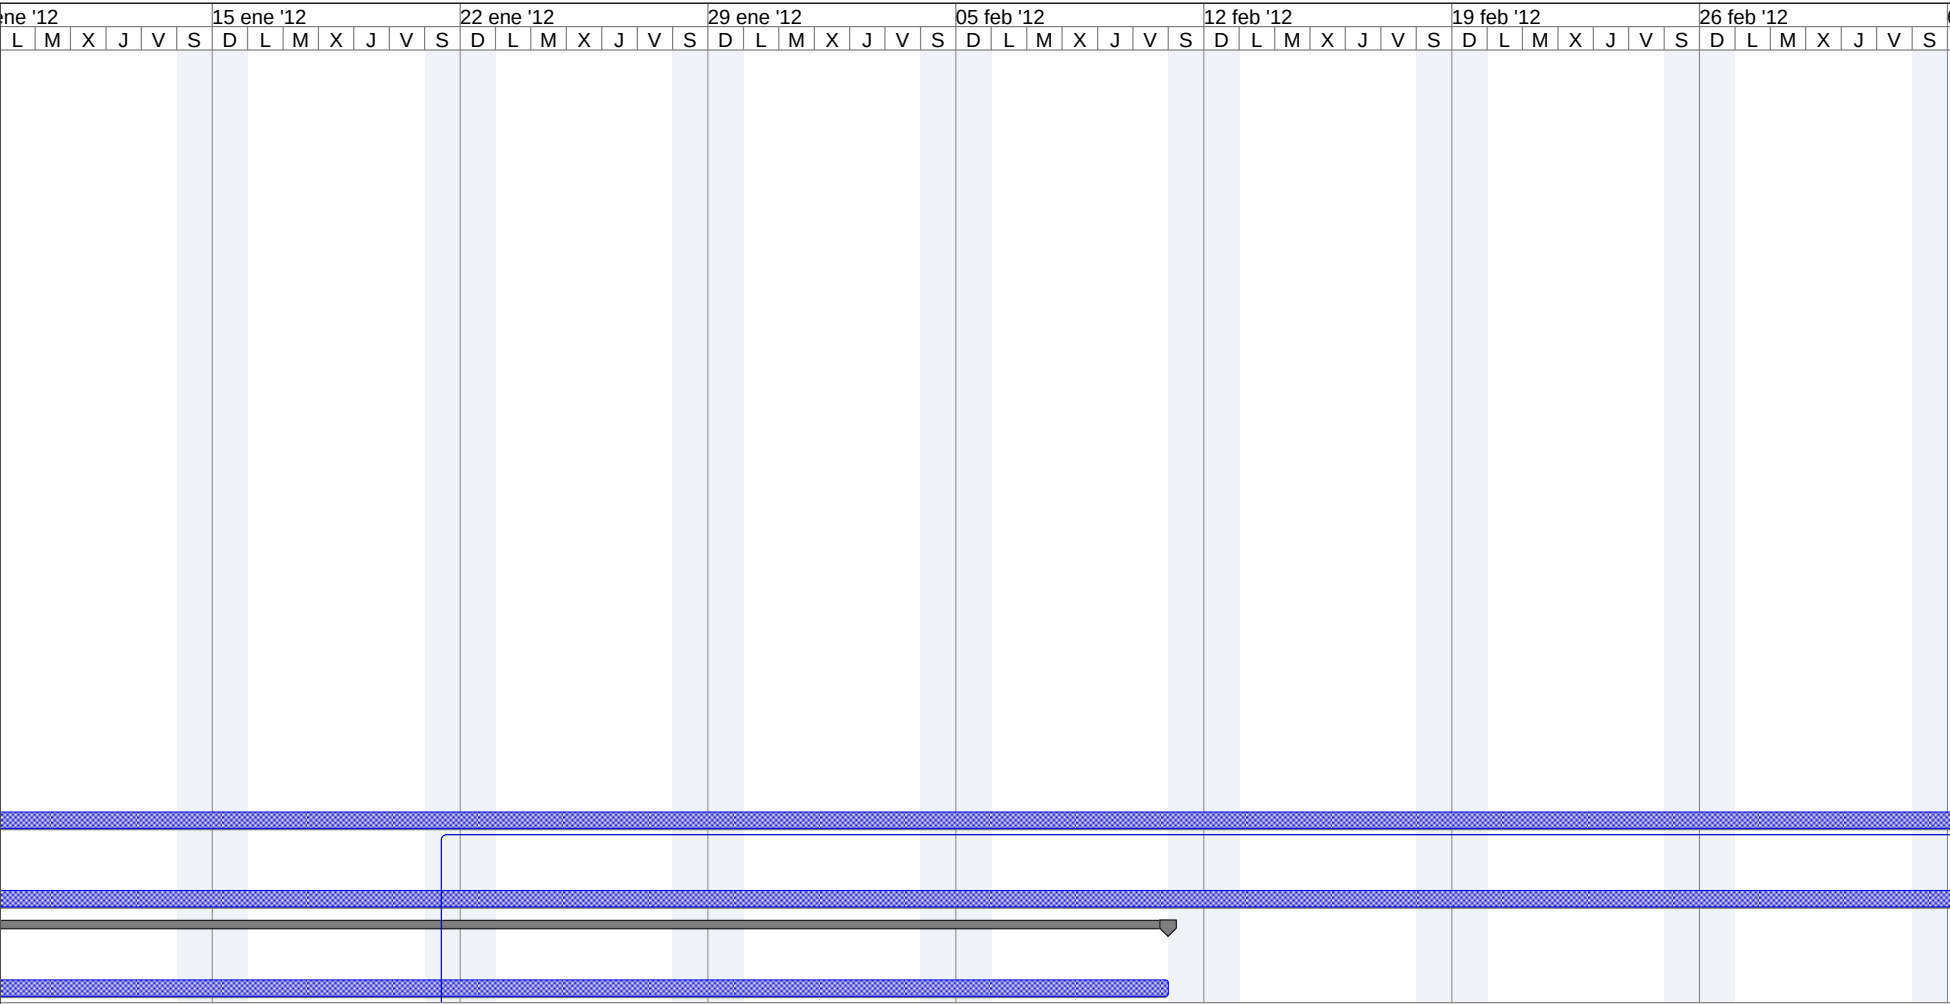

Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

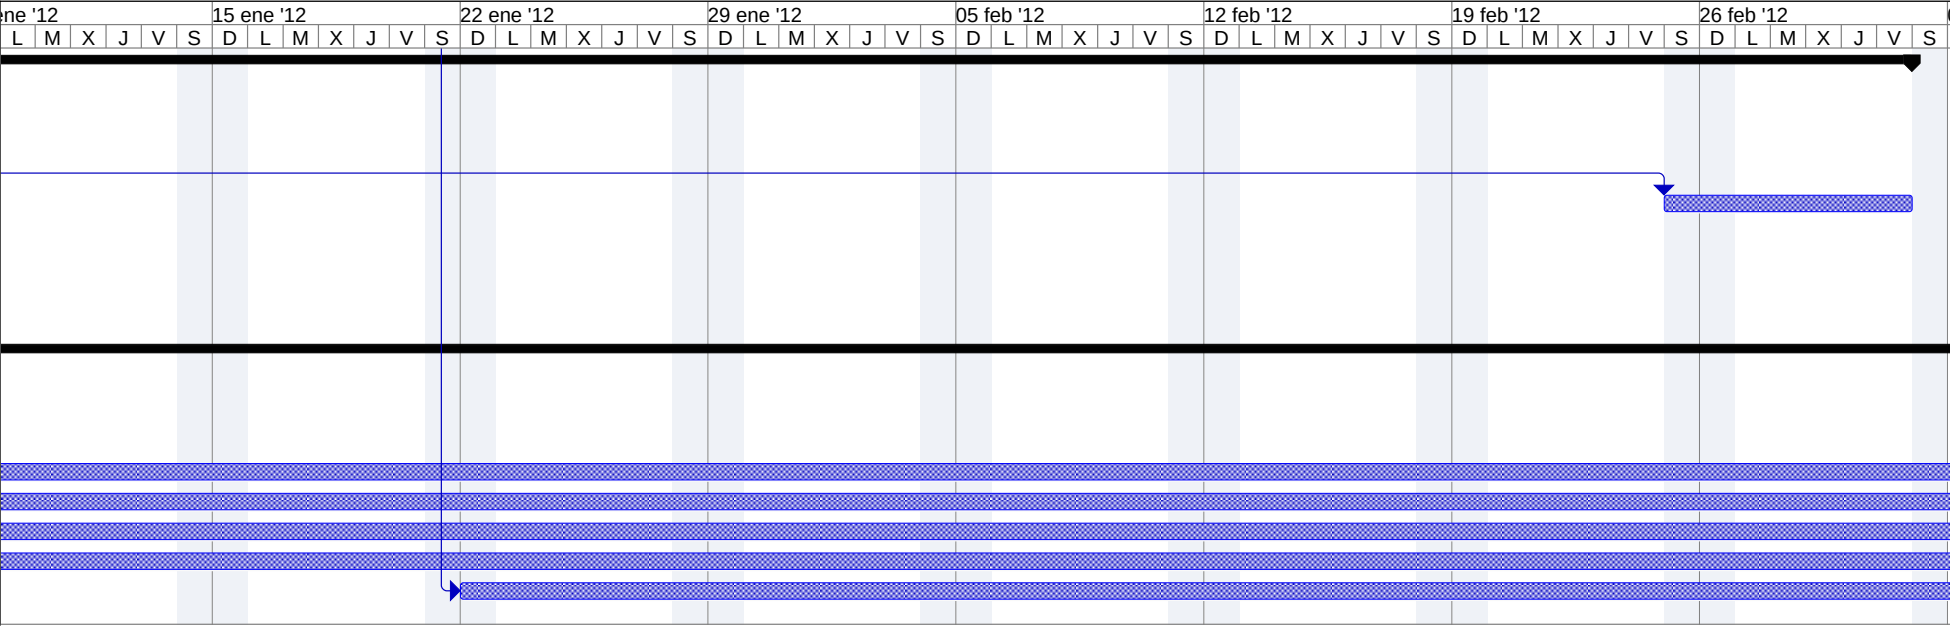


Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

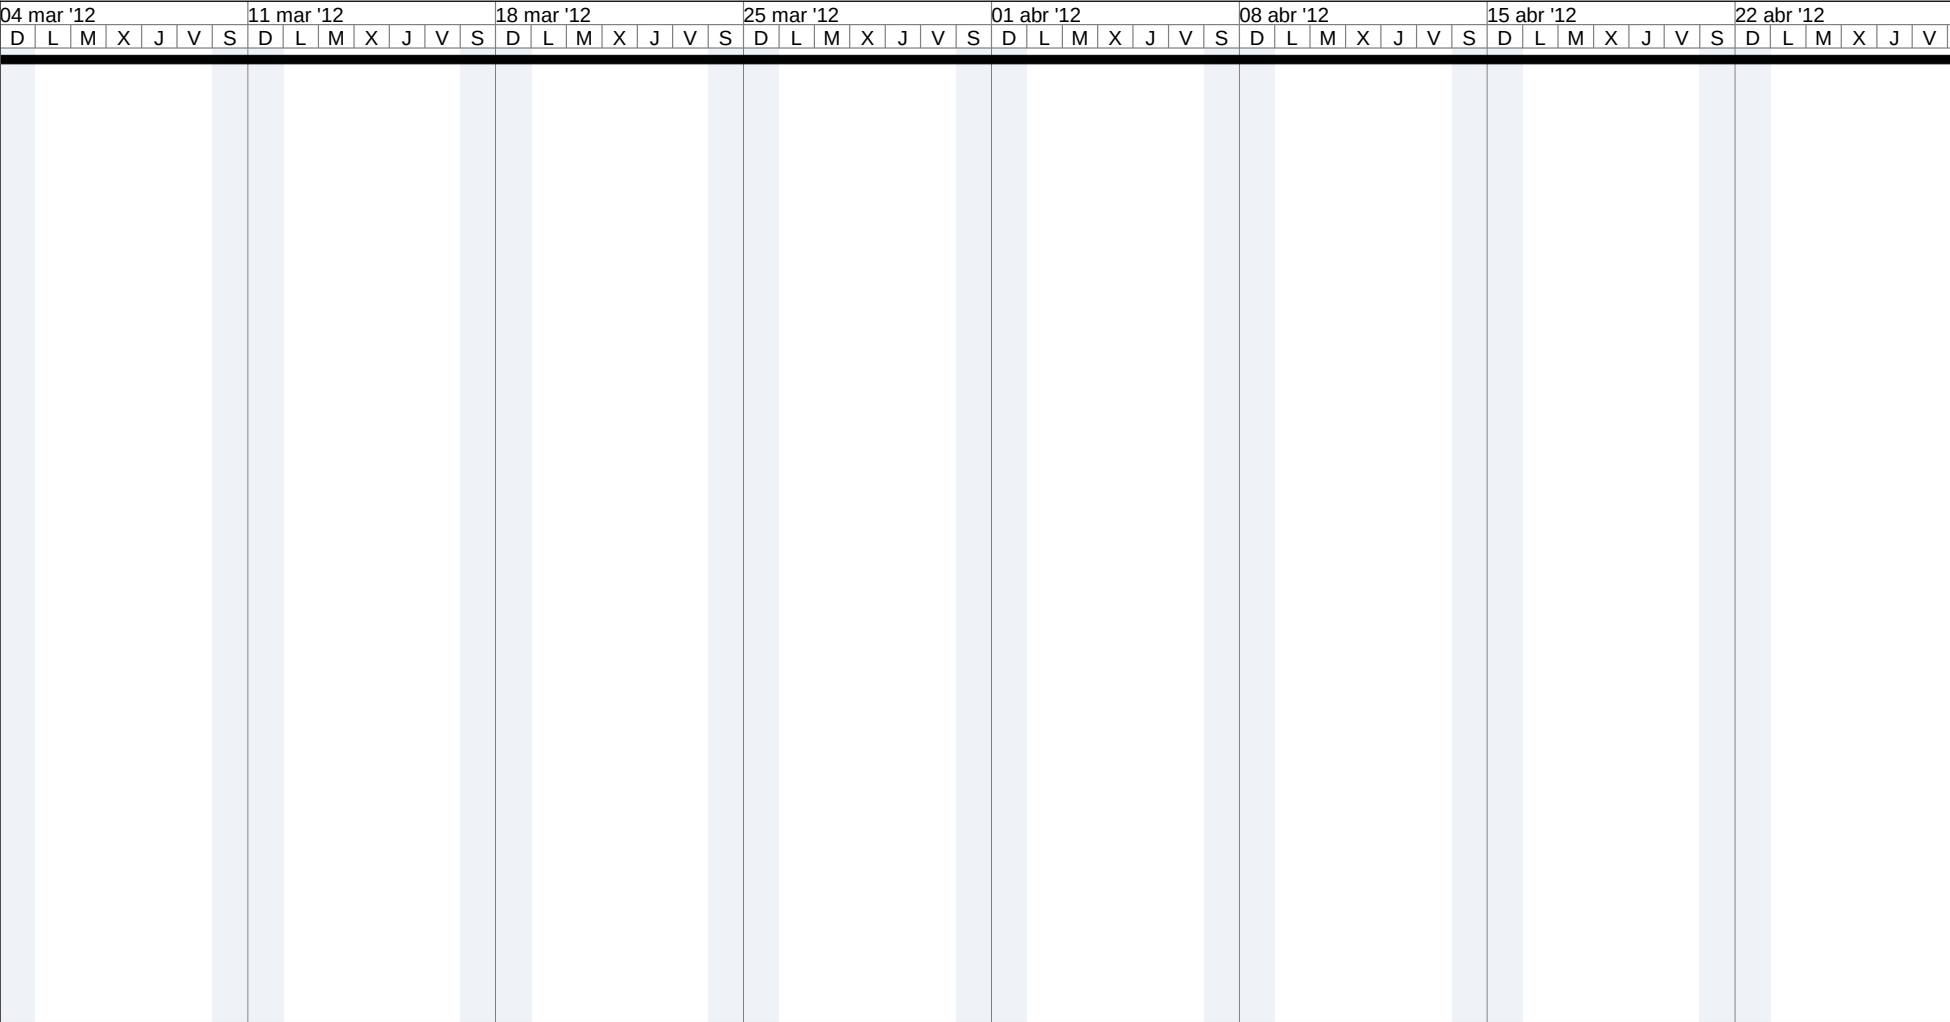


Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
Project Summary		Tarea manual		Progress	
External Tasks		Sólo duración		Split	

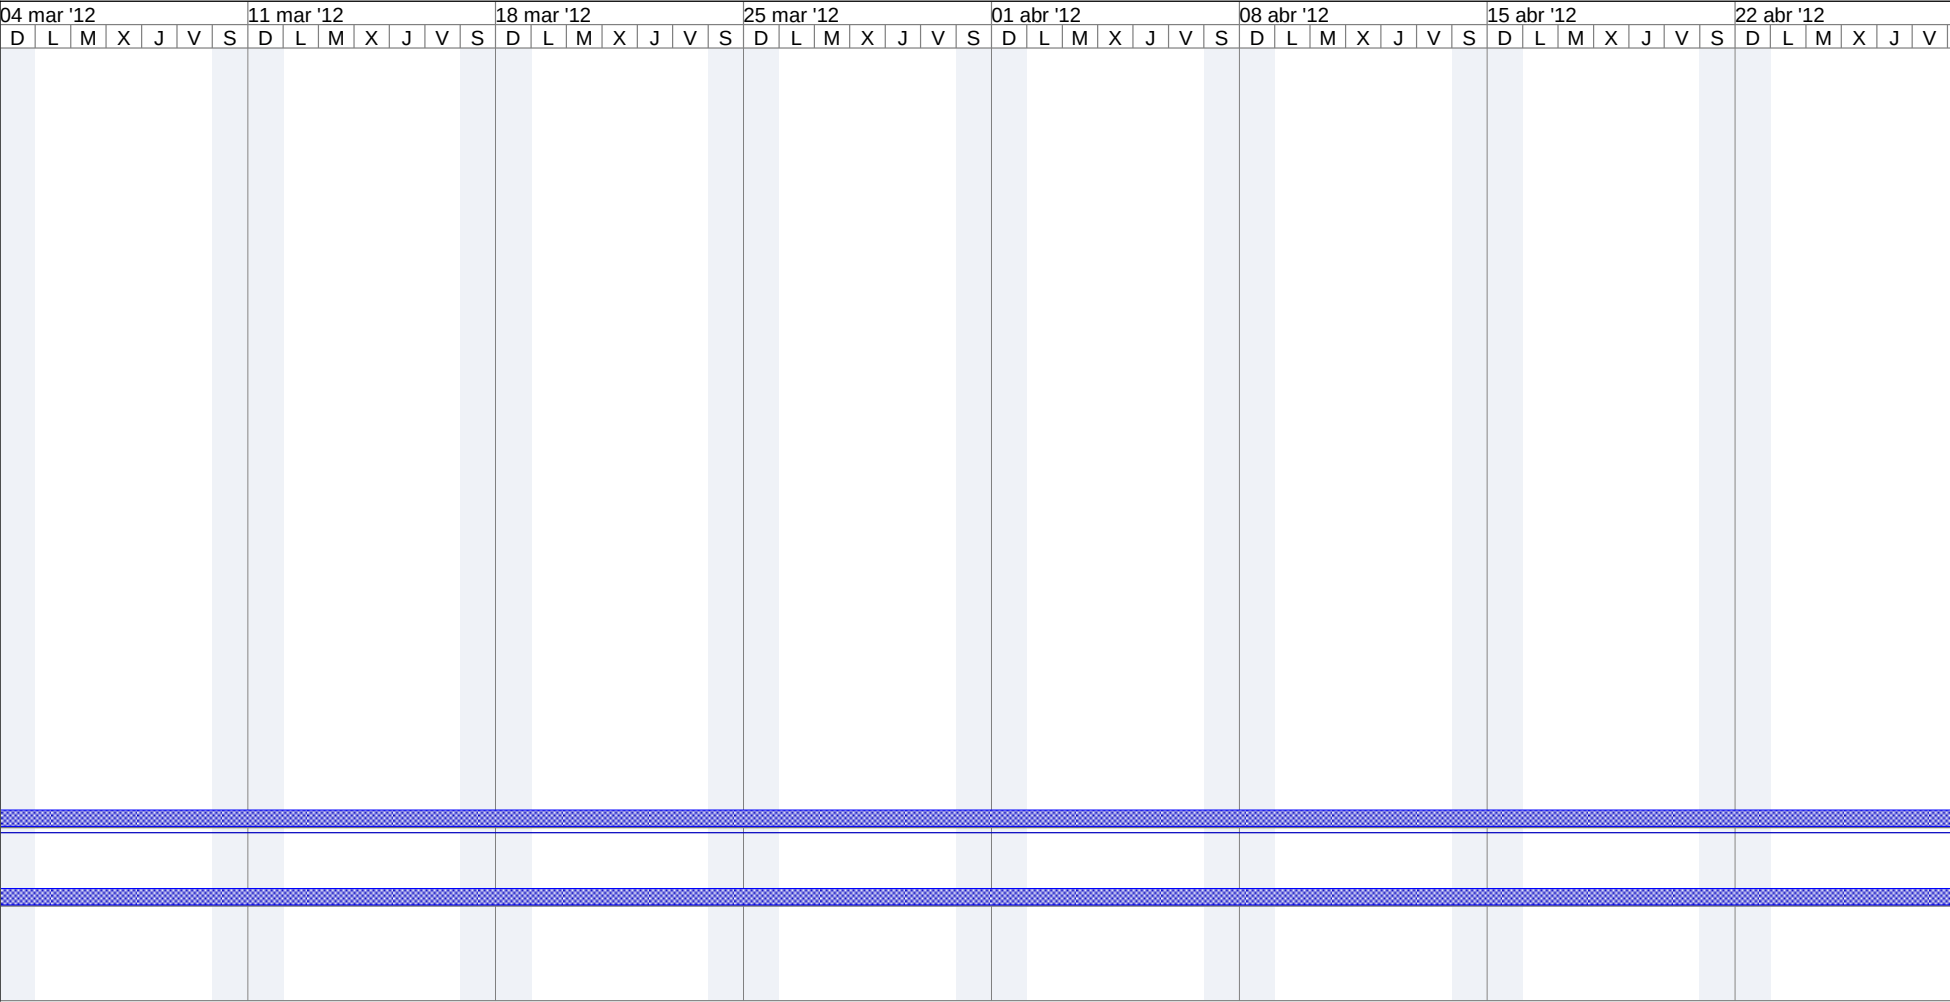


Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
Project Summary		Tarea manual		Progress	
External Tasks		Sólo duración		Split	

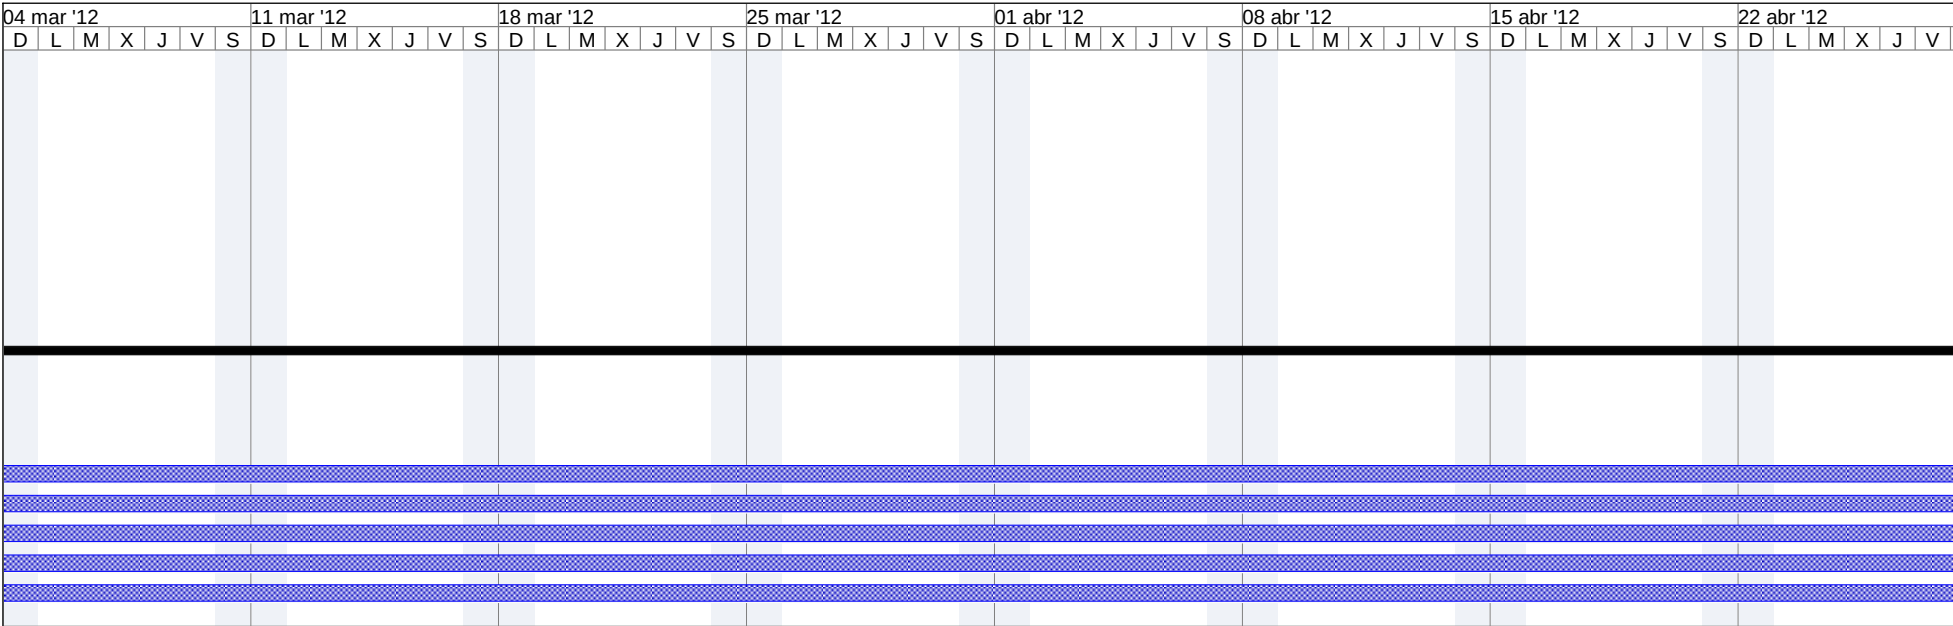

Project: Plan de Proyecto Preliminar v Date: jue 02/06/16	Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
	Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Project Summary		Tarea manual		Progress	
	External Tasks		Sólo duración		Split	

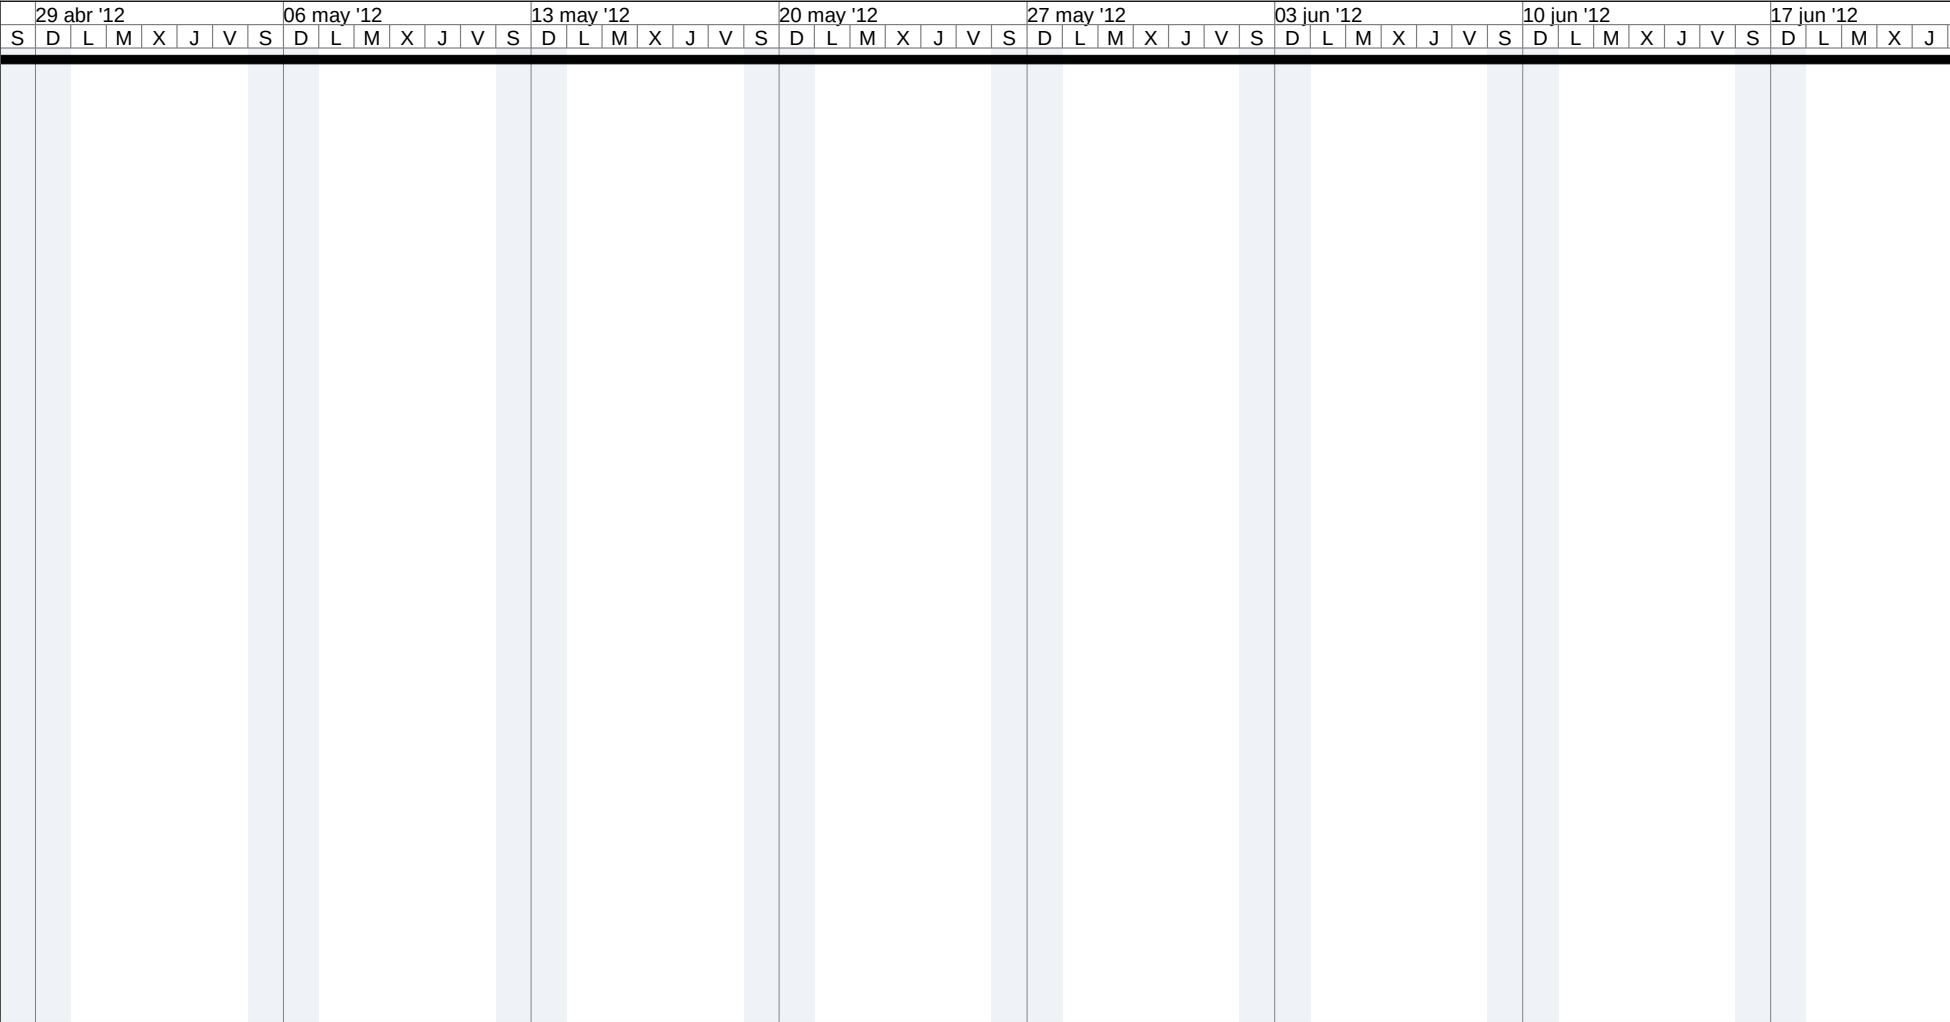

Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External MileTask

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual


Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin


Progress

Split

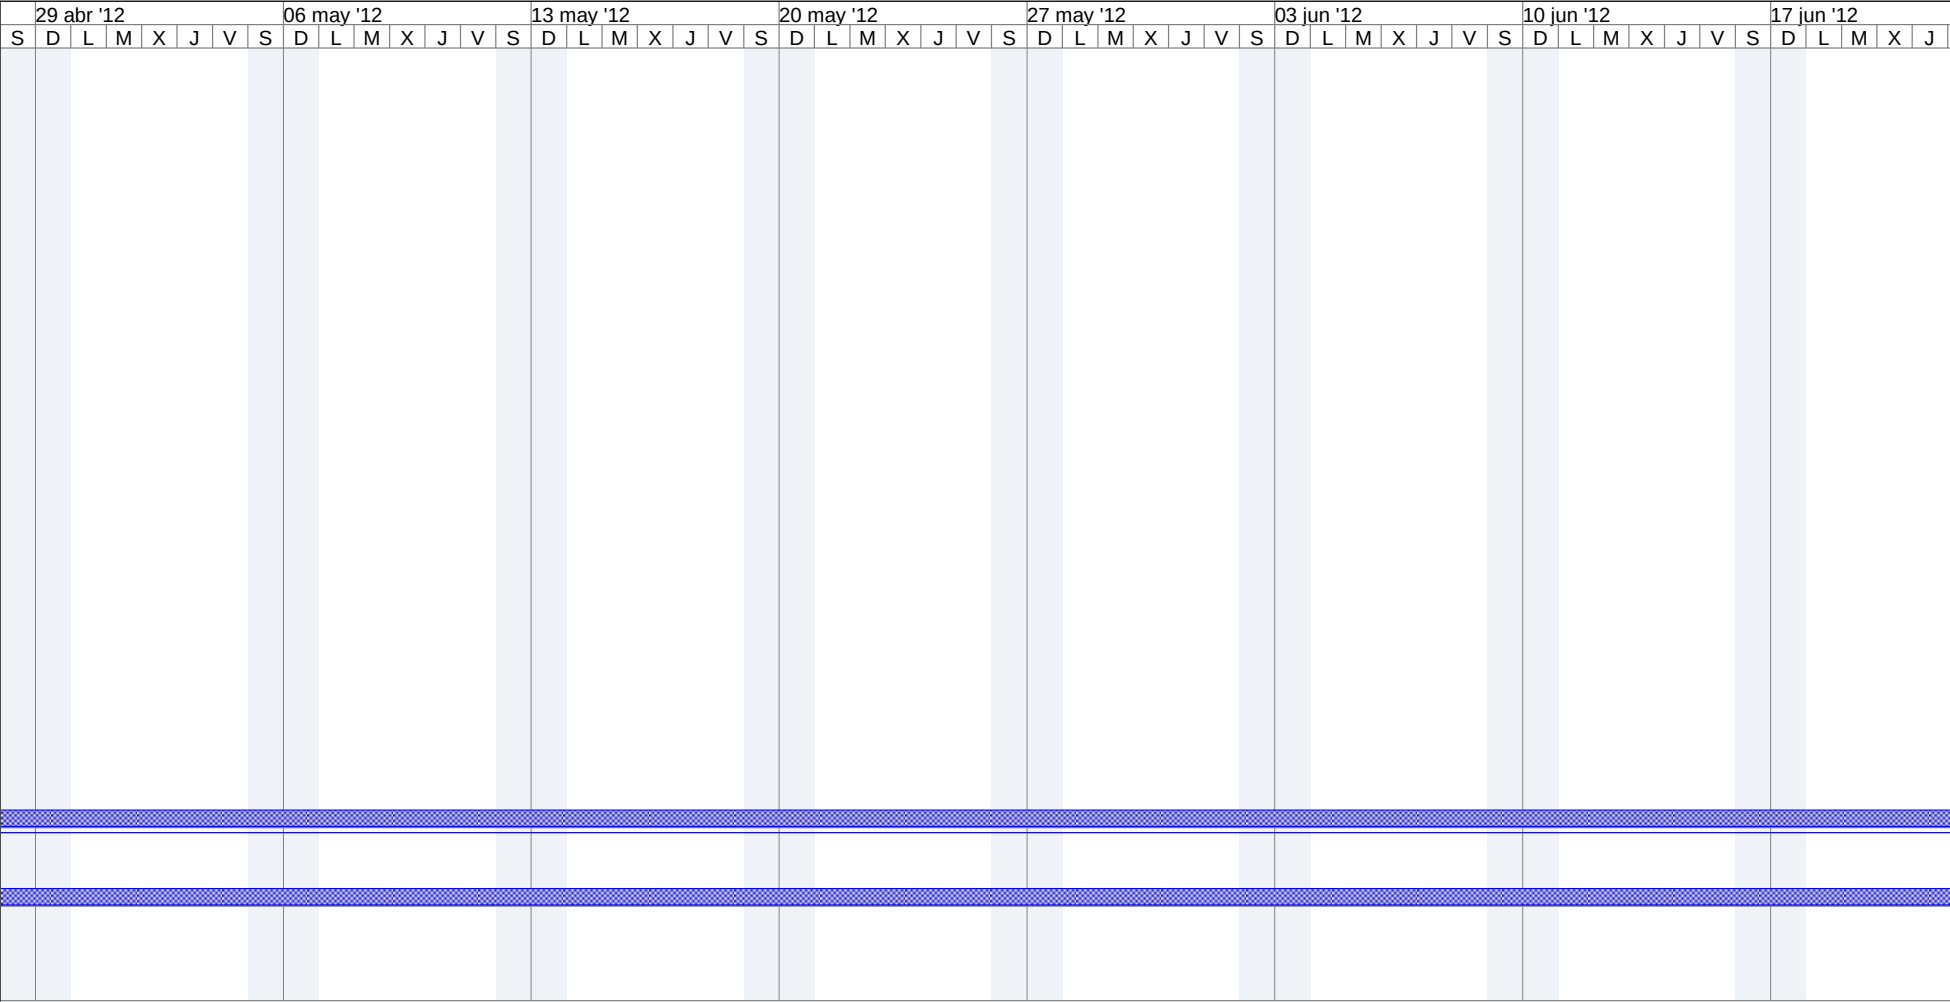

Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
Project Summary		Tarea manual		Progress	
External Tasks		Sólo duración		Split	

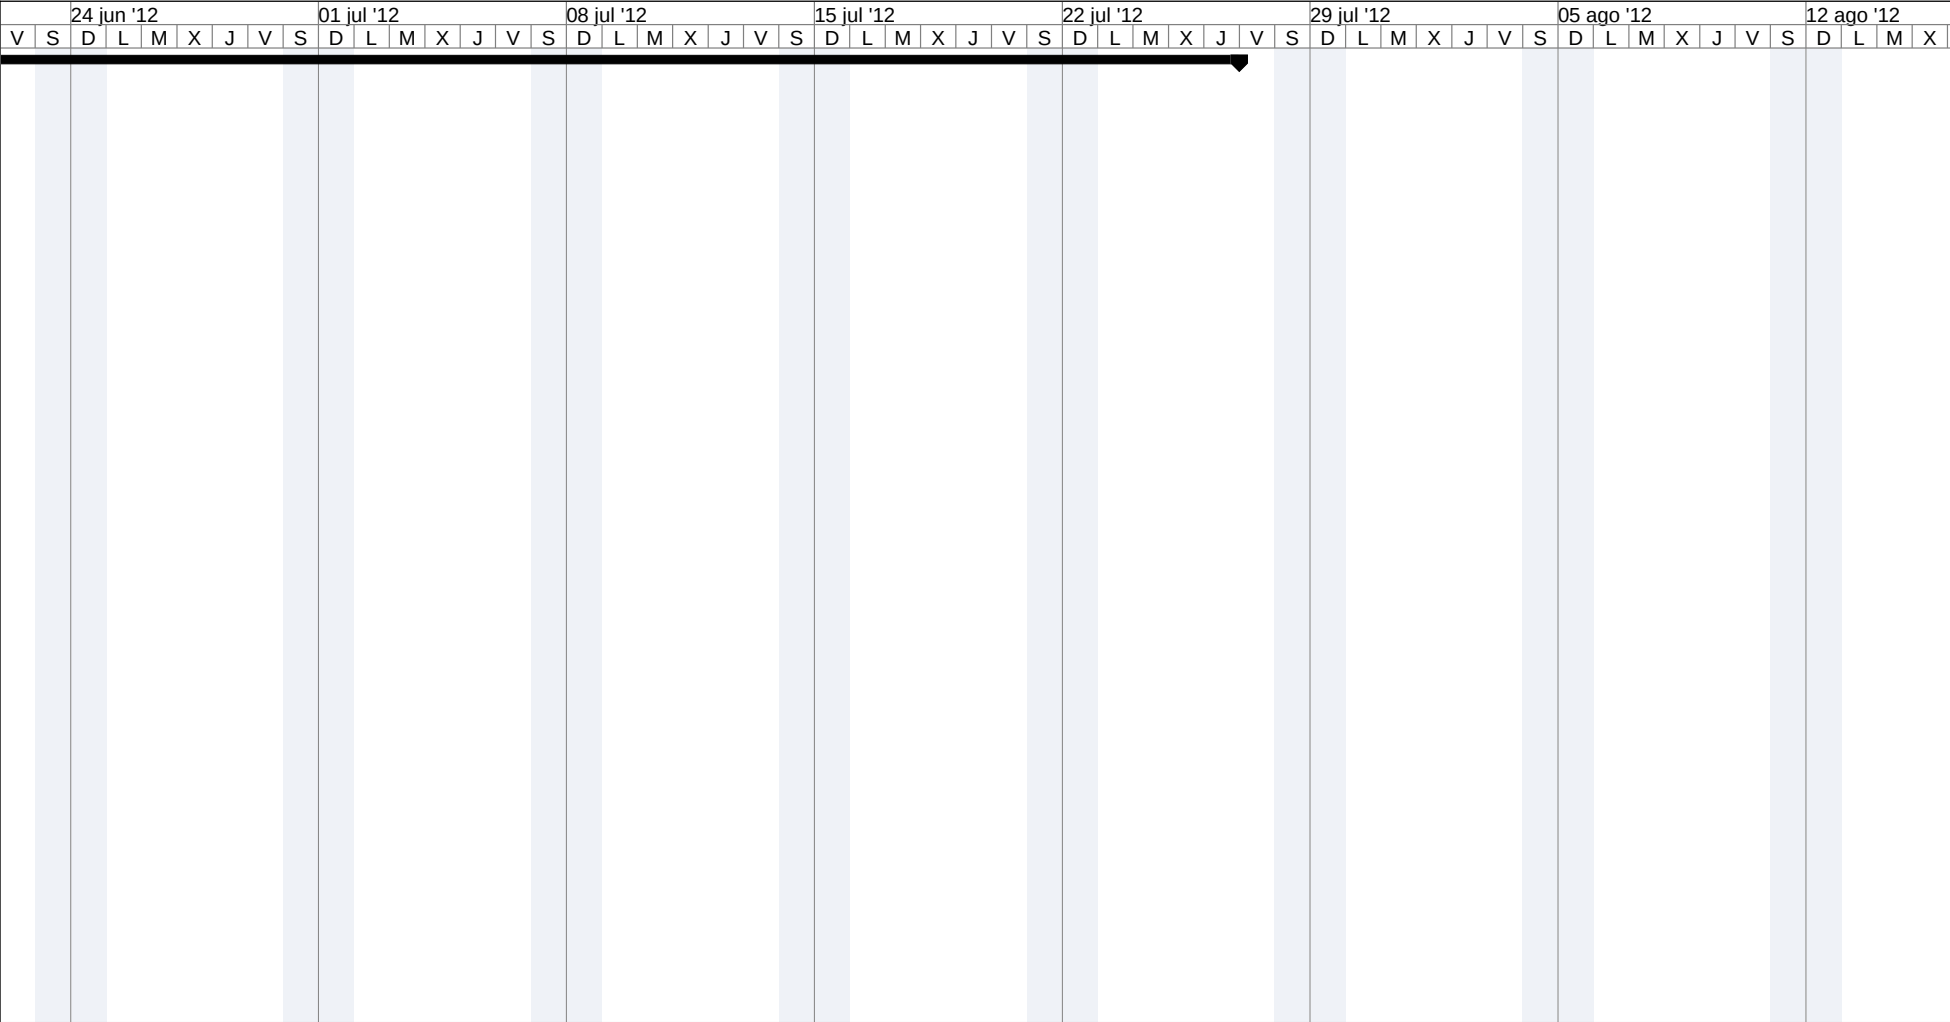

Project: Plan de Proyecto Preliminar v
Date: jue 02/06/16

Task		External MileTask		Informe de resumen manual	
Split		Tarea inactiva		Resumen manual	
Milestone		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Summary		Resumen inactivo		Sólo fin	
Project Summary		Tarea manual		Progress	
External Tasks		Sólo duración		Split	

