

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
1	121 días	mar 24/05/16	mié 21/09/16						
2	0 días	mar 24/05/16	mar 24/05/16						
3	120 días	mié 25/05/16	mié 21/09/16						
4	20 días	mar 19/07/16	dom 07/08/16						
5	20 días	mar 19/07/16	dom 07/08/16	2FC+56 días					
6	20 días	mar 19/07/16	dom 07/08/16	2FC+56 días					
7	25 días	mar 28/06/16	vie 22/07/16						
8	25 días	mar 28/06/16	vie 22/07/16	2FC+35 días					
9	25 días	mar 28/06/16	vie 22/07/16	2FC+35 días					
10	25 días	mar 28/06/16	vie 22/07/16	2FC+35 días					
11	25 días	mar 28/06/16	vie 22/07/16	2FC+35 días					
12	25 días	mar 28/06/16	vie 22/07/16	2FC+35 días					
13	25 días	mar 28/06/16	vie 22/07/16	2FC+35 días					
14	25 días	mar 28/06/16	vie 22/07/16	2FC+35 días					
15	30 días	dom 07/08/16	lun 05/09/16						
16	30 días	dom 07/08/16	lun 05/09/16	2FC+75 días					
17	30 días	dom 07/08/16	lun 05/09/16	2FC+75 días					
18	30 días	dom 07/08/16	lun 05/09/16	2FC+75 días					
19	30 días	dom 07/08/16	lun 05/09/16	2FC+75 días					
20	20 días	mar 05/07/16	dom 24/07/16						
21	20 días	mar 05/07/16	dom 24/07/16	2FC+42 días					
22	20 días	mar 05/07/16	dom 24/07/16	2FC+42 días					
23	20 días	mar 05/07/16	dom 24/07/16	2FC+42 días					

Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Página 1

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
24	25 días	vie 19/08/16	lun 12/09/16						
25	25 días	vie 19/08/16	lun 12/09/16	2FC+87 días					
26	25 días	vie 19/08/16	lun 12/09/16	2FC+87 días					
27	25 días	vie 19/08/16	lun 12/09/16	2FC+87 días					
28	40 días	mié 03/08/16	dom 11/09/16						
29	40 días	mié 03/08/16	dom 11/09/16	2FC+71 días					
30	40 días	mié 03/08/16	dom 11/09/16	2FC+71 días					
31	40 días	mié 03/08/16	dom 11/09/16	2FC+71 días					
32	40 días	mié 03/08/16	dom 11/09/16	2FC+71 días					
33	30 días	sáb 13/08/16	dom 11/09/16						
34	30 días	sáb 13/08/16	dom 11/09/16	2FC+81 días					
35	30 días	sáb 13/08/16	dom 11/09/16	2FC+81 días					
36	20 días	sáb 13/08/16	jue 01/09/16						
37	20 días	sáb 13/08/16	jue 01/09/16	2FC+81 días					
38	20 días	sáb 13/08/16	jue 01/09/16	2FC+81 días					
39	20 días	sáb 13/08/16	jue 01/09/16	2FC+81 días					
40	20 días	sáb 13/08/16	jue 01/09/16	2FC+81 días					
41	20 días	sáb 13/08/16	jue 01/09/16	2FC+81 días					
42	20 días	sáb 13/08/16	jue 01/09/16	2FC+81 días					
43	25 días	sáb 09/07/16	mar 02/08/16						
44	25 días	sáb 09/07/16	mar 02/08/16	2FC+46 días					
45	25 días	sáb 09/07/16	mar 02/08/16	2FC+46 días					
46	25 días	sáb 09/07/16	mar 02/08/16	2FC+46 días					

Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Página 2

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
47	60 días	lun 13/06/16	jue 11/08/16						
48	60 días	lun 13/06/16	jue 11/08/16	2FC+20 días					
49	60 días	lun 13/06/16	jue 11/08/16	2FC+20 días					
50	60 días	lun 13/06/16	jue 11/08/16	2FC+20 días					
51	60 días	lun 13/06/16	jue 11/08/16	2FC+20 días					
52	30 días	mié 25/05/16	jue 23/06/16						
53	30 días	mié 25/05/16	jue 23/06/16	2FC+1 día					
54	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16						
55	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16	2FC+30 días					
56	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16	2FC+30 días					
57	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16						
58	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16	2FC+20 días					
59	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16	2FC+20 días					
60	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16	2FC+20 días					
61	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16						
62	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16	2FC+20 días					
63	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16	2FC+20 días					
64	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16	2FC+20 días					
65	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16						
66	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16	2FC+20 días					
67	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16	2FC+20 días					
68	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16	2FC+20 días					
69	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16	2FC+20 días					

Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Página 3

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
70	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16						
71	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16	2FC+20 días					
72	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16	2FC+20 días					
73	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16	2FC+20 días					
74	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16	2FC+20 días					
75	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16	2FC+20 días					
76	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16	2FC+20 días					
77	120 días	mié 25/05/16	mié 21/09/16						
78	120 días	mié 25/05/16	mié 21/09/16	2FC+1 día					
79	120 días	mié 25/05/16	mié 21/09/16	2FC+1 día					
80	120 días	mié 25/05/16	mié 21/09/16	2FC+1 día					
81	120 días	mié 25/05/16	mié 21/09/16	2FC+1 día					
82	120 días	mié 25/05/16	mié 21/09/16	2FC+1 día					
83	120 días	mié 25/05/16	mié 21/09/16	2FC+1 día					
84	120 días	mié 25/05/16	mié 21/09/16	2FC+1 día					
85	120 días	mié 25/05/16	mié 21/09/16	2FC+1 día					
86	120 días	mié 25/05/16	mié 21/09/16	2FC+1 día					
87	120 días	mié 25/05/16	mié 21/09/16	2FC+1 día					
88	120 días	mié 25/05/16	mié 21/09/16	2FC+1 día					
89	30 días	sáb 23/07/16	dom 21/08/16						
90	30 días	sáb 23/07/16	dom 21/08/16	2FC+60 días					
91	30 días	sáb 23/07/16	dom 21/08/16	2FC+60 días					
92	40 días	mié 25/05/16	dom 03/07/16						
Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16 Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin Tareas externas Hito externo Fecha límite Progreso Progreso manual									
Página 4									

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
93	40 días	mié 25/05/16	dom 03/07/16	2FC+1 día					
94	40 días	mié 25/05/16	dom 03/07/16	2FC+1 día					
95	40 días	mié 25/05/16	dom 03/07/16	2FC+1 día					
96	45 días	jue 23/06/16	sáb 06/08/16						
97	45 días	jue 23/06/16	sáb 06/08/16	2FC+30 días					
98	45 días	jue 23/06/16	sáb 06/08/16	2FC+30 días					
99	45 días	jue 23/06/16	sáb 06/08/16	2FC+30 días					
100	35 días	lun 13/06/16	dom 17/07/16						
101	35 días	lun 13/06/16	dom 17/07/16	2FC+20 días					
102	35 días	lun 13/06/16	dom 17/07/16	2FC+20 días					
103	35 días	lun 13/06/16	dom 17/07/16	2FC+20 días					
104	30 días	mar 09/08/16	mié 07/09/16						
105	30 días	mar 09/08/16	mié 07/09/16	2FC+77 días					
106	30 días	mar 09/08/16	mié 07/09/16	2FC+77 días					
107	30 días	mar 09/08/16	mié 07/09/16	2FC+77 días					
108	60 días	vie 08/07/16	lun 05/09/16						
109	60 días	vie 08/07/16	lun 05/09/16	2FC+45 días					
110	60 días	vie 08/07/16	lun 05/09/16	2FC+45 días					
111	60 días	vie 08/07/16	lun 05/09/16	2FC+45 días					
112	60 días	vie 08/07/16	lun 05/09/16	2FC+45 días					
113	60 días	vie 08/07/16	lun 05/09/16	2FC+45 días					
114	60 días	vie 08/07/16	lun 05/09/16	2FC+45 días					
115	60 días	vie 08/07/16	lun 05/09/16	2FC+45 días					

Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
116	60 días	vie 08/07/16	lun 05/09/16	2FC+45 días					
117	45 días	jue 23/06/16	sáb 06/08/16						
118	45 días	jue 23/06/16	sáb 06/08/16	2FC+30 días					
119	90 días	mié 25/05/16	lun 22/08/16						
120	90 días	mié 25/05/16	lun 22/08/16	2FC+1 día					
121	90 días	mié 25/05/16	lun 22/08/16	2FC+1 día					
122	90 días	mié 25/05/16	lun 22/08/16	2FC+1 día					
123	90 días	mié 25/05/16	lun 22/08/16	2FC+1 día					
124	90 días	mié 25/05/16	lun 22/08/16	2FC+1 día					
125	60 días	lun 13/06/16	jue 11/08/16						
126	60 días	lun 13/06/16	jue 11/08/16	2FC+20 días					
127	60 días	lun 13/06/16	jue 11/08/16	2FC+20 días					
128	30 días	vie 12/08/16	sáb 10/09/16						
129	30 días	vie 12/08/16	sáb 10/09/16	2FC+80 días					
130	30 días	vie 12/08/16	sáb 10/09/16	2FC+80 días					
131	30 días	vie 12/08/16	sáb 10/09/16	2FC+80 días					
132	30 días	sáb 23/07/16	dom 21/08/16						
133	30 días	sáb 23/07/16	dom 21/08/16	2FC+60 días					
134	45 días	mié 25/05/16	vie 08/07/16						
135	45 días	mié 25/05/16	vie 08/07/16	2FC+1 día					
136	45 días	mié 25/05/16	vie 08/07/16	2FC+1 día					
137	45 días	mié 25/05/16	vie 08/07/16	2FC+1 día					
138	45 días	mié 25/05/16	vie 08/07/16	2FC+1 día					

Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
139	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16						
140	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16	2FC+20 días					
141	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16	2FC+20 días					
142	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16	2FC+20 días					
143	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16	2FC+20 días					
144	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16	2FC+20 días					
145	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16	2FC+20 días					
146	101 días	lun 13/06/16	mié 21/09/16	2FC+20 días					
147	51 días	mié 25/05/16	jue 14/07/16						
148	51 días	mié 25/05/16	jue 14/07/16	2FC+1 día					
149	51 días	mié 25/05/16	jue 14/07/16	2FC+1 día					
150	51 días	mié 25/05/16	jue 14/07/16	2FC+1 día					
151	51 días	mié 25/05/16	jue 14/07/16	2FC+1 día					
152	51 días	mié 25/05/16	jue 14/07/16	2FC+1 día					
153	51 días	mié 25/05/16	jue 14/07/16	2FC+1 día					
154	51 días	mié 25/05/16	jue 14/07/16	2FC+1 día					
155	35 días	vie 15/07/16	jue 18/08/16						
156	35 días	vie 15/07/16	jue 18/08/16	2FC+52 días					
157	35 días	vie 15/07/16	jue 18/08/16	2FC+52 días					
158	35 días	vie 15/07/16	jue 18/08/16	2FC+52 días					
159	35 días	vie 15/07/16	jue 18/08/16	2FC+52 días					
160	35 días	vie 15/07/16	jue 18/08/16	2FC+52 días					
161	35 días	vie 15/07/16	jue 18/08/16	2FC+52 días					

Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Página 7

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
162	35 días	vie 15/07/16	jue 18/08/16	2FC+52 días					
163	35 días	vie 15/07/16	jue 18/08/16	2FC+52 días					
164	40 días	sáb 23/07/16	mié 31/08/16						
165	40 días	sáb 23/07/16	mié 31/08/16	2FC+60 días					
166	40 días	sáb 23/07/16	mié 31/08/16	2FC+60 días					
167	40 días	sáb 23/07/16	mié 31/08/16	2FC+60 días					
168	40 días	sáb 23/07/16	mié 31/08/16						
169	40 días	sáb 23/07/16	mié 31/08/16	2FC+60 días					
170	40 días	sáb 23/07/16	mié 31/08/16	2FC+60 días					
171	40 días	sáb 23/07/16	mié 31/08/16	2FC+60 días					
172	60 días	lun 13/06/16	jue 11/08/16						
173	60 días	lun 13/06/16	jue 11/08/16	2FC+20 días					
174	60 días	lun 13/06/16	jue 11/08/16	2FC+20 días					
175	60 días	lun 13/06/16	jue 11/08/16	2FC+20 días					
176	60 días	lun 13/06/16	jue 11/08/16	2FC+20 días					
177	60 días	lun 13/06/16	jue 11/08/16	2FC+20 días					
178	60 días	lun 13/06/16	jue 11/08/16	2FC+20 días					
179	60 días	lun 13/06/16	jue 11/08/16	2FC+20 días					
180	45 días	jue 23/06/16	sáb 06/08/16						
181	45 días	jue 23/06/16	sáb 06/08/16	2FC+30 días					
182	45 días	jue 23/06/16	sáb 06/08/16	2FC+30 días					
183	45 días	jue 23/06/16	sáb 06/08/16	2FC+30 días					
184	45 días	jue 23/06/16	sáb 06/08/16	2FC+30 días					

Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
185	45 días	jue 23/06/16	sáb 06/08/16	2FC+30 días					
186	45 días	jue 23/06/16	sáb 06/08/16	2FC+30 días					
187	31 días	dom 24/07/16	mar 23/08/16						
188	31 días	dom 24/07/16	mar 23/08/16	2FC+61 días					
189	31 días	dom 24/07/16	mar 23/08/16	2FC+61 días					
190	120 días	mié 25/05/16	mié 21/09/16						
191	20 días	mié 24/08/16	lun 12/09/16						
192	20 días	mié 24/08/16	lun 12/09/16	2FC+92 días					
193	22 días	jue 14/07/16	jue 04/08/16						
194	22 días	jue 14/07/16	jue 04/08/16	2FC+51 días					
195	22 días	jue 14/07/16	jue 04/08/16	2FC+51 días					
196	22 días	jue 14/07/16	jue 04/08/16	2FC+51 días					
197	22 días	jue 14/07/16	jue 04/08/16	2FC+51 días					
198	15 días	dom 14/08/16	dom 28/08/16						
199	15 días	dom 14/08/16	dom 28/08/16	2FC+82 días					
200	15 días	dom 14/08/16	dom 28/08/16	2FC+82 días					
201	43 días	mar 26/07/16	mar 06/09/16						
202	43 días	mar 26/07/16	mar 06/09/16	2FC+63 días					
203	43 días	mar 26/07/16	mar 06/09/16	2FC+63 días					
204	43 días	mar 26/07/16	mar 06/09/16	2FC+63 días					
205	43 días	mar 26/07/16	mar 06/09/16	2FC+63 días					
206	43 días	mar 26/07/16	mar 06/09/16	2FC+63 días					
207	43 días	mar 26/07/16	mar 06/09/16	2FC+63 días					

Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
208	43 días	mar 26/07/16	mar 06/09/16	2FC+63 días					
209	43 días	mar 26/07/16	mar 06/09/16	2FC+63 días					
210	43 días	mar 26/07/16	mar 06/09/16	2FC+63 días					
211	43 días	mar 26/07/16	mar 06/09/16	2FC+63 días					
212	43 días	mar 26/07/16	mar 06/09/16	2FC+63 días					
213	20 días	lun 08/08/16	sáb 27/08/16						
214	20 días	lun 08/08/16	sáb 27/08/16	2FC+76 días					
215	30 días	mar 23/08/16	mié 21/09/16						
216	30 días	mar 23/08/16	mié 21/09/16	2FC+91 días					
217	20 días	mar 23/08/16	dom 11/09/16						
218	20 días	mar 23/08/16	dom 11/09/16	2FC+91 días					
219	20 días	mar 23/08/16	dom 11/09/16	2FC+91 días					
220	20 días	mar 23/08/16	dom 11/09/16	2FC+91 días					
221	20 días	mar 23/08/16	dom 11/09/16	2FC+91 días					
222	20 días	mar 23/08/16	dom 11/09/16	2FC+91 días					
223	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16						
224	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16	2FC+30 días					
225	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16	2FC+30 días					
226	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16	2FC+30 días					
227	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16	2FC+30 días					
228	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16	2FC+30 días					
229	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16	2FC+30 días					
230	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16	2FC+30 días					

Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
231	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16	2FC+30 días					
232	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16	2FC+30 días					
233	30 días	lun 08/08/16	mar 06/09/16						
234	30 días	lun 08/08/16	mar 06/09/16	2FC+76 días					
235	30 días	lun 08/08/16	mar 06/09/16	2FC+76 días					
236	30 días	lun 08/08/16	mar 06/09/16	2FC+76 días					
237	30 días	lun 08/08/16	mar 06/09/16	2FC+76 días					
238	30 días	lun 08/08/16	mar 06/09/16	2FC+76 días					
239	30 días	lun 18/07/16	mar 16/08/16						
240	30 días	lun 18/07/16	mar 16/08/16	2FC+55 días					
241	30 días	lun 18/07/16	mar 16/08/16	2FC+55 días					
242	30 días	lun 18/07/16	mar 16/08/16	2FC+55 días					
243	30 días	lun 18/07/16	mar 16/08/16	2FC+55 días					
244	30 días	lun 18/07/16	mar 16/08/16	2FC+55 días					
245	25 días	dom 07/08/16	mié 31/08/16						
246	25 días	dom 07/08/16	mié 31/08/16	2FC+75 días					
247	25 días	dom 07/08/16	mié 31/08/16	2FC+75 días					
248	25 días	dom 07/08/16	mié 31/08/16	2FC+75 días					
249	25 días	dom 07/08/16	mié 31/08/16	2FC+75 días					
250	25 días	dom 07/08/16	mié 31/08/16	2FC+75 días					
251	25 días	dom 07/08/16	mié 31/08/16	2FC+75 días					
252	25 días	dom 07/08/16	mié 31/08/16	2FC+75 días					
253	25 días	dom 07/08/16	mié 31/08/16	2FC+75 días					
Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16 Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin Tareas externas Hito externo Fecha límite Progreso Progreso manual									
Página 11									

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
254	22 días	mar 02/08/16	mar 23/08/16						
255	22 días	mar 02/08/16	mar 23/08/16	2FC+70 días					
256	30 días	mar 02/08/16	mié 31/08/16						
257	30 días	mar 02/08/16	mié 31/08/16	2FC+70 días					
258	30 días	mar 02/08/16	mié 31/08/16	2FC+70 días					
259	30 días	mar 02/08/16	mié 31/08/16	2FC+70 días					
260	30 días	mar 02/08/16	mié 31/08/16	2FC+70 días					
261	30 días	mar 02/08/16	mié 31/08/16	2FC+70 días					
262	15 días	jue 14/07/16	jue 28/07/16						
263	15 días	jue 14/07/16	jue 28/07/16	2FC+51 días					
264	15 días	jue 14/07/16	jue 28/07/16	2FC+51 días					
265	22 días	sáb 23/07/16	sáb 13/08/16						
266	22 días	sáb 23/07/16	sáb 13/08/16	2FC+60 días					
267	22 días	sáb 23/07/16	sáb 13/08/16	2FC+60 días					
268	22 días	sáb 23/07/16	sáb 13/08/16	2FC+60 días					
269	22 días	sáb 23/07/16	sáb 13/08/16	2FC+60 días					
270	22 días	sáb 23/07/16	sáb 13/08/16	2FC+60 días					
271	22 días	sáb 23/07/16	sáb 13/08/16	2FC+60 días					
272	22 días	sáb 23/07/16	sáb 13/08/16	2FC+60 días					
273	15 días	mié 07/09/16	mié 21/09/16						
274	15 días	mié 07/09/16	mié 21/09/16	2FC+106 días					
275	15 días	mié 07/09/16	mié 21/09/16	2FC+106 días					
276	25 días	mié 17/08/16	sáb 10/09/16						

Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Página 12

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
277	25 días	mié 17/08/16	sáb 10/09/16	2FC+85 días					
278	25 días	mié 17/08/16	sáb 10/09/16	2FC+85 días					
279	20 días	mié 17/08/16	lun 05/09/16						
280	20 días	mié 17/08/16	lun 05/09/16	2FC+85 días					
281	20 días	mié 17/08/16	lun 05/09/16	2FC+85 días					
282	20 días	mié 17/08/16	lun 05/09/16	2FC+85 días					
283	20 días	mié 17/08/16	lun 05/09/16	2FC+85 días					
284	20 días	mié 17/08/16	lun 05/09/16	2FC+85 días					
285	15 días	dom 17/07/16	dom 31/07/16						
286	15 días	dom 17/07/16	dom 31/07/16	2FC+54 días					
287	43 días	dom 17/07/16	dom 28/08/16						
288	43 días	dom 17/07/16	dom 28/08/16	2FC+54 días					
289	43 días	dom 17/07/16	dom 28/08/16	2FC+54 días					
290	43 días	dom 17/07/16	dom 28/08/16	2FC+54 días					
291	43 días	dom 17/07/16	dom 28/08/16	2FC+54 días					
292	43 días	dom 17/07/16	dom 28/08/16	2FC+54 días					
293	43 días	dom 17/07/16	dom 28/08/16	2FC+54 días					
294	43 días	dom 17/07/16	dom 28/08/16	2FC+54 días					
295	43 días	dom 17/07/16	dom 28/08/16	2FC+54 días					
296	25 días	dom 24/07/16	mié 17/08/16						
297	25 días	dom 24/07/16	mié 17/08/16	2FC+61 días					
298	25 días	dom 24/07/16	mié 17/08/16	2FC+61 días					
299	25 días	dom 24/07/16	mié 17/08/16	2FC+61 días					

Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
300	25 días	dom 24/07/16	mié 17/08/16	2FC+61 días					
301	35 días	lun 13/06/16	dom 17/07/16						
302	35 días	lun 13/06/16	dom 17/07/16	2FC+20 días					
303	35 días	lun 13/06/16	dom 17/07/16	2FC+20 días					
304	35 días	lun 13/06/16	dom 17/07/16	2FC+20 días					
305	35 días	lun 13/06/16	dom 17/07/16	2FC+20 días					
306	35 días	lun 13/06/16	dom 17/07/16	2FC+20 días					
307	53 días	mié 25/05/16	sáb 16/07/16						
308	53 días	mié 25/05/16	sáb 16/07/16	2FC+1 día					
309	53 días	mié 25/05/16	sáb 16/07/16	2FC+1 día					
310	53 días	mié 25/05/16	sáb 16/07/16	2FC+1 día					
311	53 días	mié 25/05/16	sáb 16/07/16	2FC+1 día					
312	37 días	lun 01/08/16	mar 06/09/16						
313	37 días	lun 01/08/16	mar 06/09/16	2FC+69 días					
314	37 días	lun 01/08/16	mar 06/09/16	2FC+69 días					
315	37 días	lun 01/08/16	mar 06/09/16	2FC+69 días					
316	45 días	lun 13/06/16	mié 27/07/16						
317	45 días	lun 13/06/16	mié 27/07/16	2FC+20 días					
318	45 días	lun 13/06/16	mié 27/07/16	2FC+20 días					
319	45 días	lun 13/06/16	mié 27/07/16	2FC+20 días					
320	45 días	jue 28/07/16	sáb 10/09/16						
321	45 días	jue 28/07/16	sáb 10/09/16	2FC+65 días					
322	50 días	mié 25/05/16	mié 13/07/16						

Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
323	50 días	mié 25/05/16	mié 13/07/16	2FC+1 día					
324	50 días	mié 25/05/16	mié 13/07/16	2FC+1 día					
325	50 días	mié 25/05/16	mié 13/07/16	2FC+1 día					
326	50 días	mié 25/05/16	mié 13/07/16	2FC+1 día					
327	50 días	mié 25/05/16	mié 13/07/16	2FC+1 día					
328	50 días	mié 25/05/16	mié 13/07/16	2FC+1 día					
329	43 días	lun 13/06/16	lun 25/07/16						
330	43 días	lun 13/06/16	lun 25/07/16	2FC+20 días					
331	43 días	lun 13/06/16	lun 25/07/16	2FC+20 días					
332	35 días	jue 18/08/16	mié 21/09/16						
333	35 días	jue 18/08/16	mié 21/09/16	2FC+86 días					
334	35 días	jue 18/08/16	mié 21/09/16	2FC+86 días					
335	60 días	mié 25/05/16	sáb 23/07/16						
336	60 días	mié 25/05/16	sáb 23/07/16	2FC+1 día					
337	30 días	jue 23/06/16	vie 22/07/16						
338	30 días	jue 23/06/16	vie 22/07/16	2FC+30 días					
339	30 días	jue 23/06/16	vie 22/07/16	2FC+30 días					
340	30 días	jue 23/06/16	vie 22/07/16	2FC+30 días					
341	30 días	jue 23/06/16	vie 22/07/16	2FC+30 días					
342	30 días	jue 23/06/16	vie 22/07/16	2FC+30 días					
343	37 días	sáb 23/07/16	dom 28/08/16						
344	37 días	sáb 23/07/16	dom 28/08/16	2FC+60 días					
345	45 días	jue 23/06/16	sáb 06/08/16						

Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Página 15

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
346	45 días	jue 23/06/16	sáb 06/08/16	2FC+30 días					
347	75 días	mié 25/05/16	dom 07/08/16						
348	75 días	mié 25/05/16	dom 07/08/16	2FC+1 día					
349	75 días	mié 25/05/16	dom 07/08/16	2FC+1 día					
350	75 días	mié 25/05/16	dom 07/08/16	2FC+1 día					
351	45 días	sáb 23/07/16	lun 05/09/16						
352	45 días	sáb 23/07/16	lun 05/09/16	2FC+60 días					
353	45 días	sáb 23/07/16	lun 05/09/16	2FC+60 días					
354	45 días	mié 25/05/16	vie 08/07/16						
355	45 días	mié 25/05/16	vie 08/07/16	2FC+1 día					
356	45 días	mié 25/05/16	vie 08/07/16	2FC+1 día					
357	45 días	mié 25/05/16	vie 08/07/16	2FC+1 día					
358	45 días	lun 08/08/16	mié 21/09/16						
359	45 días	lun 08/08/16	mié 21/09/16	2FC+76 días					
360	30 días	sáb 09/07/16	dom 07/08/16						
361	30 días	sáb 09/07/16	dom 07/08/16	2FC+46 días					
362	30 días	sáb 09/07/16	dom 07/08/16	2FC+46 días					
363	30 días	sáb 09/07/16	dom 07/08/16	2FC+46 días					
364	50 días	mié 25/05/16	mié 13/07/16						
365	50 días	mié 25/05/16	mié 13/07/16	2FC+1 día					
366	50 días	mié 25/05/16	mié 13/07/16	2FC+1 día					
367	50 días	mié 25/05/16	mié 13/07/16	2FC+1 día					
368	50 días	mié 25/05/16	mié 13/07/16	2FC+1 día					
Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16 Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin Tareas externas Hito externo Fecha límite Progreso Progreso manual									
Página 16									

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
369	40 días	jue 14/07/16	lun 22/08/16						
370	40 días	jue 14/07/16	lun 22/08/16	2FC+51 días					
371	40 días	jue 14/07/16	lun 22/08/16	2FC+51 días					
372	40 días	jue 14/07/16	lun 22/08/16	2FC+51 días					
373	40 días	jue 14/07/16	lun 22/08/16	2FC+51 días					
374	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16						
375	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16	2FC+30 días					
376	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16	2FC+30 días					
377	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16	2FC+30 días					
378	120 días	mié 25/05/16	mié 21/09/16						
379	30 días	mar 23/08/16	mié 21/09/16						
380	30 días	mar 23/08/16	mié 21/09/16	2FC+91 días					
381	30 días	mar 23/08/16	mié 21/09/16	2FC+91 días					
382	30 días	lun 04/07/16	mar 02/08/16						
383	30 días	lun 04/07/16	mar 02/08/16	2FC+41 días					
384	30 días	lun 04/07/16	mar 02/08/16	2FC+41 días					
385	30 días	lun 04/07/16	mar 02/08/16	2FC+41 días					
386	30 días	lun 04/07/16	mar 02/08/16	2FC+41 días					
387	30 días	lun 04/07/16	mar 02/08/16	2FC+41 días					
388	20 días	mar 16/08/16	dom 04/09/16						
389	20 días	mar 16/08/16	dom 04/09/16	2FC+84 días					
390	20 días	mar 16/08/16	dom 04/09/16	2FC+84 días					
391	15 días	mié 03/08/16	mié 17/08/16						

Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Página 17

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
392	15 días	mié 03/08/16	mié 17/08/16	2FC+71 días					
393	15 días	mié 03/08/16	mié 17/08/16	2FC+71 días					
394	15 días	mié 03/08/16	mié 17/08/16	2FC+71 días					
395	15 días	mié 03/08/16	mié 17/08/16	2FC+71 días					
396	45 días	vie 24/06/16	dom 07/08/16						
397	45 días	vie 24/06/16	dom 07/08/16	2FC+31 días					
398	45 días	vie 24/06/16	dom 07/08/16	2FC+31 días					
399	45 días	vie 24/06/16	dom 07/08/16	2FC+31 días					
400	45 días	vie 24/06/16	dom 07/08/16	2FC+31 días					
401	45 días	vie 24/06/16	dom 07/08/16	2FC+31 días					
402	45 días	vie 24/06/16	dom 07/08/16	2FC+31 días					
403	45 días	vie 24/06/16	dom 07/08/16	2FC+31 días					
404	45 días	vie 24/06/16	dom 07/08/16	2FC+31 días					
405	45 días	vie 24/06/16	dom 07/08/16	2FC+31 días					
406	45 días	vie 24/06/16	dom 07/08/16	2FC+31 días					
407	45 días	vie 24/06/16	dom 07/08/16	2FC+31 días					
408	45 días	vie 24/06/16	dom 07/08/16	2FC+31 días					
409	20 días	mar 16/08/16	dom 04/09/16						
410	20 días	mar 16/08/16	dom 04/09/16	2FC+84 días					
411	20 días	mar 16/08/16	dom 04/09/16	2FC+84 días					
412	20 días	mar 16/08/16	dom 04/09/16	2FC+84 días					
413	30 días	mié 17/08/16	jue 15/09/16						
414	30 días	mié 17/08/16	jue 15/09/16	2FC+85 días					

Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
415	30 días	mié 17/08/16	jue 15/09/16	2FC+85 días					
416	30 días	mié 17/08/16	jue 15/09/16	2FC+85 días					
417	30 días	mié 17/08/16	jue 15/09/16	2FC+85 días					
418	30 días	mié 17/08/16	jue 15/09/16	2FC+85 días					
419	30 días	mié 17/08/16	jue 15/09/16	2FC+85 días					
420	30 días	mié 17/08/16	jue 15/09/16	2FC+85 días					
421	30 días	mié 17/08/16	jue 15/09/16	2FC+85 días					
422	30 días	mié 17/08/16	jue 15/09/16	2FC+85 días					
423	20 días	lun 15/08/16	sáb 03/09/16						
424	20 días	lun 15/08/16	sáb 03/09/16	2FC+83 días					
425	20 días	lun 15/08/16	sáb 03/09/16	2FC+83 días					
426	20 días	sáb 13/08/16	jue 01/09/16						
427	20 días	sáb 13/08/16	jue 01/09/16	2FC+81 días					
428	20 días	sáb 13/08/16	jue 01/09/16	2FC+81 días					
429	20 días	sáb 13/08/16	jue 01/09/16	2FC+81 días					
430	20 días	sáb 13/08/16	jue 01/09/16	2FC+81 días					
431	20 días	sáb 13/08/16	jue 01/09/16	2FC+81 días					
432	37 días	sáb 30/07/16	dom 04/09/16						
433	37 días	sáb 30/07/16	dom 04/09/16	2FC+67 días					
434	37 días	sáb 30/07/16	dom 04/09/16	2FC+67 días					
435	37 días	sáb 30/07/16	dom 04/09/16	2FC+67 días					
436	37 días	sáb 30/07/16	dom 04/09/16	2FC+67 días					
437	37 días	sáb 30/07/16	dom 04/09/16	2FC+67 días					

Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
438	48 días	mié 25/05/16	lun 11/07/16						
439	48 días	mié 25/05/16	lun 11/07/16	2FC+1 día					
440	48 días	mié 25/05/16	lun 11/07/16	2FC+1 día					
441	48 días	mié 25/05/16	lun 11/07/16	2FC+1 día					
442	48 días	mié 25/05/16	lun 11/07/16	2FC+1 día					
443	48 días	mié 25/05/16	lun 11/07/16	2FC+1 día					
444	48 días	mié 25/05/16	lun 11/07/16	2FC+1 día					
445	48 días	mié 25/05/16	lun 11/07/16	2FC+1 día					
446	48 días	mié 25/05/16	lun 11/07/16	2FC+1 día					
447	48 días	mié 25/05/16	lun 11/07/16	2FC+1 día					
448	48 días	mié 25/05/16	lun 11/07/16	2FC+1 día					
449	48 días	mié 25/05/16	lun 11/07/16	2FC+1 día					
450	25 días	lun 08/08/16	jue 01/09/16						
451	25 días	lun 08/08/16	jue 01/09/16	2FC+76 días					
452	25 días	lun 08/08/16	jue 01/09/16	2FC+76 días					
453	25 días	lun 08/08/16	jue 01/09/16	2FC+76 días					
454	20 días	lun 25/07/16	sáb 13/08/16						
455	20 días	lun 25/07/16	sáb 13/08/16	2FC+62 días					
456	20 días	lun 25/07/16	sáb 13/08/16	2FC+62 días					
457	20 días	lun 25/07/16	sáb 13/08/16	2FC+62 días					
458	20 días	lun 25/07/16	sáb 13/08/16	2FC+62 días					
459	20 días	lun 25/07/16	sáb 13/08/16	2FC+62 días					
460	20 días	lun 22/08/16	sáb 10/09/16						

Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
461	20 días	lun 22/08/16	sáb 10/09/16	2FC+90 días					
462	20 días	lun 22/08/16	sáb 10/09/16	2FC+90 días					
463	20 días	lun 22/08/16	sáb 10/09/16	2FC+90 días					
464	20 días	lun 22/08/16	sáb 10/09/16	2FC+90 días					
465	20 días	lun 22/08/16	sáb 10/09/16	2FC+90 días					
466	20 días	mié 03/08/16	lun 22/08/16						
467	20 días	mié 03/08/16	lun 22/08/16	2FC+71 días					
468	20 días	mié 03/08/16	lun 22/08/16	2FC+71 días					
469	20 días	mié 03/08/16	lun 22/08/16	2FC+71 días					
470	20 días	mié 03/08/16	lun 22/08/16						
471	20 días	mié 03/08/16	lun 22/08/16	2FC+71 días					
472	20 días	mié 03/08/16	lun 22/08/16	2FC+71 días					
473	20 días	mié 03/08/16	lun 22/08/16						
474	20 días	mié 03/08/16	lun 22/08/16	2FC+71 días					
475	45 días	jue 14/07/16	sáb 27/08/16						
476	45 días	jue 14/07/16	sáb 27/08/16	2FC+51 días					
477	45 días	jue 14/07/16	sáb 27/08/16	2FC+51 días					
478	45 días	jue 14/07/16	sáb 27/08/16	2FC+51 días					
479	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16						
480	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16	2FC+30 días					
481	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16	2FC+30 días					


Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			


Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
482	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16	2FC+30 días					
483	40 días	lun 08/08/16	vie 16/09/16						
484	40 días	lun 08/08/16	vie 16/09/16	2FC+76 días					
485	40 días	lun 08/08/16	vie 16/09/16	2FC+76 días					
486	40 días	lun 08/08/16	vie 16/09/16	2FC+76 días					
487	40 días	lun 08/08/16	vie 16/09/16	2FC+76 días					
488	30 días	mié 25/05/16	jue 23/06/16						
489	30 días	mié 25/05/16	jue 23/06/16	2FC+1 día					
490	30 días	mié 25/05/16	jue 23/06/16	2FC+1 día					
491	60 días	jue 23/06/16	dom 21/08/16						
492	60 días	jue 23/06/16	dom 21/08/16	2FC+30 días					
493	60 días	jue 23/06/16	dom 21/08/16	2FC+30 días					
494	60 días	jue 23/06/16	dom 21/08/16	2FC+30 días					
495	60 días	jue 23/06/16	dom 21/08/16	2FC+30 días					
496	60 días	jue 23/06/16	dom 21/08/16	2FC+30 días					
497	60 días	jue 23/06/16	dom 21/08/16	2FC+30 días					
498	60 días	jue 23/06/16	dom 21/08/16	2FC+30 días					
499	60 días	jue 23/06/16	dom 21/08/16	2FC+30 días					
500	60 días	jue 23/06/16	dom 21/08/16	2FC+30 días					
501	60 días	jue 23/06/16	dom 21/08/16	2FC+30 días					
502	60 días	jue 23/06/16	dom 21/08/16						
503	60 días	jue 23/06/16	dom 21/08/16	2FC+30 días					
504	60 días	jue 23/06/16	dom 21/08/16	2FC+30 días					
Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16 Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin Tareas externas Hito externo Fecha límite Progreso Progreso manual									
Página 22									

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
505	60 días	jue 23/06/16	dom 21/08/16	2FC+30 días					
506	60 días	jue 23/06/16	dom 21/08/16	2FC+30 días					
507	60 días	jue 23/06/16	dom 21/08/16	2FC+30 días					
508	60 días	jue 23/06/16	dom 21/08/16	2FC+30 días					
509	60 días	jue 23/06/16	dom 21/08/16	2FC+30 días					
510	60 días	mié 25/05/16	sáb 23/07/16						
511	60 días	mié 25/05/16	sáb 23/07/16	2FC+1 día					
512	60 días	mié 25/05/16	sáb 23/07/16	2FC+1 día					
513	60 días	mié 25/05/16	sáb 23/07/16	2FC+1 día					
514	30 días	lun 04/07/16	mar 02/08/16						
515	30 días	lun 04/07/16	mar 02/08/16	2FC+41 días					
516	30 días	lun 04/07/16	mar 02/08/16	2FC+41 días					
517	40 días	mié 25/05/16	dom 03/07/16						
518	40 días	mié 25/05/16	dom 03/07/16	2FC+1 día					
519	40 días	mié 25/05/16	dom 03/07/16	2FC+1 día					
520	40 días	mié 25/05/16	dom 03/07/16	2FC+1 día					
521	50 días	jue 23/06/16	jue 11/08/16						
522	50 días	jue 23/06/16	jue 11/08/16	2FC+30 días					
523	50 días	jue 23/06/16	jue 11/08/16	2FC+30 días					
524	50 días	jue 23/06/16	jue 11/08/16	2FC+30 días					
525	50 días	jue 23/06/16	jue 11/08/16	2FC+30 días					
526	50 días	jue 23/06/16	jue 11/08/16	2FC+30 días					
527	35 días	mié 25/05/16	mar 28/06/16						
Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16 Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin Tareas externas Hito externo Fecha límite Progreso Progreso manual									
Página 23									


Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
528	35 días	mié 25/05/16	mar 28/06/16	2FC+1 día					
529	35 días	mié 25/05/16	mar 28/06/16	2FC+1 día					
530	37 días	jue 23/06/16	vie 29/07/16						
531	37 días	jue 23/06/16	vie 29/07/16	2FC+30 días					
532	37 días	jue 23/06/16	vie 29/07/16	2FC+30 días					
533	37 días	jue 23/06/16	vie 29/07/16	2FC+30 días					
534	35 días	mar 12/07/16	lun 15/08/16						
535	35 días	mar 12/07/16	lun 15/08/16	2FC+49 días					
536	35 días	mar 12/07/16	lun 15/08/16	2FC+49 días					
537	35 días	mar 12/07/16	lun 15/08/16	2FC+49 días					
538	35 días	mié 13/07/16	mar 16/08/16						
539	35 días	mié 13/07/16	mar 16/08/16	2FC+50 días					
540	35 días	mié 29/06/16	mar 02/08/16						
541	35 días	mié 29/06/16	mar 02/08/16	2FC+36 días					
542	35 días	sáb 23/07/16	vie 26/08/16						
543	35 días	sáb 23/07/16	vie 26/08/16	2FC+60 días					
544	35 días	sáb 23/07/16	vie 26/08/16	2FC+60 días					
545	45 días	dom 07/08/16	mar 20/09/16						
546	45 días	dom 07/08/16	mar 20/09/16	2FC+75 días					
547	50 días	mié 25/05/16	mié 13/07/16						
548	50 días	mié 25/05/16	mié 13/07/16	2FC+1 día					
549	50 días	mié 25/05/16	mié 13/07/16	2FC+1 día					
550	50 días	mié 25/05/16	mié 13/07/16	2FC+1 día					
Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16 Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin Tareas externas Hito externo Fecha límite Progreso Progreso manual									
Página 24									


Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	junio			
						M	F	P	M
551	50 días	mié 25/05/16	mié 13/07/16	2FC+1 día					
552	45 días	jue 23/06/16	sáb 06/08/16						
553	45 días	jue 23/06/16	sáb 06/08/16	2FC+30 días					
554	45 días	jue 23/06/16	sáb 06/08/16	2FC+30 días					
555	45 días	jue 23/06/16	sáb 06/08/16	2FC+30 días					
556	40 días	sáb 23/07/16	mié 31/08/16						
557	40 días	sáb 23/07/16	mié 31/08/16	2FC+60 días					
558	40 días	sáb 23/07/16	mié 31/08/16	2FC+60 días					
559	40 días	sáb 23/07/16	mié 31/08/16	2FC+60 días					
560	40 días	sáb 23/07/16	mié 31/08/16	2FC+60 días					
561	40 días	sáb 23/07/16	mié 31/08/16	2FC+60 días					
562	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16						
563	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16	2FC+30 días					
564	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16	2FC+30 días					
565	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16	2FC+30 días					
566	40 días	jue 23/06/16	lun 01/08/16	2FC+30 días					
567	45 días	jue 23/06/16	sáb 06/08/16						
568	45 días	jue 23/06/16	sáb 06/08/16	2FC+30 días					
569	45 días	jue 23/06/16	sáb 06/08/16	2FC+30 días					
570	45 días	jue 23/06/16	sáb 06/08/16	2FC+30 días					
Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16 Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin Tareas externas Hito externo Fecha límite Progreso Progreso manual									
Página 25									

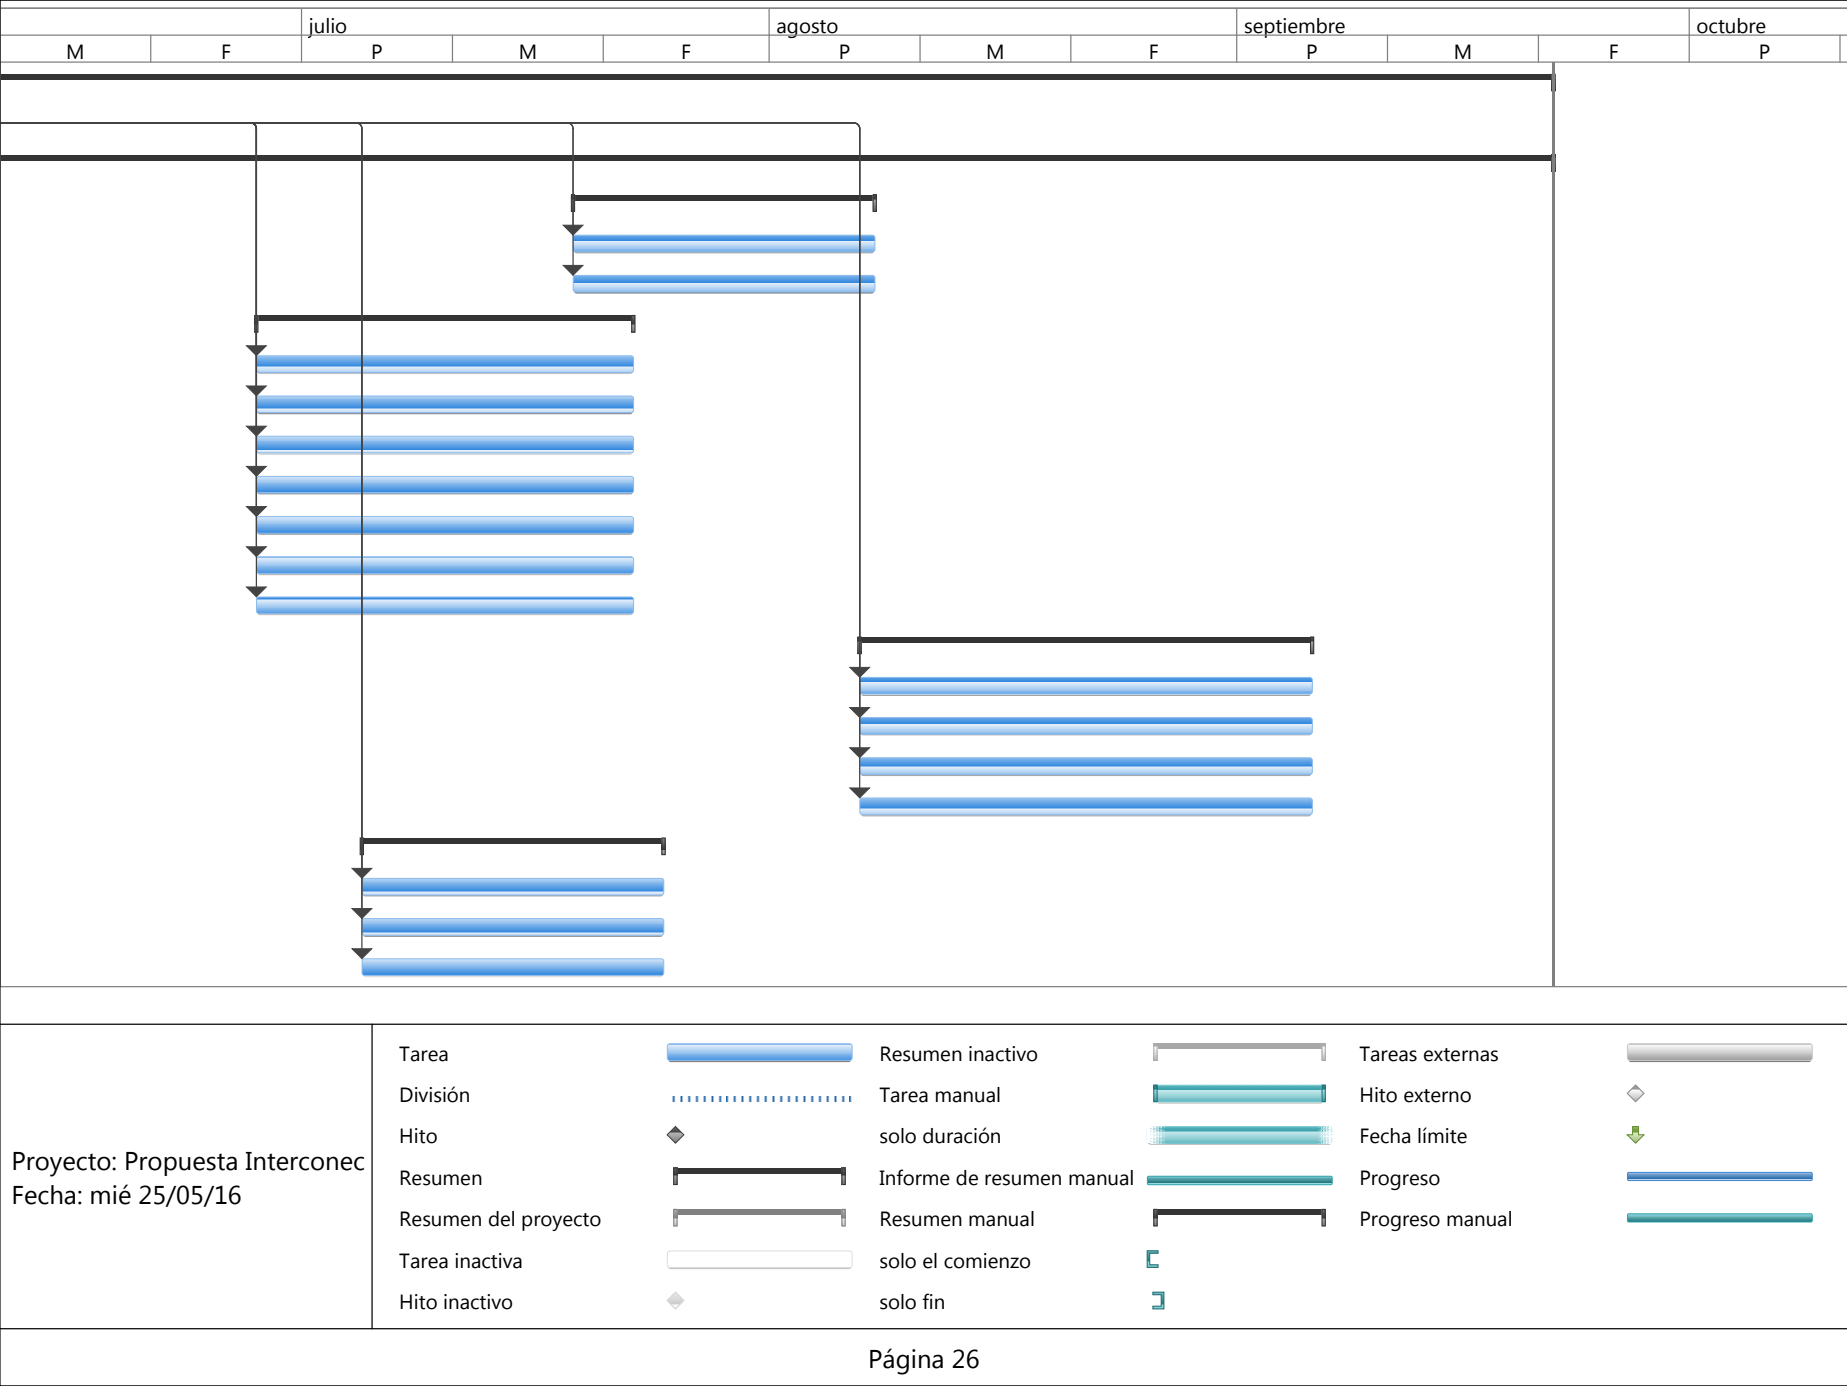

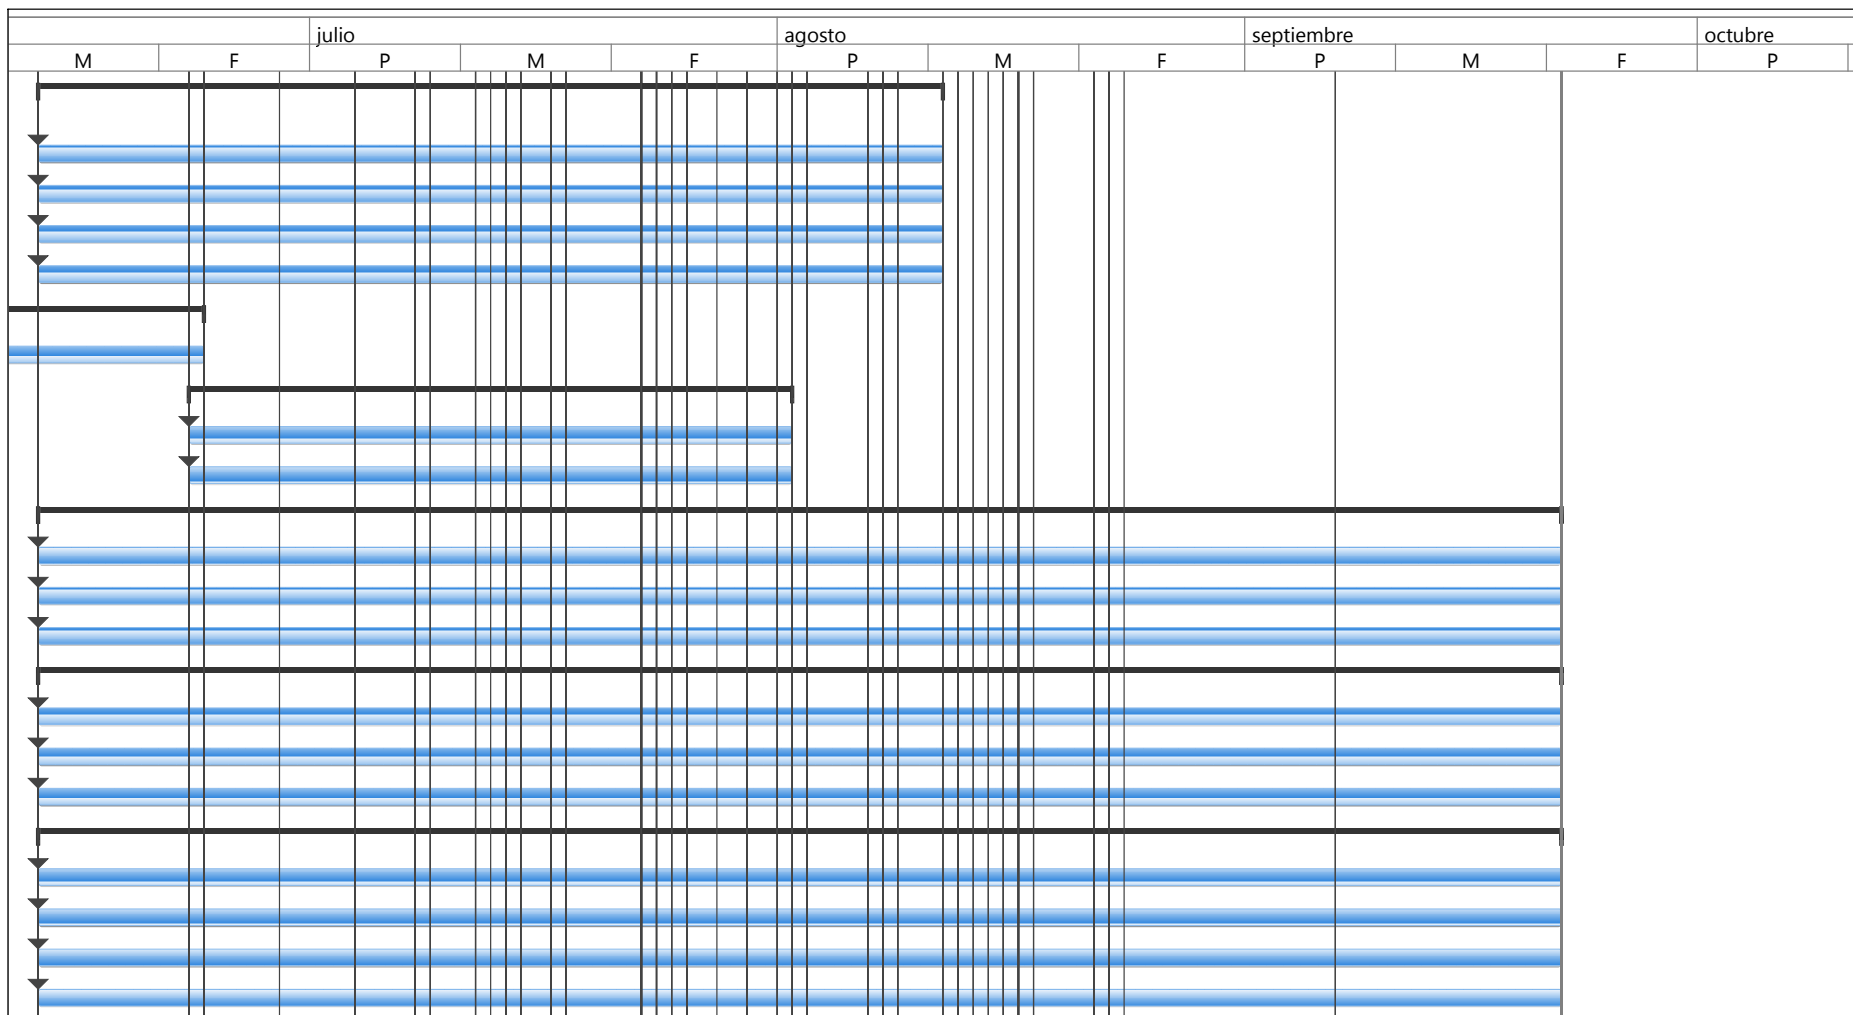


Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



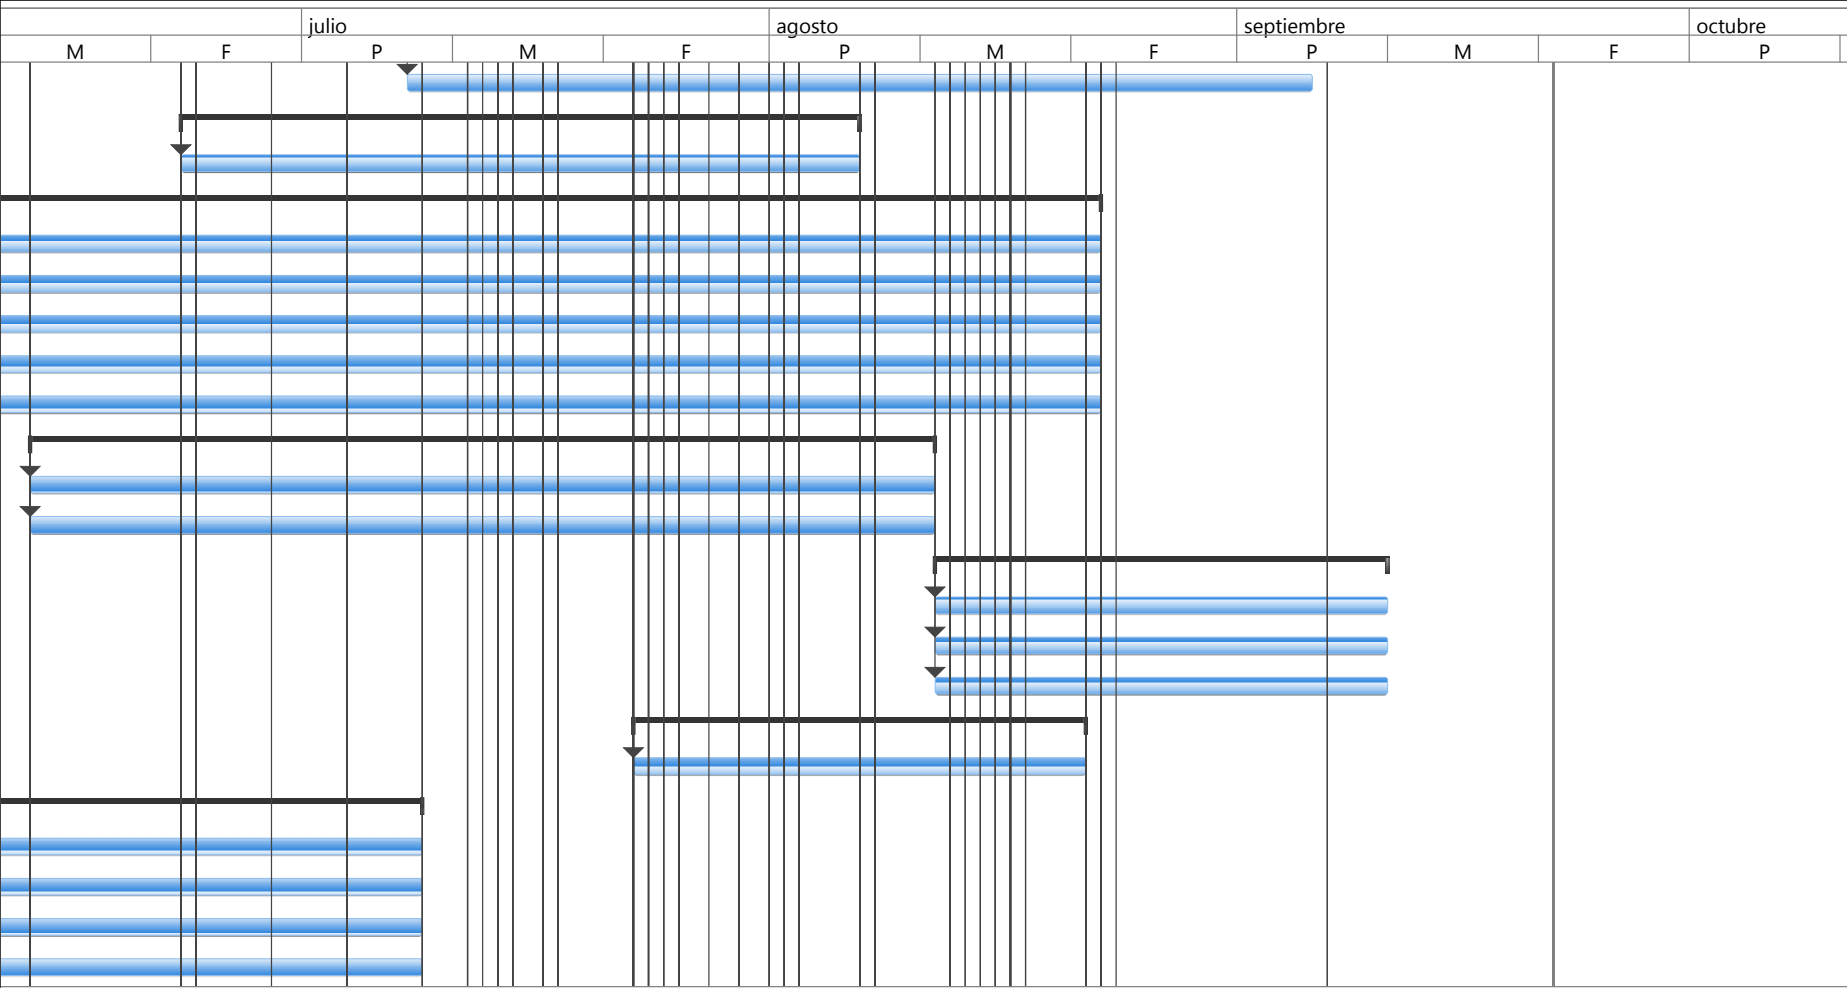



Proyecto: Propuesta Interconec
Fecha: mié 25/05/16

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

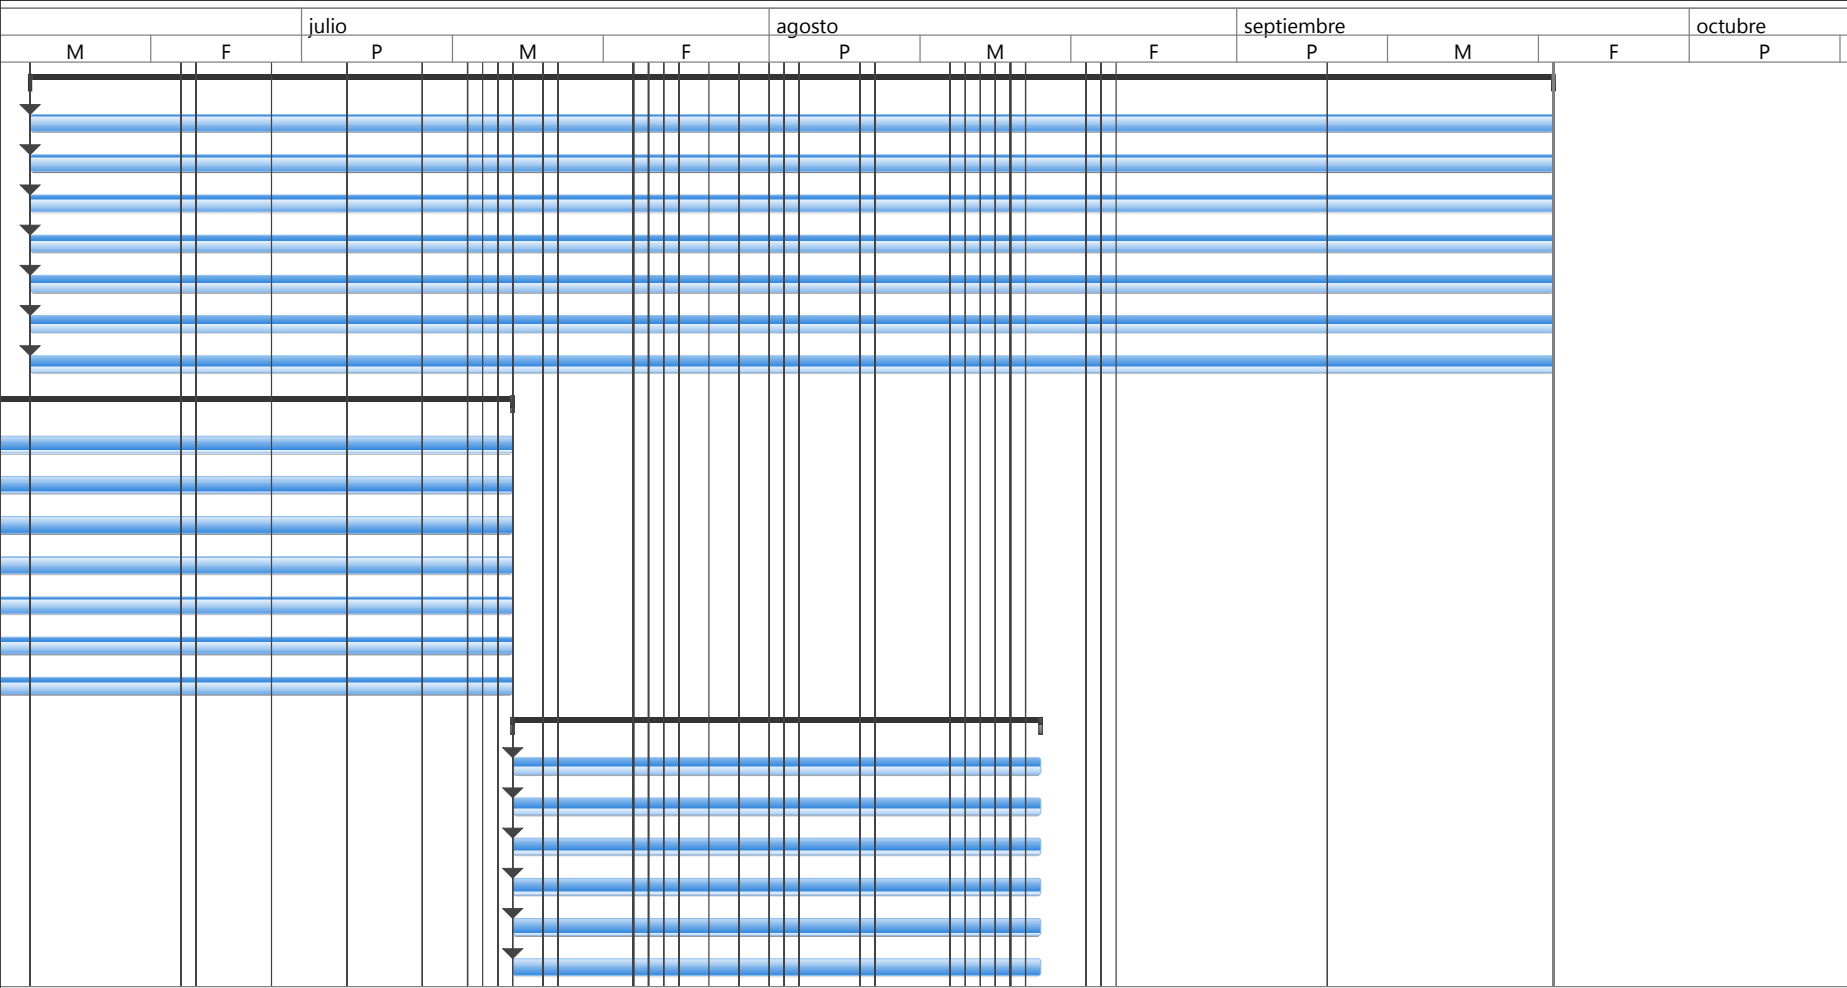


Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

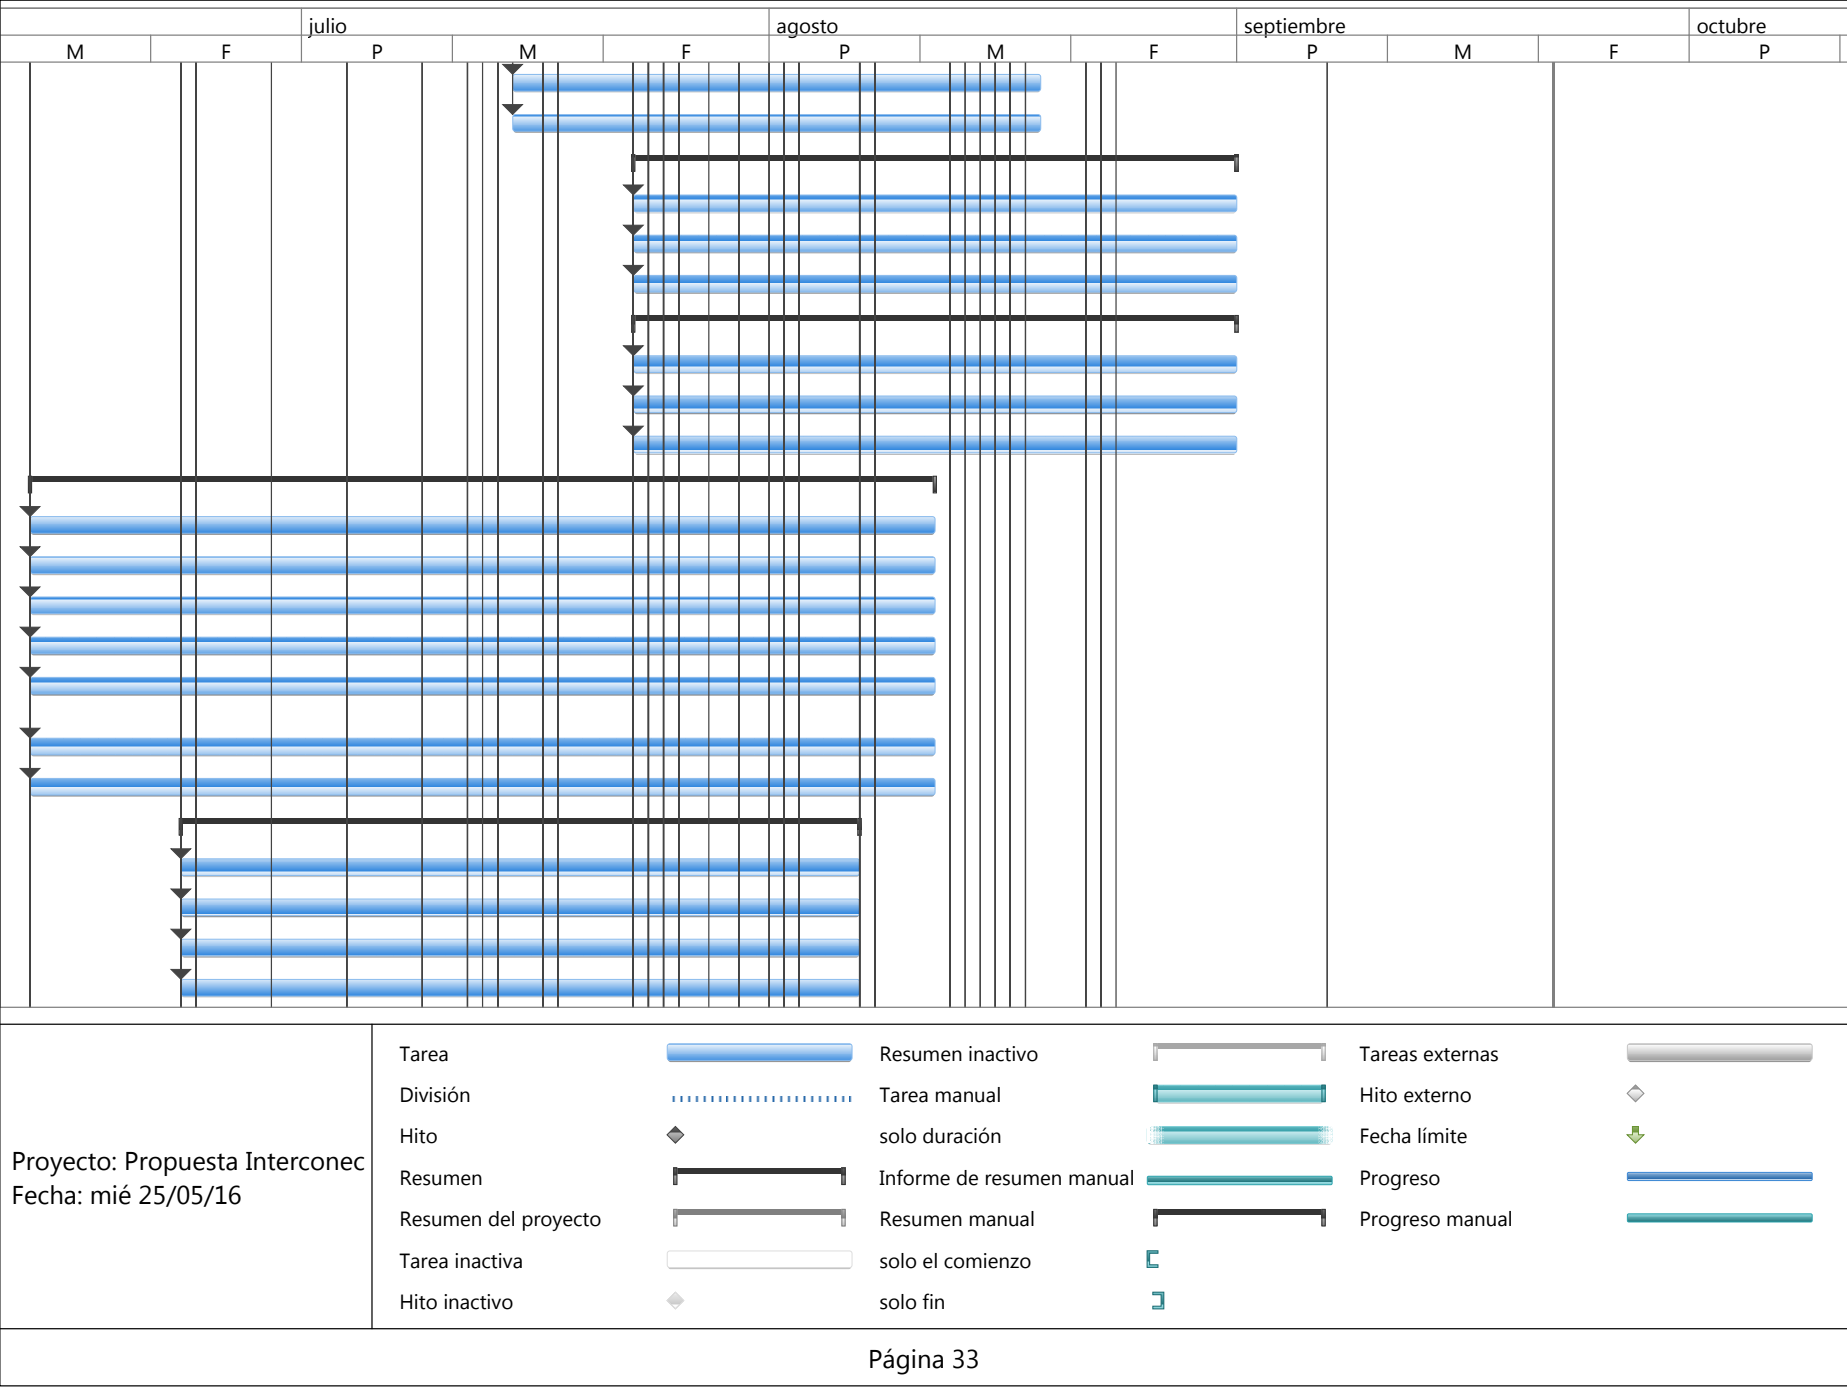

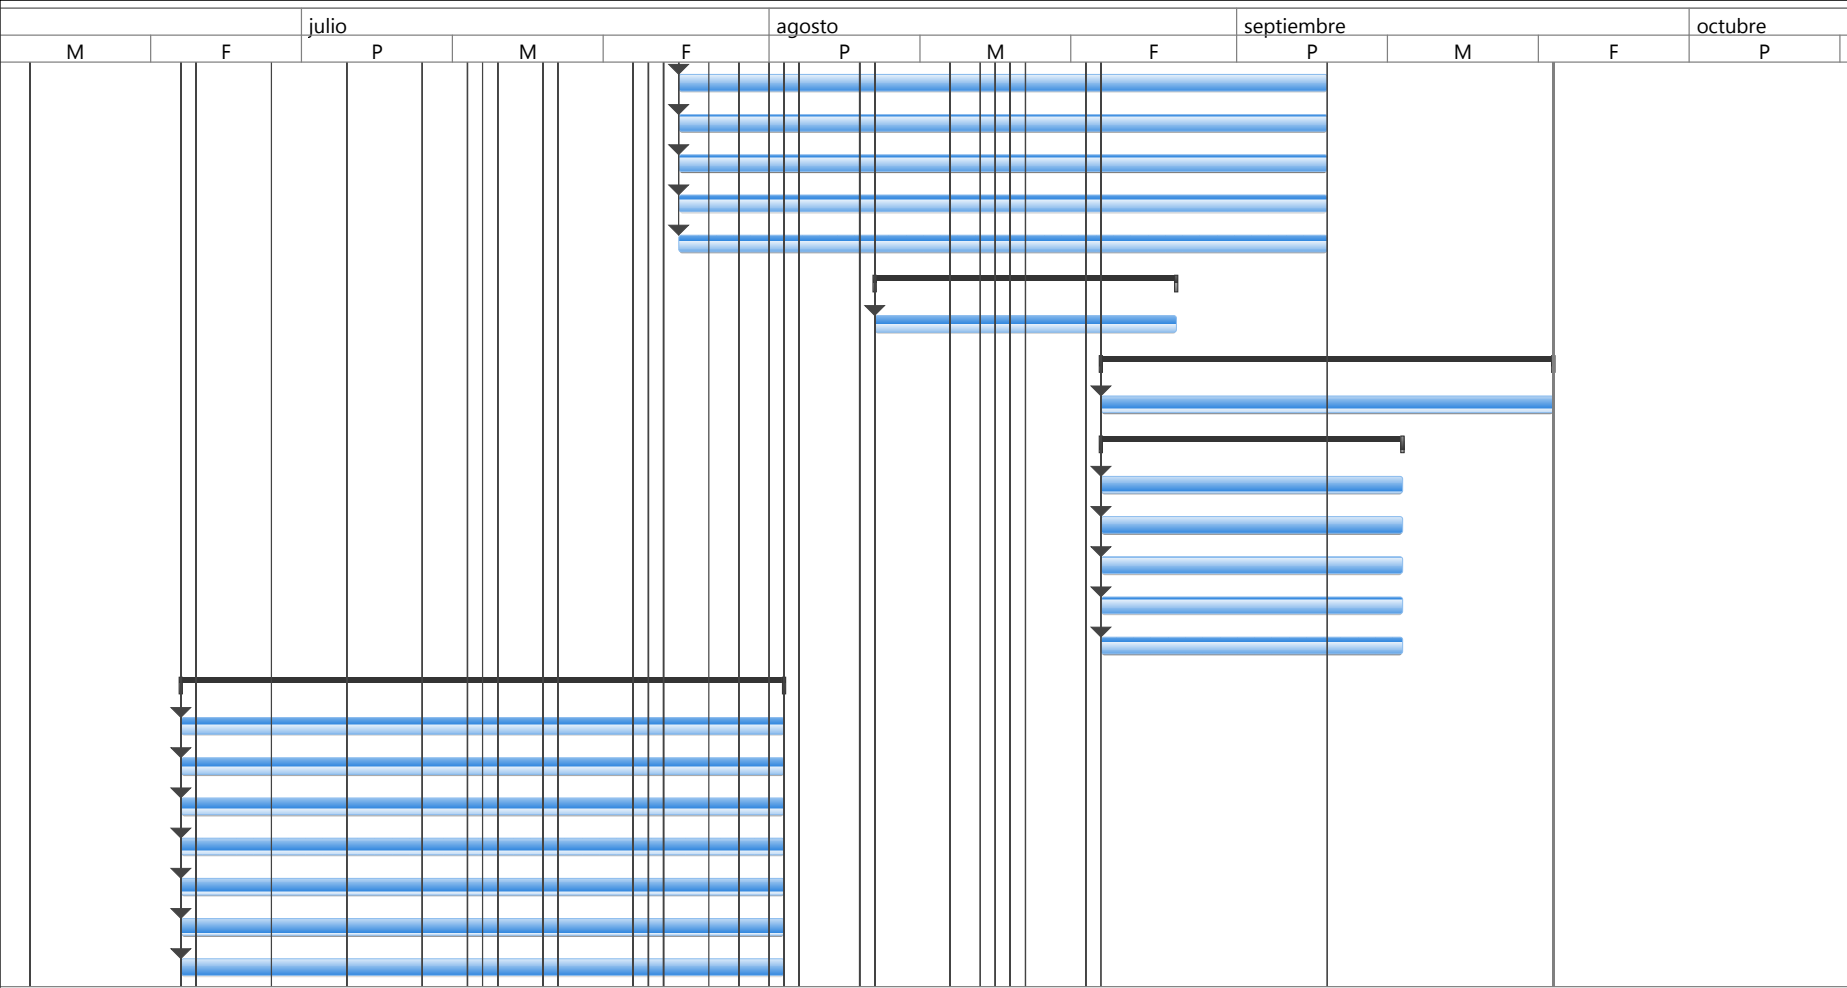


Proyecto: Propuesta Interconec
Fecha: mié 25/05/16


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

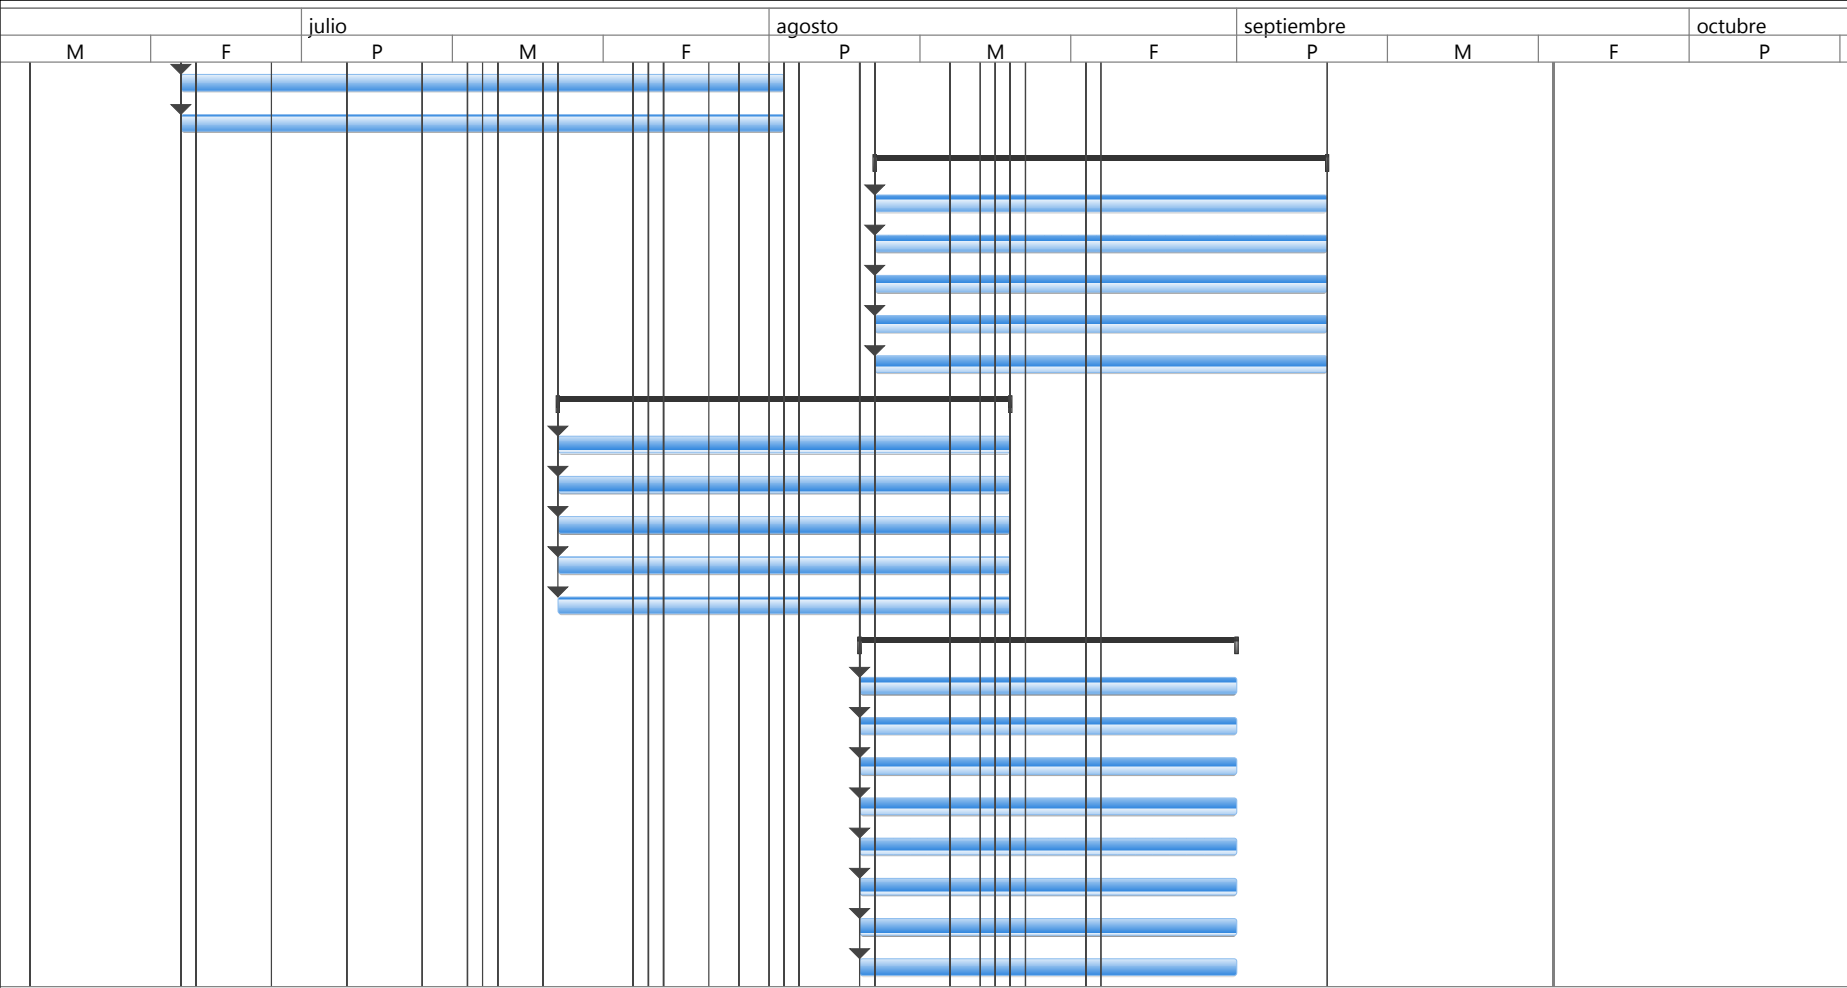

Proyecto: Propuesta Interconec
Fecha: mié 25/05/16


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

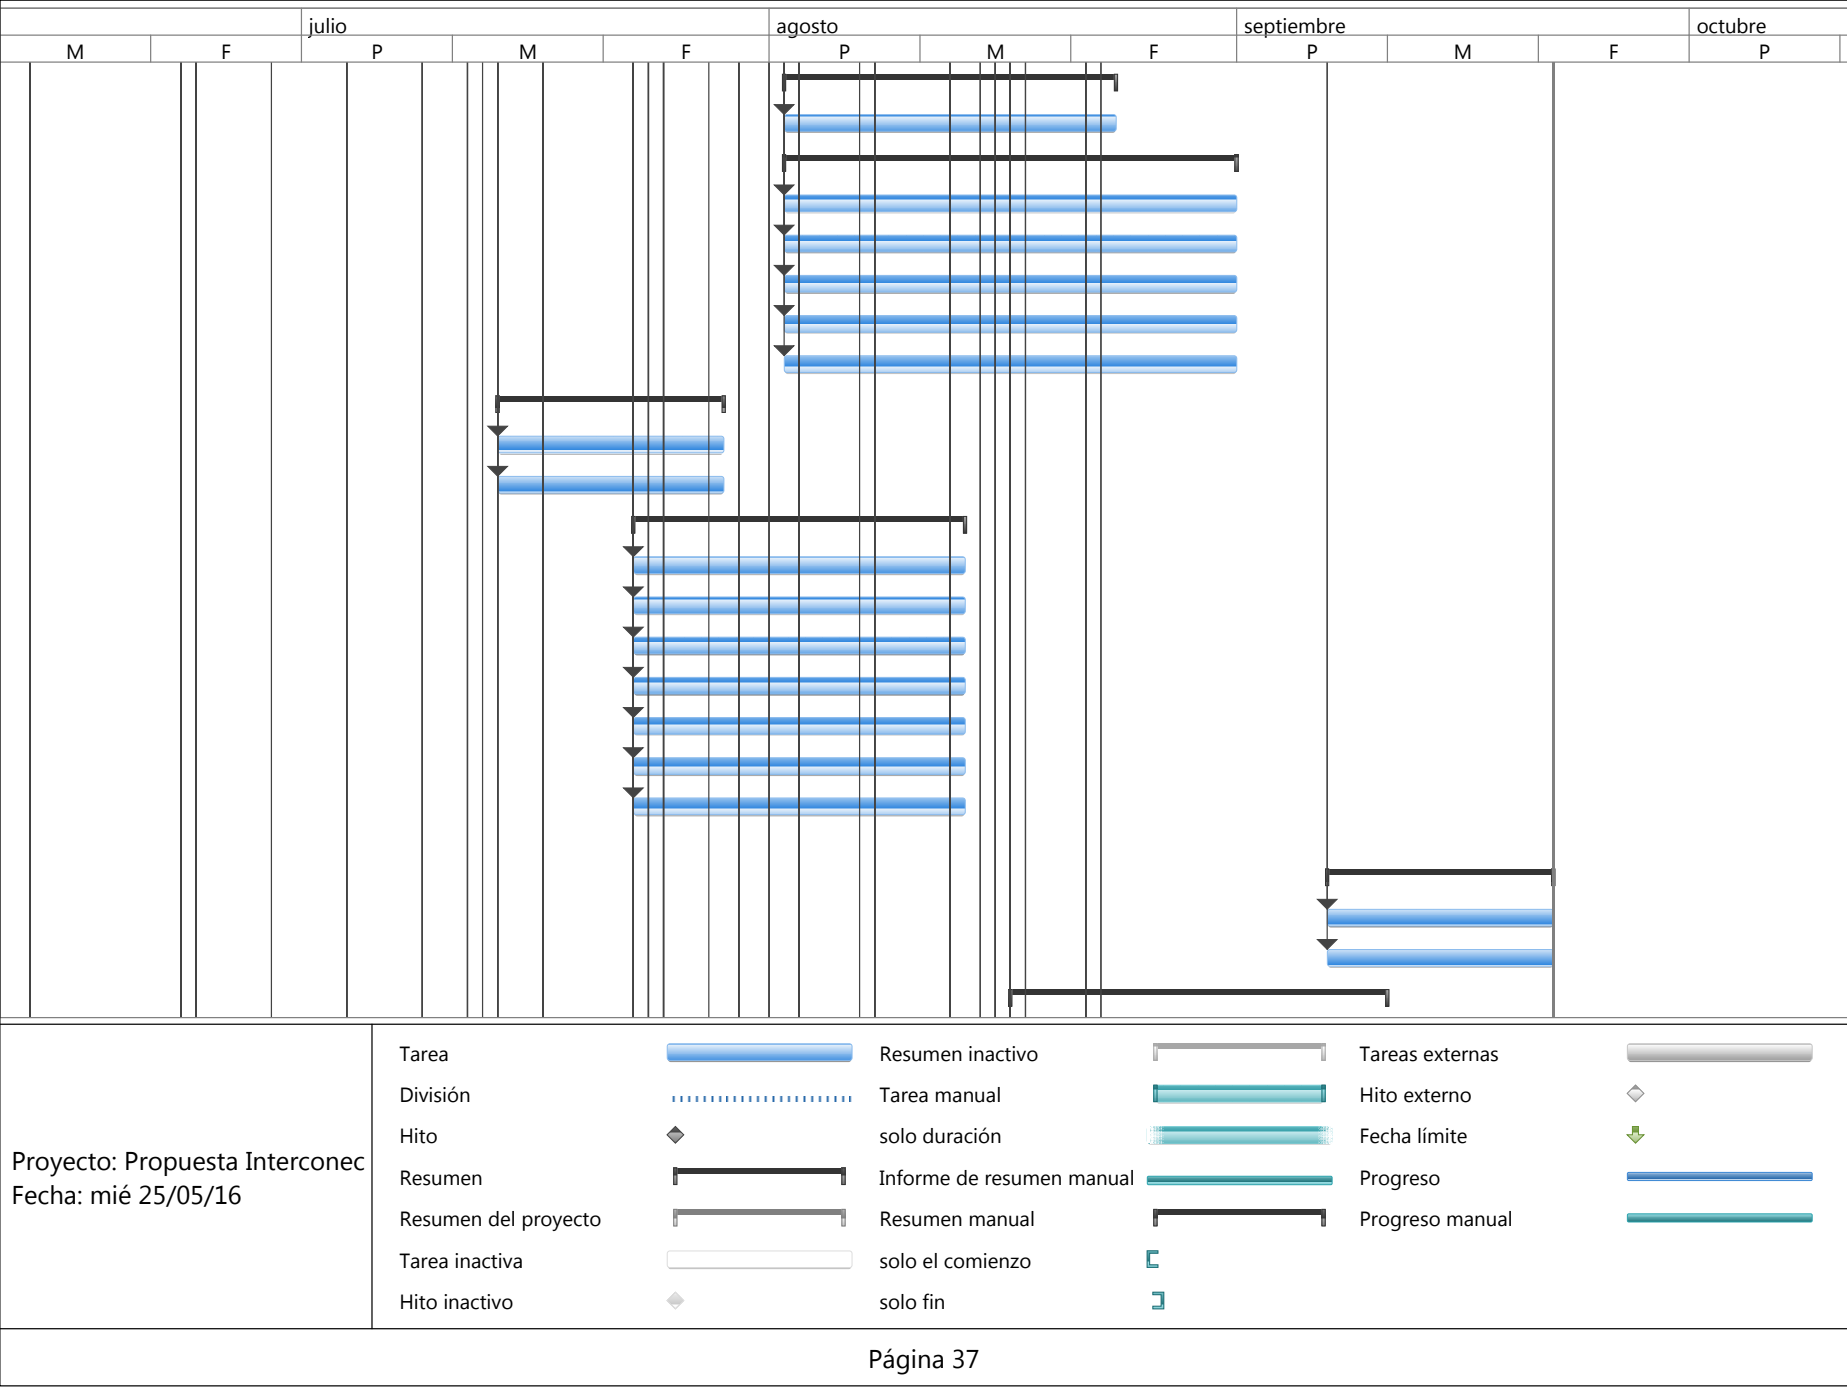

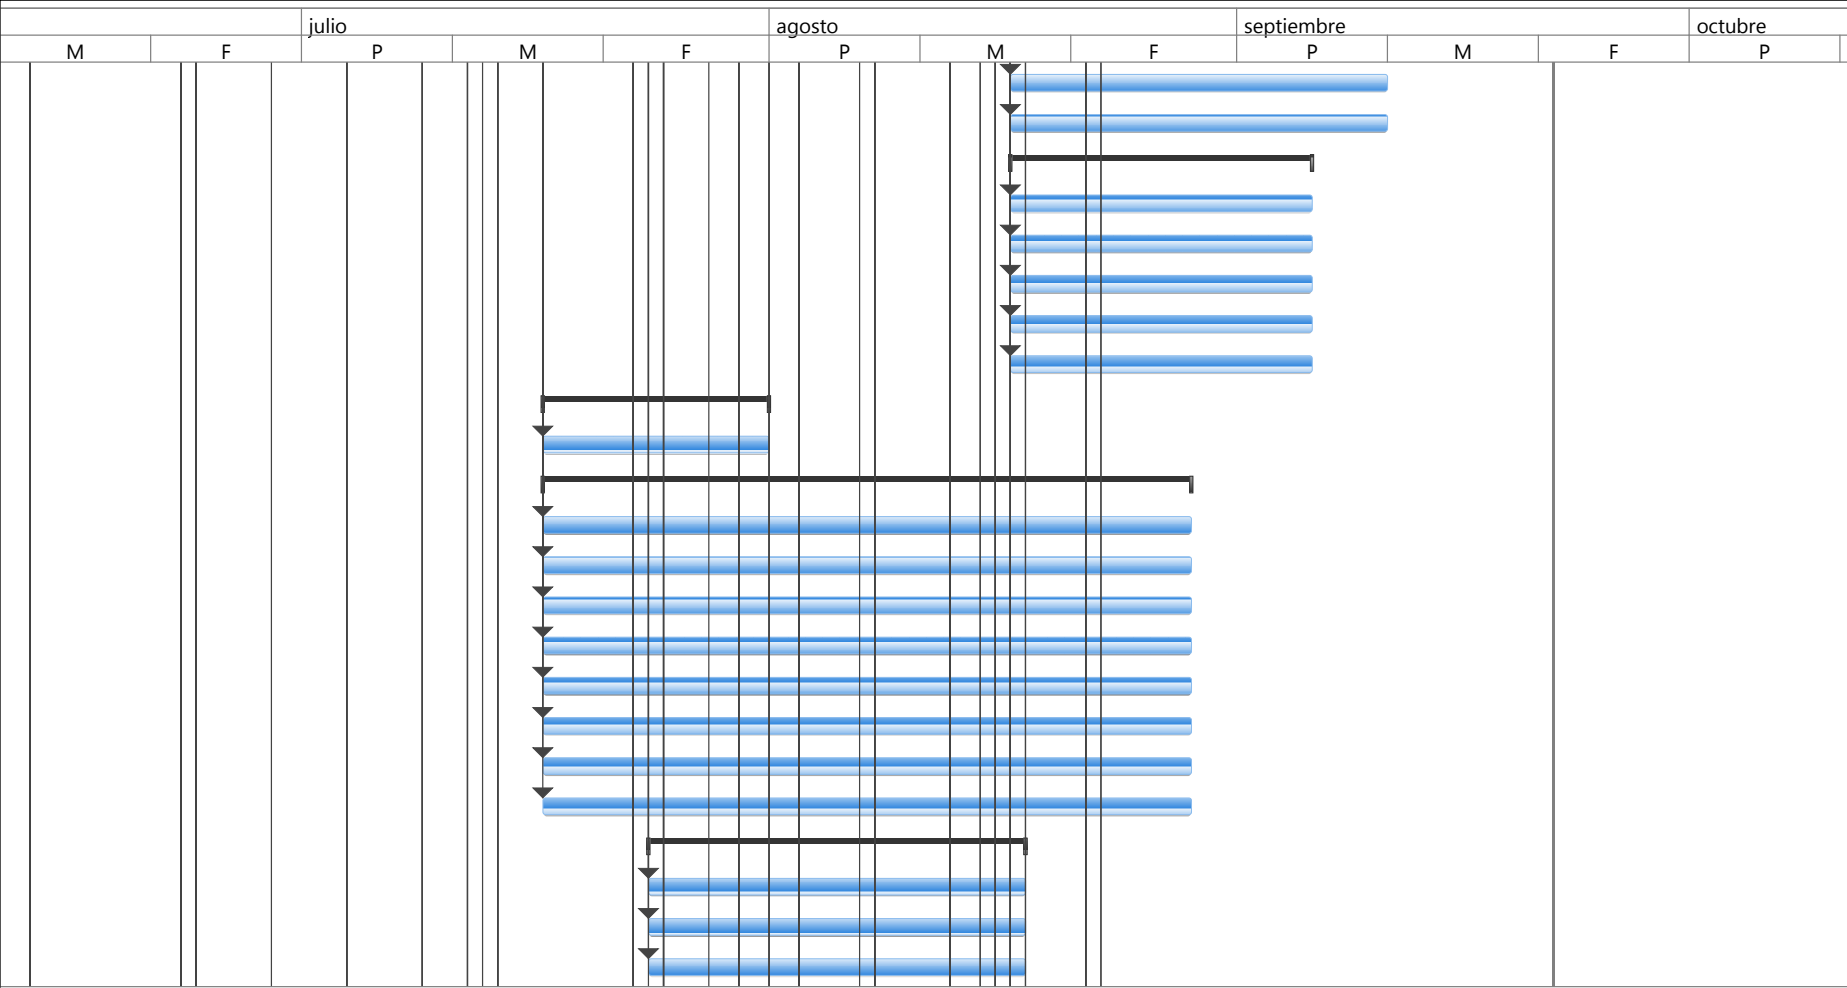


Proyecto: Propuesta Interconec
Fecha: mié 25/05/16


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

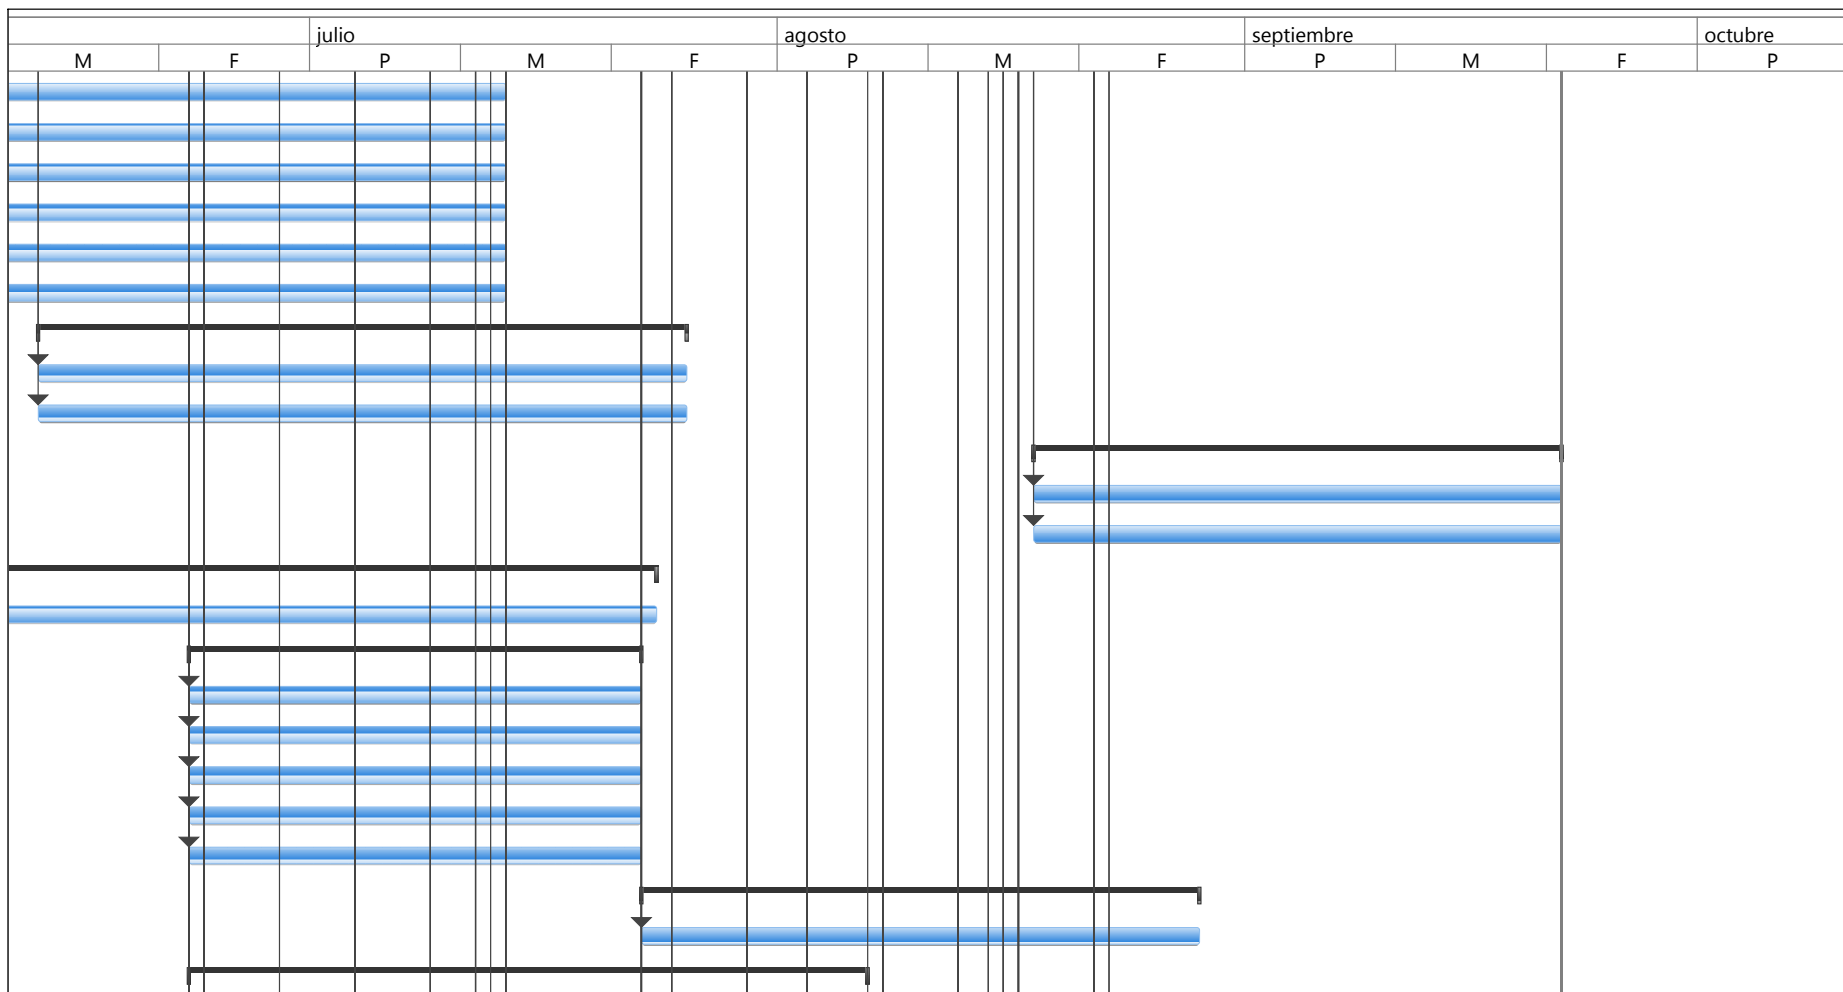


Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

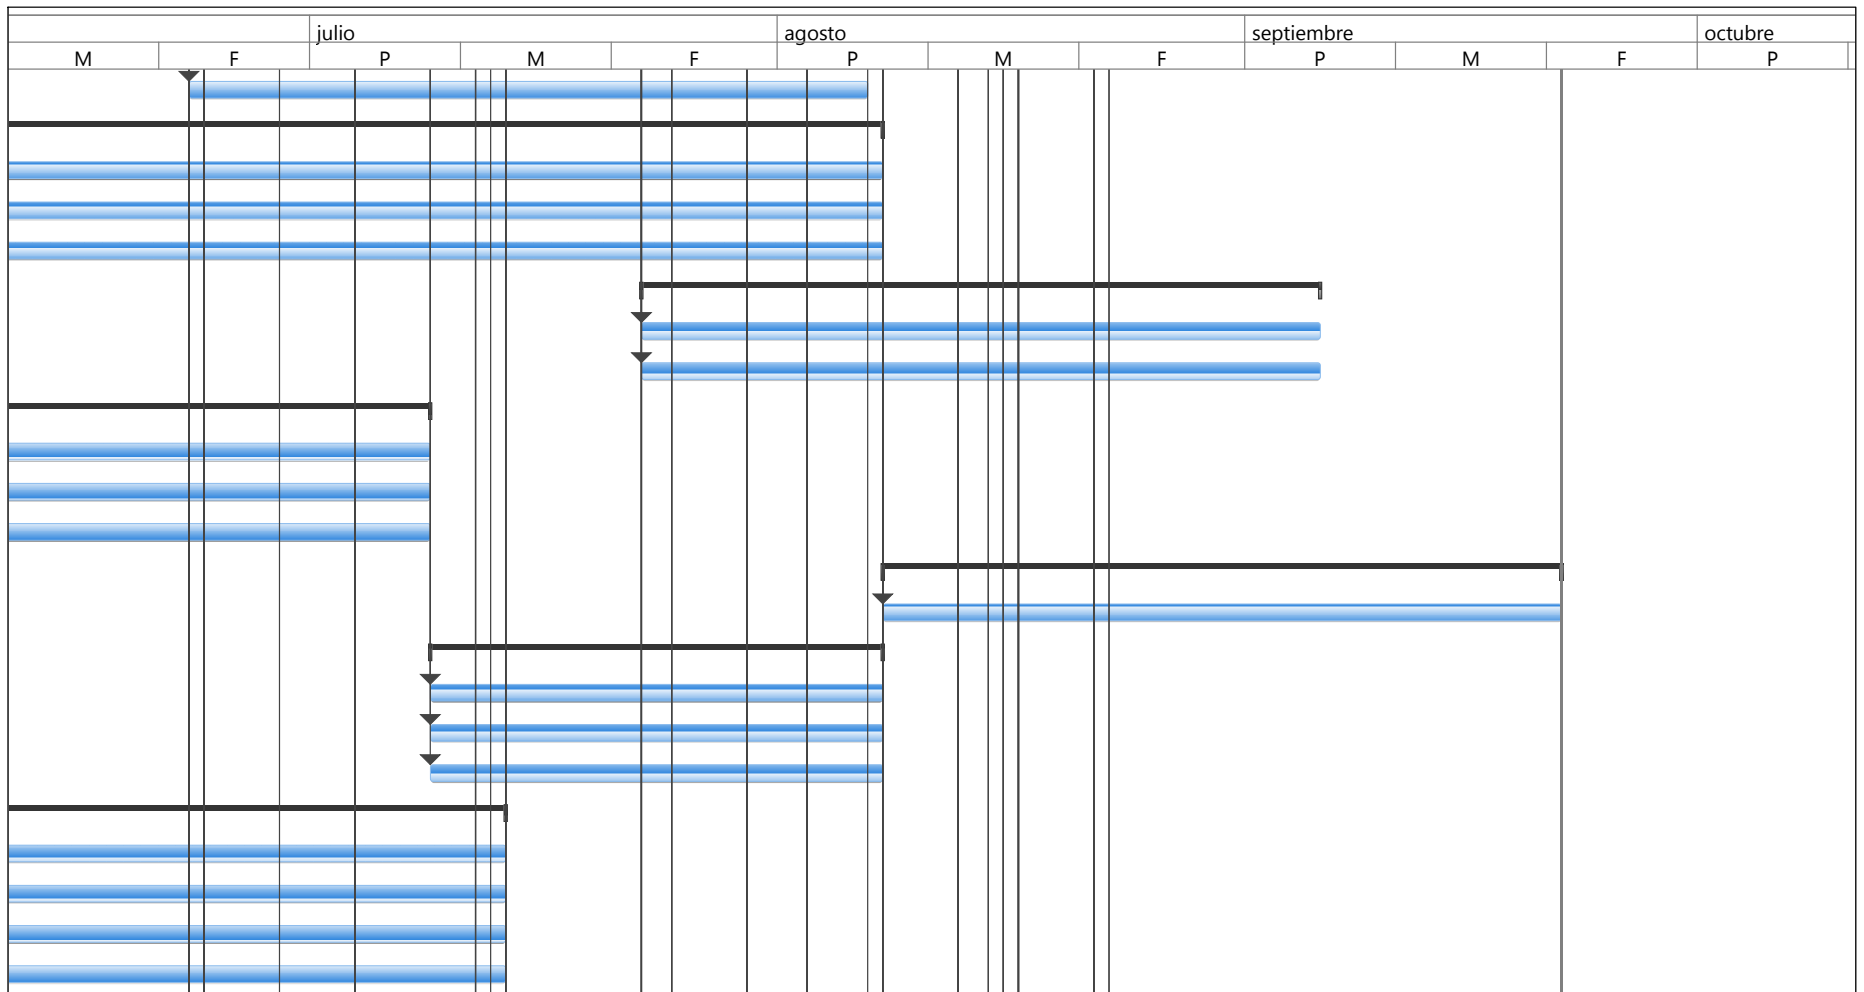


Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

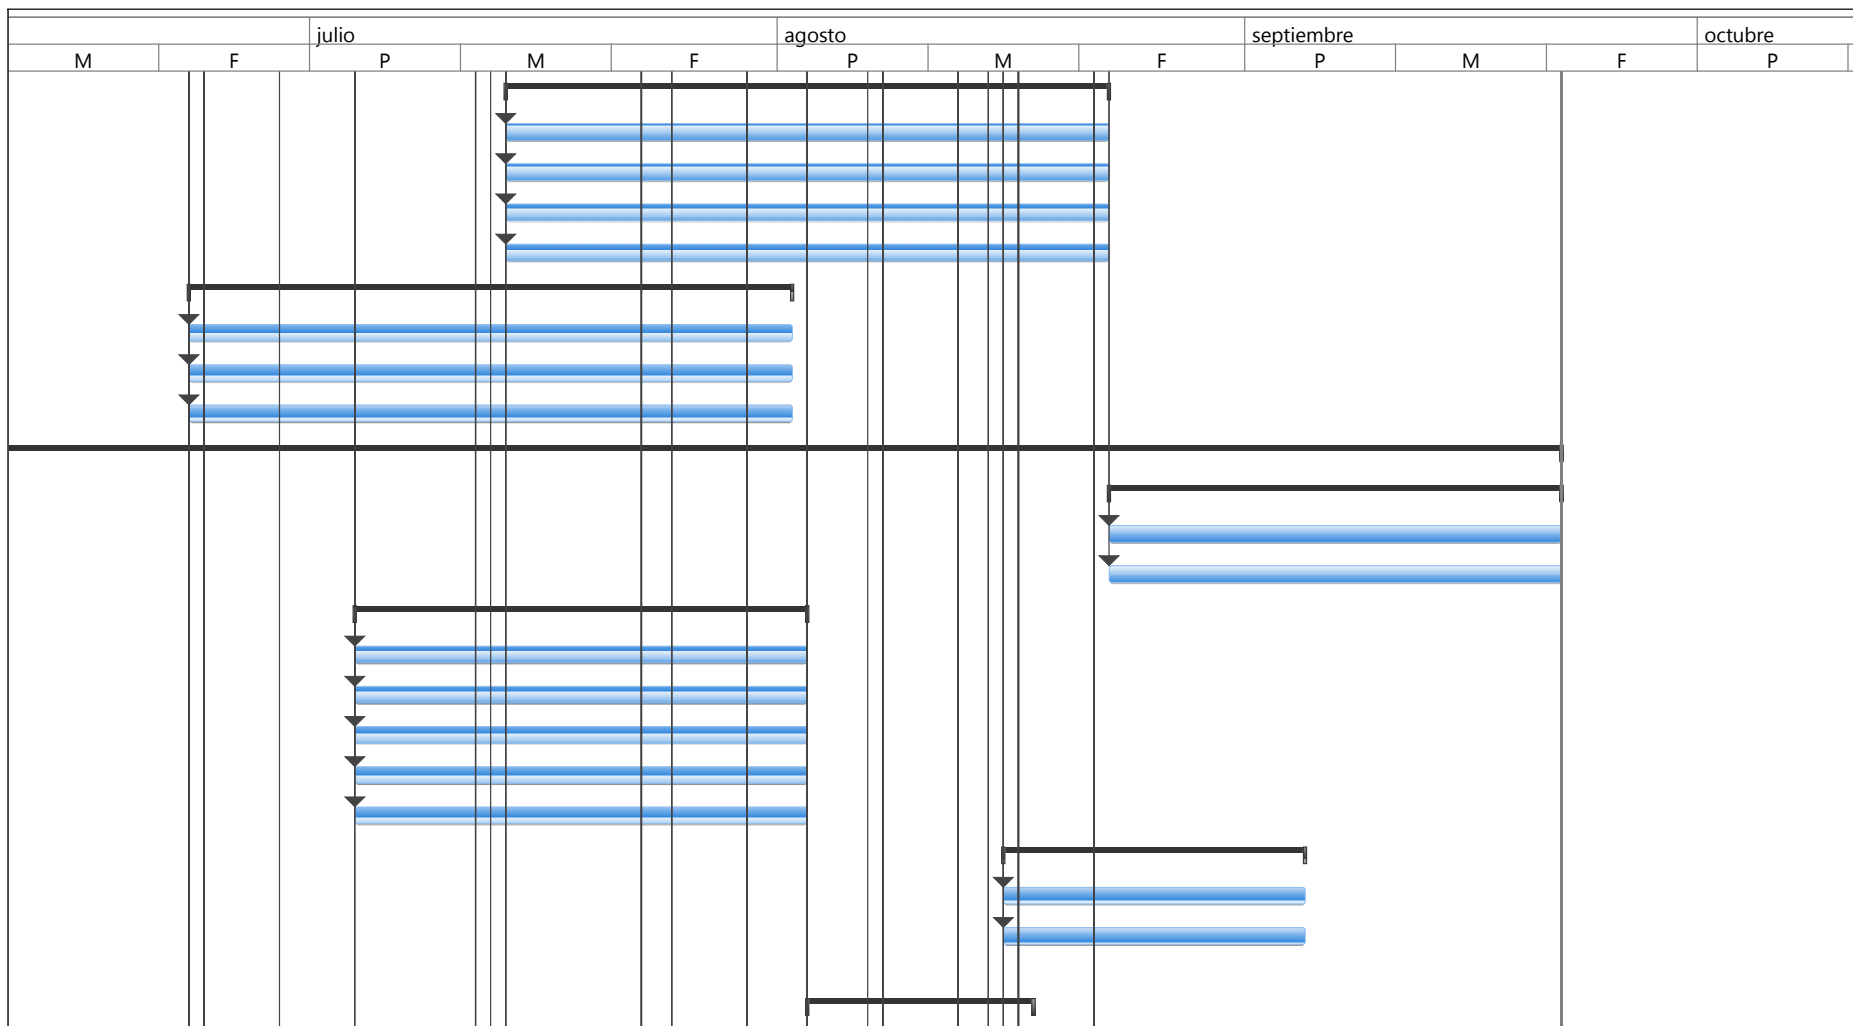


Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

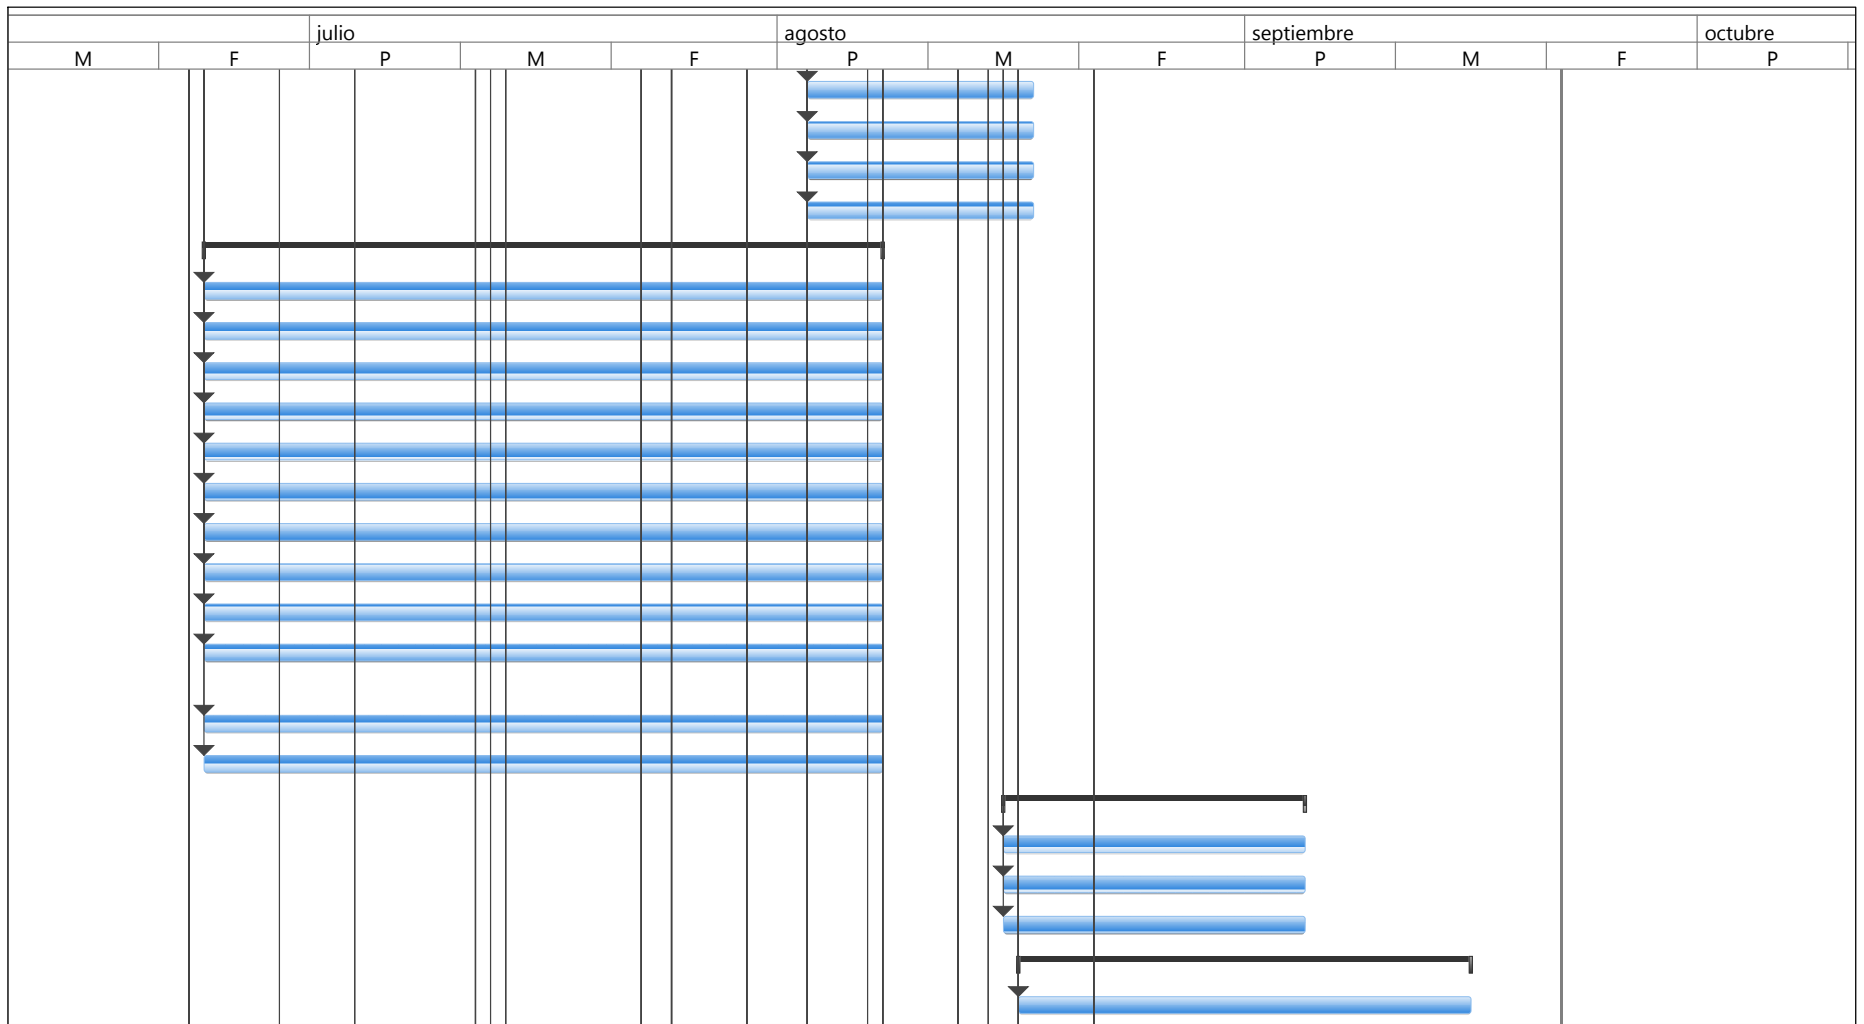


Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

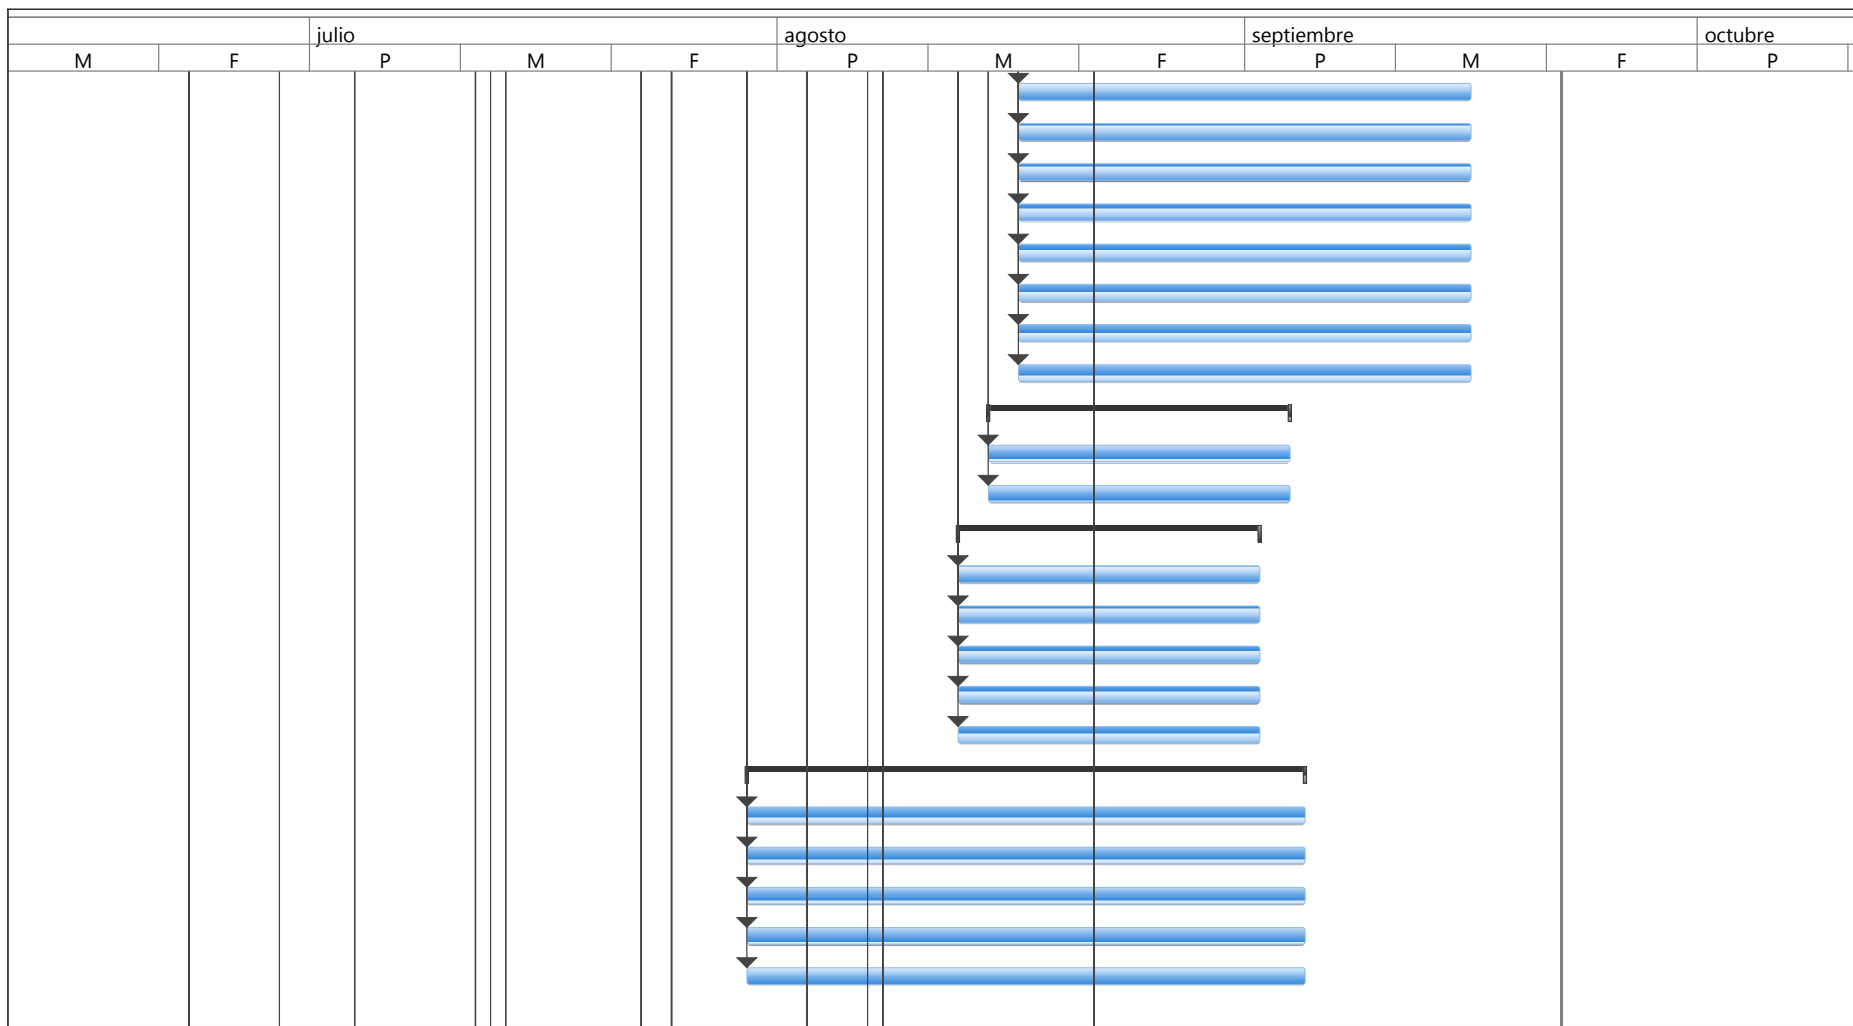

Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

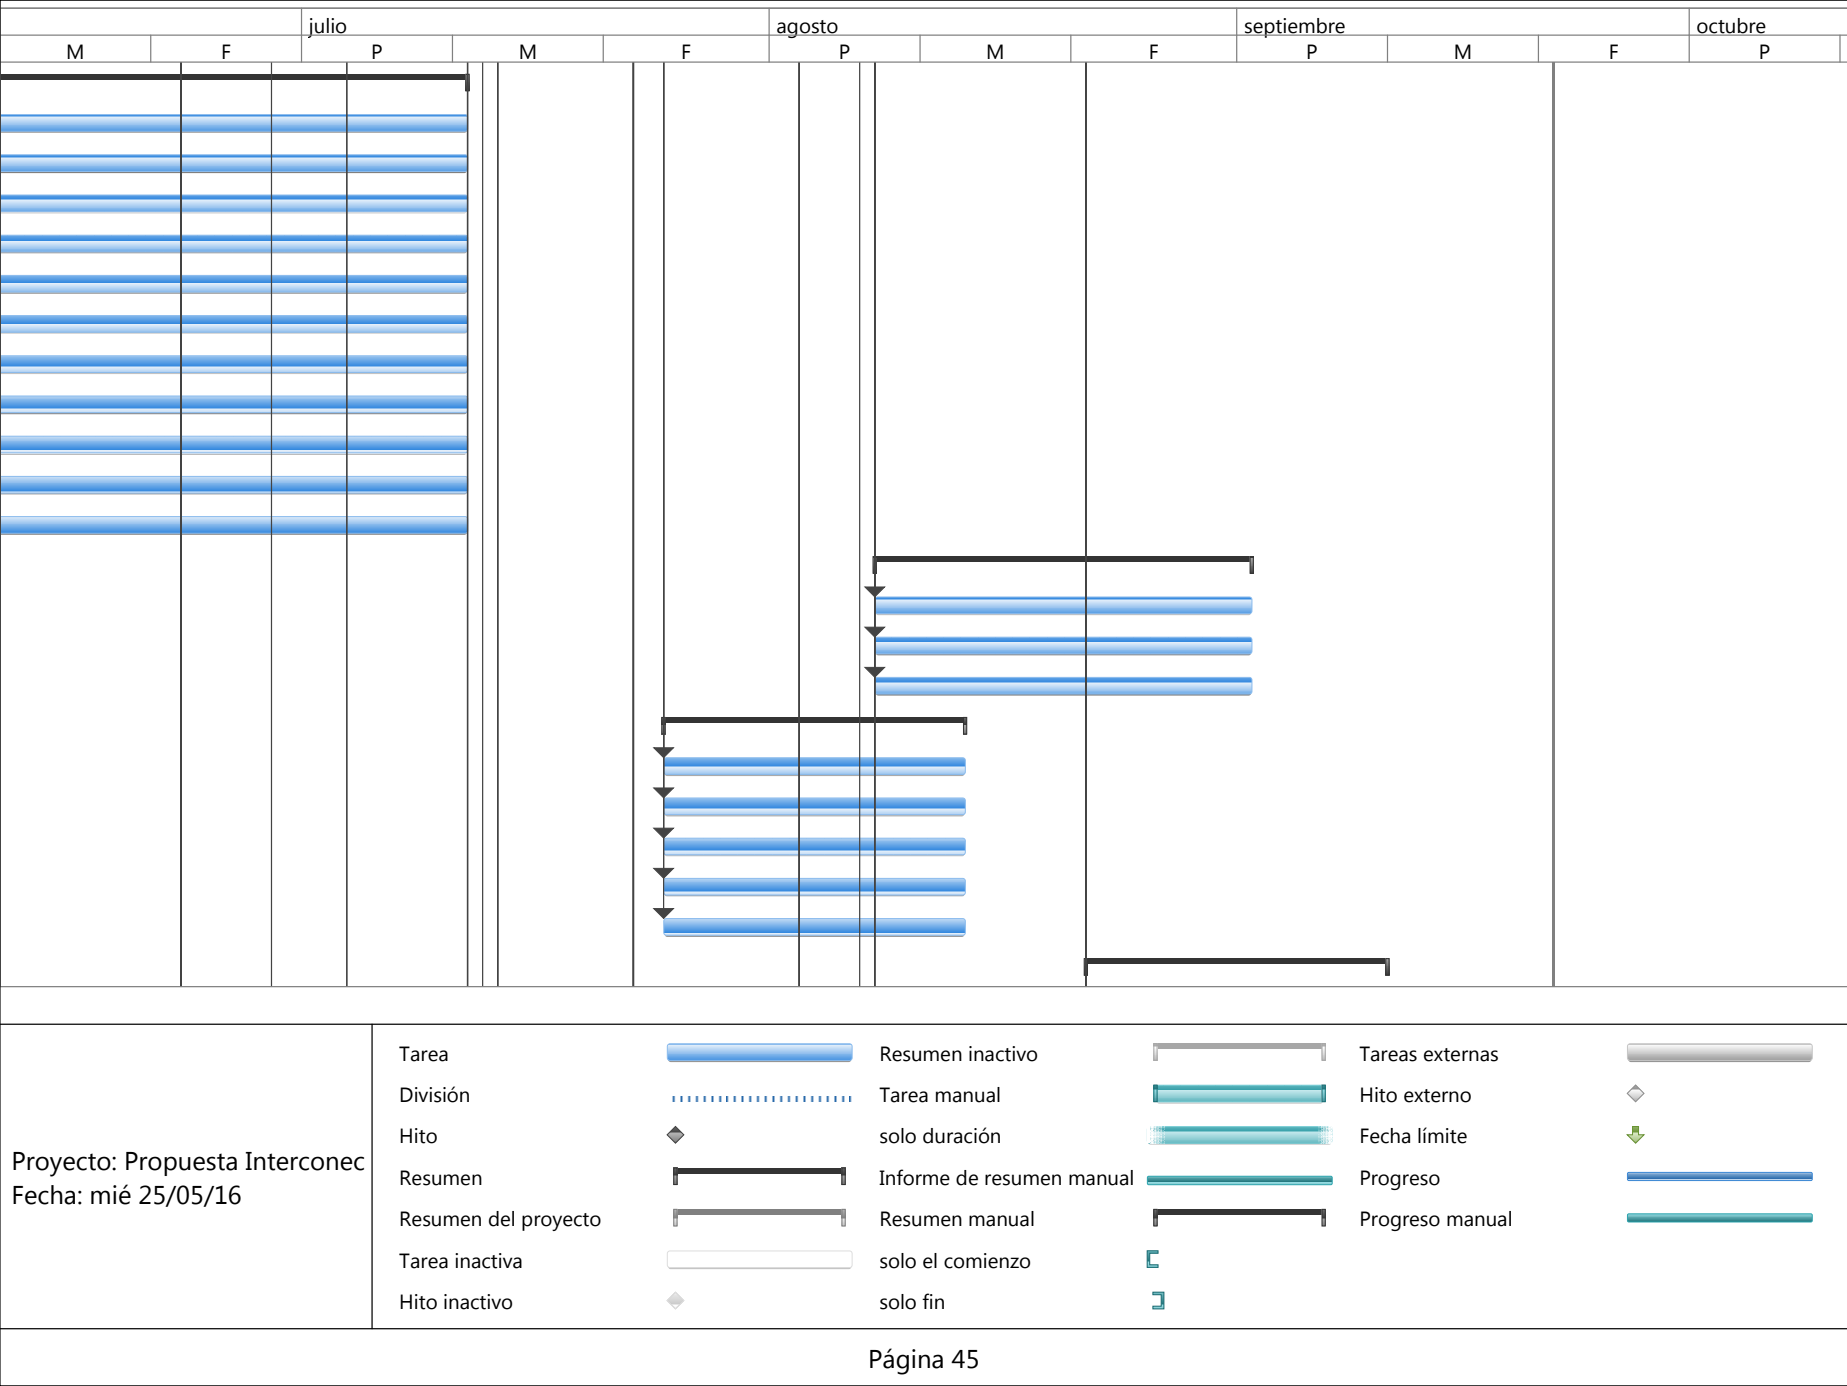

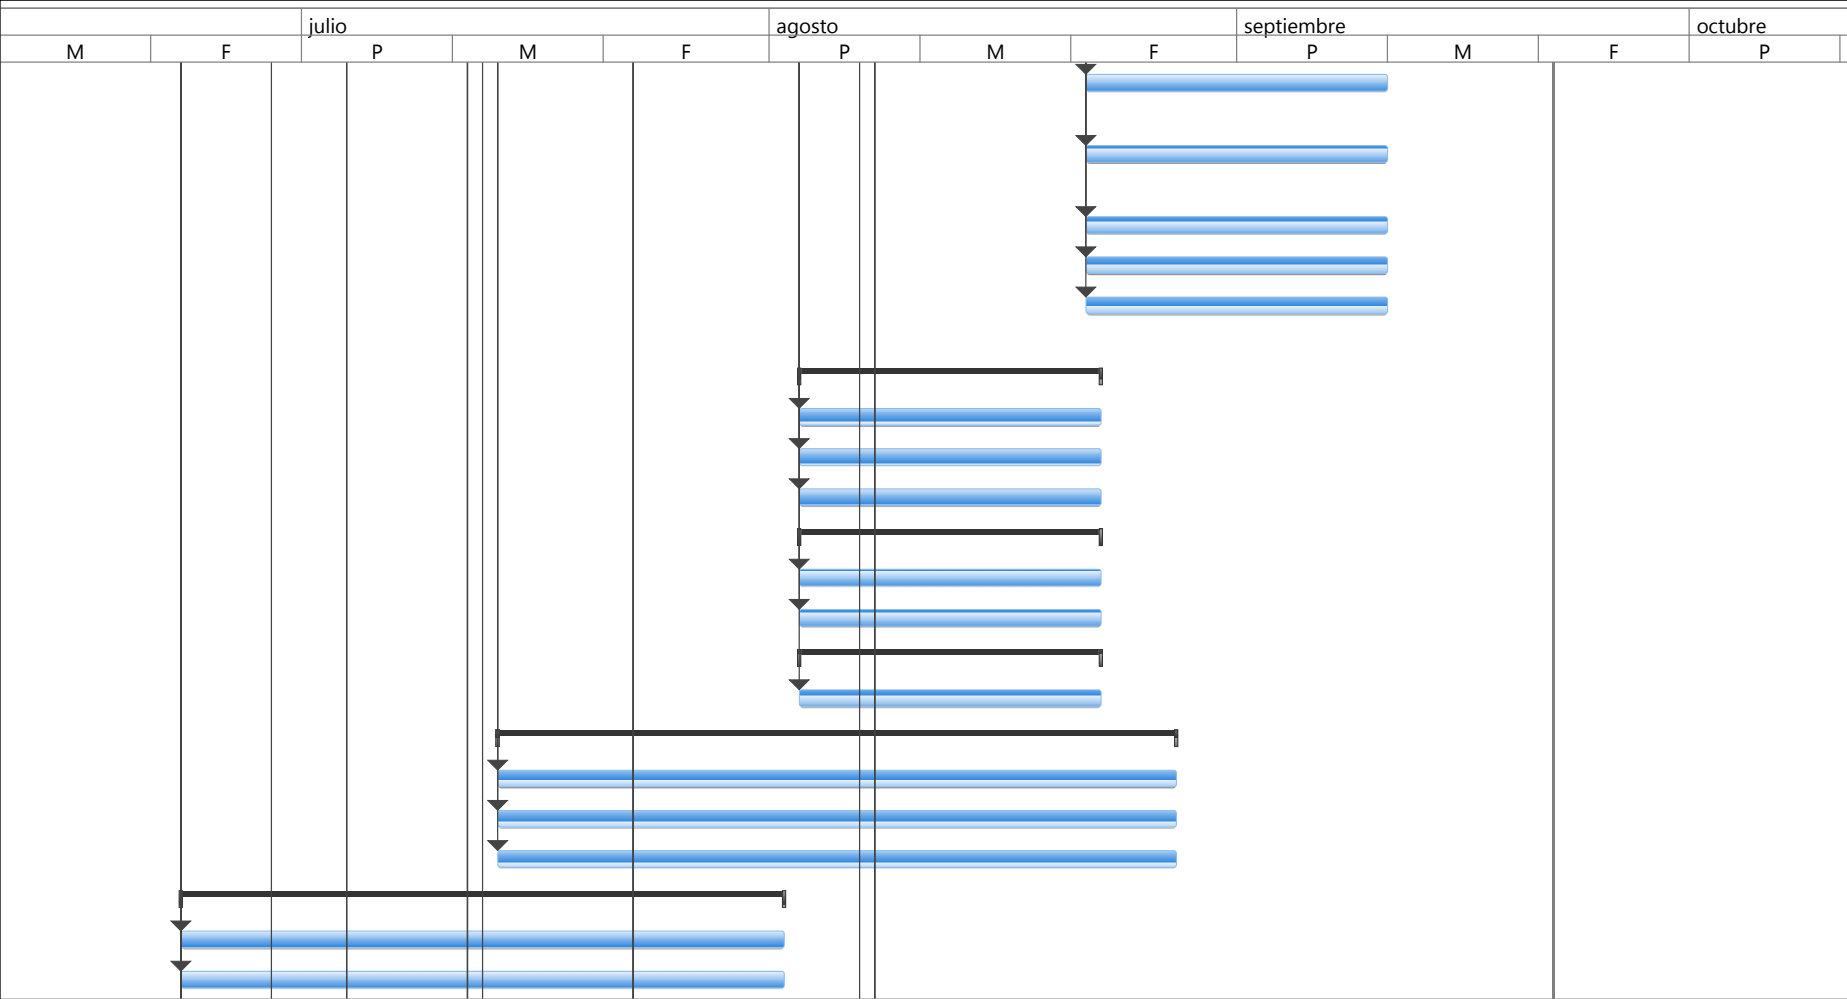

Proyecto: Propuesta Interconec Fecha: mié 25/05/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

