

PT SAT APS-03_v5						
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	X J
0	Proyecto1	939 días?	mié 01/06/16	lun 16/12/19		
1	PT - Servicios APS-3 SAT	939 días?	mié 01/06/16	lun 16/12/19		
2	INICIO	6 días?	mié 01/06/16	mié 08/06/16		
3	Id-00 Informar Fallo de la licitación APS-3 (APROXIMADO)	1 día?	mié 01/06/16	mié 01/06/16	SAT	
4	Firma del Contrato (Aproximado)	5 días	jue 02/06/16	mié 08/06/16	Representante Legal,SAT	
5	Solicitud de Fabricación de Puestos de Servicio	2 días	jue 02/06/16	vie 03/06/16	Fabricante	
6	PLANIFICACIÓN	57 días?	mié 01/06/16	lun 15/08/16		
7	Presentación del grupo administrador del proyecto de implementación	2 días	mié 01/06/16	jue 02/06/16		
8	Notificación del Fallo del Servicio APS-3 al personal involucrado	1 día	mié 01/06/16	mié 01/06/16	SAT	
9	Preparación del personal convocado en punto de reunión	0.2 días	jue 02/06/16	jue 02/06/16	Líder de Proyecto	
10	Id-01 El licitante adjudicado presentará al líder de los servicios APS-3, considerando hasta el nivel 3 conforme al grupo administrador del proyecto de implementación, al administrador del contrato en el inmueble "El Reloj" mencionado en el apéndice 1	1 día	jue 02/06/16	jue 02/06/16	Líder de Proyecto,Administrador del Contrato	
11	Acordar y Confirmar Actividades Previas de las Mesas de Planeación	1 día?	jue 02/06/16	jue 02/06/16		
12	Preparativos de las mesas de planeación y programación	1 día?	jue 02/06/16	jue 02/06/16	Líder de Proyecto,Administrador del Contrato	
13	Explicación a MAINBIT de temas prioritarios	1 día?	jue 02/06/16	jue 02/06/16	Administrador del Contrato	
14	Id-02 Confirmar y acordar las actividades previas a mesas de planeación a) Preparativos de las mesas de planeación y programación b) Explicar al licitante adjudicado los temas prioritarios que debe tener claro y preciso.	1 día	jue 02/06/16	jue 02/06/16	Administrador del Contrato,Líder de Proyecto	
15	Levantamiento de Acta de Acuerdos Previos	1 día?	jue 02/06/16	jue 02/06/16	Administrador del Contrato,Líder de Proyecto	
16	Firma de Acta de Acuerdos Previos por involucrados	1 día?	jue 02/06/16	jue 02/06/16	Administrador del Contrato,Líder de Proyecto	
17	Conexión a Terceros	56 días?	jue 02/06/16	lun 15/08/16		
18	Id-03 Implementar la gestión de conexión a terceros.	56 días?	jue 02/06/16	lun 15/08/16	Líder de Proyecto,Especialista en Conexion a Terceros	
19	Apegarse a la Normativa de conexión a terceros - Apéndice 9	5 días	jue 02/06/16	mié 08/06/16	Líder de Proyecto,Especialista en Conexion a Terceros	
20	Analizar y validar la Arquitectura de interconexión	7 días	jue 02/06/16	vie 10/06/16	Líder de Proyecto,Especialista en Conexion a Terceros	
21	Construcción de Enlace de las Instalaciones de Mainbit hacia el Centro de Datos del SAT	47 días	lun 13/06/16	vie 12/08/16	Líder de Proyecto,Especialista en Conexion a Terceros	
22	Pruebas de Interconexión a Terceros	1 día	lun 15/08/16	lun 15/08/16	Líder de Proyecto,Especialista en Conexion a Terceros	
23	Implementación herramienta de gestión de activos y administración remota	20 días	lun 06/06/16	vie 01/07/16		
24	Id-04 Implementar en inmuebles del SAT los servidores de la herramienta de la gestión de activos del licitante adjudicado y herramienta de administración remota de activos.	20 días	lun 06/06/16	vie 01/07/16	Especialista Herramienta LanDesk,Especialista Herramienta SCAP	
25	Herramienta de Gestión de Activos SCAP	20 días	lun 06/06/16	vie 01/07/16		
26	Instalación de SO y Configuración de Servidor	2 días	lun 06/06/16	mar 07/06/16	Especialista Herramienta SCAP	
27	Instalación de Software	2 días	lun 06/06/16	mar 07/06/16	Especialista Herramienta SCAP	
28	Carga de Base de Datos	10 días	lun 06/06/16	vie 17/06/16	Especialista Herramienta SCAP	
29	Instalación y configuración de aplicativo SCAP	11 días	lun 06/06/16	lun 20/06/16	Especialista Herramienta SCAP	
30	Pruebas de funcionamiento	4 días	mar 21/06/16	vie 24/06/16	Especialista Herramienta SCAP	
31	Traslado de Servidor hacia el Inmueble del SAT	1 día	lun 27/06/16	lun 27/06/16	Especialista Herramienta SCAP	
32	Ingreso de Servidor en Inmueble del SAT	1 día	lun 27/06/16	lun 27/06/16	Especialista Herramienta SCAP	
33	Ingreso de servidor en dominio SAT	1 día	mar 28/06/16	mar 28/06/16	Especialista Herramienta SCAP	
34	Asignación de IP fija en servidor	1 día	mié 29/06/16	mié 29/06/16	Especialista Herramienta SCAP	
35	Revisión de apertura de puertos de comunicación	1 día	mié 29/06/16	mié 29/06/16	Especialista Herramienta SCAP	
36	Pruebas de funcionamiento	2 días	jue 30/06/16	vie 01/07/16	Especialista Herramienta SCAP	
37	Herramienta de Administración Remota Aranda Asset Management	20 días	lun 06/06/16	vie 01/07/16		
38	Instalación de SO y Configuración de Servidor	2 días	lun 06/06/16	mar 07/06/16	Especialista Herramienta LanDesk	
39	Instalación de Software	2 días	lun 06/06/16	mar 07/06/16	Especialista Herramienta LanDesk	
40	Carga de Base de Datos	2 días	lun 06/06/16	mar 07/06/16	Especialista Herramienta LanDesk	
41	Instalación y configuración de aplicativo Aranda Asset Management	10 días	lun 06/06/16	vie 17/06/16	Especialista Herramienta LanDesk	



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5						
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	X J
42	Pruebas de funcionamiento	4 días	lun 20/06/16	jue 23/06/16	Especialista Herramienta LanDesk	
43	Traslado de Servidor hacia el Inmueble del SAT	1 día	vie 24/06/16	vie 24/06/16	Especialista Herramienta LanDesk	
44	Ingreso de Servidor en Inmueble del SAT	1 día	vie 24/06/16	vie 24/06/16	Especialista Herramienta LanDesk	
45	Ingreso de servidor en dominio SAT	1 día	lun 27/06/16	lun 27/06/16	Especialista Herramienta LanDesk	
46	Asignación de IP fija en servidor	1 día	lun 27/06/16	lun 27/06/16	Especialista Herramienta LanDesk	
47	Configurar Core Server	1 día	mar 28/06/16	mar 28/06/16		
48	Verificar Pruebas de Aplicaciones	1 día	mar 28/06/16	mar 28/06/16	Especialista Herramienta LanDesk	
49	Configurar Consolas Core y WEB	3 días	mié 29/06/16	vie 01/07/16		
50	Pruebas de Cliente y Consola	1 día	mié 29/06/16	mié 29/06/16	Especialista Herramienta LanDesk	
51	Verificar Datos y Funcionalidad de Cliente en Consola	1 día	jue 30/06/16	jue 30/06/16	Especialista Herramienta LanDesk	
52	Verificar Consola WEB	1 día	jue 30/06/16	jue 30/06/16	Especialista Herramienta LanDesk	
53	Pruebas de Funcionalidad Consola WEB	1 día	vie 01/07/16	vie 01/07/16	Especialista Herramienta LanDesk	
54	Revisión de apertura de puertos de comunicación	1 día	vie 01/07/16	vie 01/07/16	Especialista Herramienta LanDesk	
55	Pruebas de funcionamiento	1 día	vie 01/07/16	vie 01/07/16	Especialista Herramienta LanDesk	
56	Entrega de equipo para generación de imagen base	1 día	mié 08/06/16	mié 08/06/16		
57	Lógica para la entrega de equipos	1 día	mié 08/06/16	mié 08/06/16	Líder de Proyecto	
58	Id-05 Entregar equipos para generar imagen base y pruebas mencionadas en la Sección 3.4.1" Fase de planificación"	1 día	mié 08/06/16	mié 08/06/16	Líder de Proyecto, Representante Legal	
59	Firma de recepción de equipos para la generación de imágenes	1 día	mié 08/06/16	mié 08/06/16	Administrador del Contrato	
60	Mesas de Planeación	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16		
61	Id-06 Realizar las mesas de planeación y programación, entre el SAT, terceros y el licitante adjudicado.	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Administrador del Contrato, Líder de Proyecto	
62	Comunicación de lineamientos del SAT	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16		
63	Programar en conjunto con el SAT el arranque del servicio	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto, Grupo Administrador del Proyecto	
64	Definir alcances, interacción, acciones y aspectos generales del proyecto.	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto, Grupo Administrador del Proyecto	
65	Definir la distribución geográfica de inmuebles y volumetrías.	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto, Grupo Administrador del Proyecto	
66	Definir aspectos para el suministro, instalación, configuración y puesta en operación de los PS.	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto, Grupo Administrador del Proyecto	
67	Definir documentación para la entrega y recepción de equipos.	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto, Grupo Administrador del Proyecto	
68	Definir Plan de Ant y Rec de Fen Nat o Sociales de la G. de Continuidad.	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto, Grupo Administrador del Proyecto	
69	Definición de los elementos para la generación de imagen base y de implementación.	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto, Grupo Administrador del Proyecto	
70	Material didáctico sobre el uso de los PS y accesorios.	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto, Grupo Administrador del Proyecto	
71	Herramienta de Mesa de Servicio CA Services Desk 14.1	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16		
72	Análisis y Evaluación Ambiente Actual	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16		
73	Revisión Procesos	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto, Grupo Administrador del Proyecto	
74	Análisis de procesos existentes	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16		
75	Entrevista involucrados	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto, Grupo Administrador del Proyecto	
76	Elaboración de documentación de acuerdos	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto, Grupo Administrador del Proyecto	
77	Firma de Acuerdos	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16		
78	Herramienta de Administración Remota de Activos Aranda Asset Management 8.0	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16		
79	Análisis y Evaluación Ambiente Actual	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16		
80	Revisión del ambiente actual	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto, Grupo Administrador del Proyecto	
81	Análisis de procesos existentes	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16		
82	Entrevista involucrados	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto, Grupo Administrador del Proyecto	
83	Elaboración de documentación de acuerdos	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto, Grupo Administrador del Proyecto	
84	Firma de Acuerdos	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto, Grupo Administrador del Proyecto	
85	Interconexión de Terceros	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16		



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5						
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	X J
86	Análisis de las condiciones actuales	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto	
87	Evaluación de infraestructura actual	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto	
88	Generación de propuesta de conexión de tercero	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto	
89	Herramienta de administración de inventarios y generación de resguardos (SITE - SCAP)	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16		
90	Preparativos de las mesas de planeación y programación	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto	
91	Explicar al licitante adjudicado los temas prioritarios que debe tener claro y preciso	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto	
92	Administración de Dispositivos Móviles Aranda MDM	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16		
93	Junta de Inicio	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto	
94	Identificar líderes del proyecto y miembros del equipo de trabajo	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto	
95	Implementar Plataforma de PS	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16		
96	Confirmar inmuebles	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto	
97	Verificar enlaces en cada inmueble	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto	
98	Determinar espacio de almacenamiento de equipo en cada inmueble	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto	
99	Verificar condiciones actuales de la red	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto	
100	Realizar documento de Acuerdos	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto	
101	Firma de Acuerdos	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto	
102	Programación en conjunto con el SAT y Tercero involucrados en el servicio	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16		
103	Identificar líderes del proyecto y miembros del equipo de trabajo	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto	
104	Validación de requerimientos de entrega en Datacenter SAT	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto	
105	Validación de requerimientos de entrega inicial sitios definidos por el SAT	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto	
106	Validación de acuerdos con terceros	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto	
107	Elaboración de documentos de acuerdos	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto	
108	Firma de documento y cierre de etapa MDM	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto	
109	Verificar cumplimiento de especificaciones técnicas de los PS	5 días	jue 09/06/16	mié 15/06/16		
110	Id-07 Verificar cumplimiento de especificaciones técnicas de los PS y accesorios propuestos	5 días	jue 09/06/16	mié 15/06/16	Administrador del Contrato,Grupo Dedicado Generación Imág	
111	Montaje de laboratorio en instalaciones del SAT (si aplica)	2 días	jue 09/06/16	vie 10/06/16	Administrador del Contrato,Grupo Dedicado Generación Imág	
112	Revisión física y lógica	4 días	jue 09/06/16	mar 14/06/16	Administrador del Contrato,Grupo Dedicado Generación Imág	
113	Validación de especificaciones técnicas	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16	Administrador del Contrato,Grupo Dedicado Generación Imág	
114	Construcción de Imágenes de PS	5 días	jue 09/06/16	mié 15/06/16		
115	Id-08 Construir Imágenes Base de los Perfiles de PS	5 días	jue 09/06/16	mié 15/06/16	Administrador del Contrato,Grupo Dedicado Generación Imág	
116	Habilitar Mesa de Servicio Temporal	7 días	mié 15/06/16	jue 23/06/16		
117	Id-09 Habilitar la mesa de servicio temporal	7 días	mié 15/06/16	jue 23/06/16	Administrador del Contrato,Coordinador Help Desk Manager	
118	Acceso a Herramienta de la MS SAT	7 días	mié 15/06/16	jue 23/06/16		
119	Conexión con Mesa de Servicio del SAT desde las Instalaciones de Mainbit	2 días	mié 15/06/16	jue 16/06/16	Coordinador Help Desk Manager	
120	Configuración de los procesos de gestión del servicio para el servicio APS-3	2 días	mié 15/06/16	jue 16/06/16	Coordinador Help Desk Manager	
121	Procesos	3 días	mié 15/06/16	vie 17/06/16		
122	Establecimiento de procesos requeridos para el APS-3	3 días	mié 15/06/16	vie 17/06/16	Coordinador Help Desk Manager	
123	Verificación de procesos	3 días	mié 15/06/16	vie 17/06/16	Coordinador Help Desk Manager	
124	Pruebas	7 días	mié 15/06/16	jue 23/06/16		
125	Pruebas creación de tickets	7 días	mié 15/06/16	jue 23/06/16	Coordinador Help Desk Manager	
126	Pruebas modificación tickets	7 días	mié 15/06/16	jue 23/06/16	Coordinador Help Desk Manager	
127	Pruebas adjuntar documentos	7 días	mié 15/06/16	jue 23/06/16	Coordinador Help Desk Manager	
128	Pruebas bitacora	7 días	mié 15/06/16	jue 23/06/16	Coordinador Help Desk Manager	
129	Pruebas cambios de estatus	7 días	mié 15/06/16	jue 23/06/16	Coordinador Help Desk Manager	
130	Documentación	7 días	mié 15/06/16	jue 23/06/16	Coordinador Help Desk Manager	



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5						
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	X J
131	Firma de documentación	7 días	mié 15/06/16	jun 23/06/16	Administrador del Contrato,Líder de Proyecto	
132	Entrega de matriz de implementación	1 día	mié 15/06/16	mié 15/06/16		
133	Id-10 Entregar matriz de implementación	1 día	mié 15/06/16	mié 15/06/16	Administrador del Contrato,Líder de Proyecto	
134	Entrega de la versión complemento del Plan de Trabajo Detallado	1 día	mié 15/06/16	mié 15/06/16		
135	Id-11 Entregar la versión complemento al programa de trabajo general resultado de actividades de las mesas de PyP	1 día	mié 15/06/16	mié 15/06/16	Líder de Proyecto	
136	Análisis y Revisión de Actividades Complementarias del Plan de Trabajo	4 días	jue 16/06/16	mar 21/06/16		
137	Id-12 Analizar y revisar las actividades complementarias establecidas de manera adicional en el programa de trabajo general detallado entregado durante mesas de planeación.	4 días	jue 16/06/16	mar 21/06/16	Administrador del Contrato	
138	Entrega de Imágenes Base para los Perfiles PS	0.5 días	jue 16/06/16	jue 16/06/16		
139	Id-13 Entregar imágenes base de los perfiles de PS	0.5 días	jue 16/06/16	jue 16/06/16	Grupo Dedicado Generación Imágenes	
140	Firma de la Documentación	0.5 días	jue 16/06/16	jue 16/06/16	Administrador del Contrato,Líder de Proyecto	
141	Construcción de Imágenes de Implementación de PS	5 días?	jue 16/06/16	mié 22/06/16		
142	Id-14 Construir imágenes de implementación de PS definidos en las mesas de planeación y programación	5 días?	jue 16/06/16	mié 22/06/16	SAT / Licitante adjudicado	
143	Preparación de Imágenes para Clonación de PS	5 días	jue 16/06/16	mié 22/06/16	Grupo Dedicado Generación Imágenes	
144	Liberación del Plan de Trabajo Detallado con Actividades Complementarias	1 día?	mié 22/06/16	mié 22/06/16		
145	Id-15 Aceptar las actividades complementarias y liberar el programa de trabajo general detallado ajustado por parte del licitante adjudicado que complemente con las actividades definidas en las mesas de planeación y programación.	1 día?	mié 22/06/16	mié 22/06/16	Administrador del Contrato,Líder de Proyecto	
146	Pruebas Piloto del Proceso de Implementación en 2 Inmuebles	3 días	jue 23/06/16	lun 27/06/16		
147	Id-16 Realizar prueba piloto del proceso de implementación en al menos 2 inmuebles	3 días	jue 23/06/16	lun 27/06/16	Administrador del Contrato,Grupo De Implementación	
148	Definir pruebas Piloto del Proceso de Implementación	3 días	jue 23/06/16	lun 27/06/16	Administrador del Contrato,Grupo De Implementación	
149	Acordar condiciones, alcances y objetivos de las pruebas	3 días	jue 23/06/16	lun 27/06/16	Administrador del Contrato,Grupo De Implementación	
150	Ejecutar pruebas	3 días	jue 23/06/16	lun 27/06/16	Administrador del Contrato,Grupo De Implementación	
151	Elaborar documentación del resultado de las pruebas	3 días	jue 23/06/16	lun 27/06/16	Administrador del Contrato,Grupo De Implementación	
152	Pruebas de PS en 2 inmuebles en ambiente operativo	5 días	lun 27/06/16	vie 01/07/16		
153	Id-17 Probar PS en al menos 2 inmuebles en ambiente operativo con la cantidad que se menciona en la Sección 3.4.1 "Fase de planificación"	5 días	lun 27/06/16	vie 01/07/16	Administrador del Contrato,Grupo De Implementación	
154	Definir pruebas de PS en ambiente operativo	2 días	lun 27/06/16	mar 28/06/16	Administrador del Contrato,Líder de Proyecto	
155	Acordar condiciones, alcances y objetivos de las pruebas	2 días	lun 27/06/16	mar 28/06/16	Administrador del Contrato,Líder de Proyecto	
156	Ejecutar pruebas	3 días	lun 27/06/16	mié 29/06/16	Administrador del Contrato,Líder de Proyecto	
157	Elaborar documentación del resultado de las pruebas	2 días	jue 30/06/16	vie 01/07/16	Administrador del Contrato,Líder de Proyecto	
158	IMPLEMENTACIÓN	112 días?	lun 06/06/16	sáb 29/10/16		
159	Establecer la documentación del control operativo	91 días	sáb 02/07/16	vie 28/10/16		
160	Id-18 Establecer la documentación del control operativo	91 días	sáb 02/07/16	vie 28/10/16	Administrador del Contrato,Líder de Proyecto	
161	Acordar documentación del control operativo	91 días	sáb 02/07/16	vie 28/10/16	Administrador del Contrato,Líder de Proyecto	
162	Ajustar documentación del control operativo	91 días	sáb 02/07/16	vie 28/10/16	Administrador del Contrato,Líder de Proyecto	
163	Validar documentación del control operativo	91 días	sáb 02/07/16	vie 28/10/16	Administrador del Contrato,Líder de Proyecto	
164	Liberar documentación del control operativo	91 días	sáb 02/07/16	vie 28/10/16	Administrador del Contrato,Líder de Proyecto	
165	Implementar esquema de integración de herramienta de gestión de activos	22 días	vie 01/07/16	vie 29/07/16		
166	Id-19 Implementar esquema de integración herramienta de gestión de activos de Mainbit con SITE	22 días	vie 01/07/16	vie 29/07/16	Especialista Herramienta SCAP,Administrador del Contrato	
167	Definición de flujos de integración	4 días	sáb 02/07/16	mié 06/07/16	Especialista Herramienta SCAP,Administrador del Contrato	
168	Especificar parametros de los métodos de Web Service de la herramienta SITE	2 días	jue 07/07/16	vie 08/07/16	Especialista Herramienta SCAP,Administrador del Contrato	
169	Creación de cliente Web Service	10 días	lun 11/07/16	vie 22/07/16	Especialista Herramienta SCAP,Administrador del Contrato	
170	Consumo o llamado a métodos del Web Service de la herramienta SITE	5 días	lun 25/07/16	vie 29/07/16	Especialista Herramienta SCAP,Administrador del Contrato	
171	Pruebas de funcionamiento entre ambas herramientas	1 día	vie 29/07/16	vie 29/07/16	Especialista Herramienta SCAP,Administrador del Contrato	
172	Implementación de la Solucion Aranda MDM	41 días	lun 06/06/16	vie 29/07/16		



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5						
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	X J
173	Implementación Aranda MDM	41 días	lun 06/06/16	vie 29/07/16		
174	Entrega de Infraestructura en los inmuebles del SAT para MDM	20 días	lun 06/06/16	vie 01/07/16	Especialista MDM	
175	Desarrollar la estrategia de Adopción	1 día	lun 04/07/16	lun 04/07/16	Especialista MDM	
176	Instalación física de componentes	5 días	mar 05/07/16	lun 11/07/16	Especialista MDM	
177	Validación de requisitos de MDM	1 día	lun 11/07/16	lun 11/07/16	Especialista MDM	
178	Instalación de roles CN/DS/API/AWCM	1 día	mar 12/07/16	mar 12/07/16	Especialista MDM	
179	Instalación de AWCC	2 días	mié 13/07/16	jue 14/07/16	Especialista MDM	
180	Instalación de Secure Email Gateway	1 día	vie 15/07/16	vie 15/07/16	Especialista MDM	
181	Instalación del Servicio de Notificación Correo Electrónico	1 día	lun 18/07/16	lun 18/07/16	Especialista MDM	
182	Instalación de VM Identity Manager	2 días	mar 19/07/16	mié 20/07/16	Especialista MDM	
183	Personalización y Configuración de políticas y Administración	1 día	mié 20/07/16	mié 20/07/16	Especialista MDM	
184	Integración de Certificados	1 día	jue 21/07/16	jue 21/07/16	Especialista MDM	
185	Integración LDAP/ Directorio Activo	2 días	vie 22/07/16	lun 25/07/16	Especialista MDM	
186	Piloto en Producción	1 día	mar 26/07/16	mar 26/07/16	Especialista MDM	
187	Liberación de Pruebas	1 día	mar 26/07/16	mar 26/07/16	Especialista MDM	
188	Estabilización	2 días	mié 27/07/16	jue 28/07/16	Especialista MDM	
189	Entrega de Operación	1 día	jue 28/07/16	jue 28/07/16	Especialista MDM	
190	Entrega de Memoria Técnica	1 día	vie 29/07/16	vie 29/07/16	Especialista MDM	
191	Firma de Aceptación	1 día	vie 29/07/16	vie 29/07/16	Administrador del Contrato, Líder de Proyecto	
192	Id-20 Implementar la plataforma de PS (revisar el plan de despliegue por localidad que se encuentra en el apéndice 3 "Plan de despliegue e implementación".	92 días	sáb 02/07/16	sáb 29/10/16	Grupo De Implementación	
193	Implementación de la plataforma de PS (Logística, Entrega, Migración, Puesta a Punto de los PS)	92 días	sáb 02/07/16	sáb 29/10/16		
194	Centro aguascalientes 1	22 días	sáb 02/07/16	dom 31/07/16	Grupo De Implementación	
195	Centro aduana de aguascalientes	18 días	vie 05/08/16	lun 29/08/16	Grupo De Implementación	
196	Centro colima 1	31 días	dom 31/07/16	jue 08/09/16	Grupo De Implementación	
197	Centro aduana de manzanillo	31 días	sáb 10/09/16	mié 19/10/16	Grupo De Implementación	
198	Centro méxico 1	34 días	sáb 02/07/16	lun 15/08/16	Grupo De Implementación	
199	Centro aduana de toluca	19 días	mar 16/08/16	vie 09/09/16	Grupo De Implementación	
200	Centro méxico 2	78 días	jue 21/07/16	sáb 29/10/16	Grupo De Implementación	
201	Centro guanajuato 2	30 días	sáb 02/07/16	mié 10/08/16	Grupo De Implementación	
202	Centro aduana de guanajuato	15 días	vie 12/08/16	mié 31/08/16	Grupo De Implementación	
203	Centro guanajuato 3	36 días	dom 31/07/16	mar 13/09/16	Grupo De Implementación	
204	Centro guanajuato 1	24 días	mar 30/08/16	mié 28/09/16	Grupo De Implementación	
205	Centro hidalgo 1	47 días	lun 15/08/16	jue 13/10/16	Grupo De Implementación	
206	Centro jalisco 2	69 días	sáb 02/07/16	jue 29/09/16	Grupo De Implementación	
207	Centro jalisco 3	47 días	jue 21/07/16	dom 18/09/16	Grupo De Implementación	
208	Centro jalisco 4	23 días	lun 19/09/16	mar 18/10/16	Grupo De Implementación	
209	Centro jalisco 1	36 días	dom 31/07/16	mar 13/09/16	Grupo De Implementación	
210	Centro aduana de guadalajara	23 días	mié 14/09/16	jue 13/10/16	Grupo De Implementación	
211	Centro jalisco 5	24 días	mar 30/08/16	mié 28/09/16	Grupo De Implementación	
212	Centro michoacán 1	39 días	sáb 02/07/16	dom 21/08/16	Grupo De Implementación	
213	Centro michoacán 2	28 días	lun 22/08/16	dom 25/09/16	Grupo De Implementación	
214	Centro aduana de lázaro cárdenas	20 días	lun 26/09/16	jue 20/10/16	Grupo De Implementación	
215	Centro morelos 1	33 días	mar 30/08/16	sáb 08/10/16	Grupo De Implementación	
216	Centro nayarit 1	33 días	mar 30/08/16	sáb 08/10/16	Grupo De Implementación	
217	Centro querétaro 1	47 días	jue 21/07/16	dom 18/09/16	Grupo De Implementación	



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	X J
218	Centro aduana de querétaro	16 días	mar 20/09/16	dom 09/10/16	Grupo De Implementación	
219	Centro san luis potosí 1	36 días	dom 31/07/16	mar 13/09/16	Grupo De Implementación	
220	Centro zacatecas 1	25 días	mié 31/08/16	vie 30/09/16	Grupo De Implementación	
221	Centro-df distrito federal 5	92 días	sáb 02/07/16	sáb 29/10/16	Grupo De Implementación	
222	Centro-df aduana del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico	47 días	jue 21/07/16	dom 18/09/16	Grupo De Implementación	
223	Centro-df aduana de méxico	23 días	mar 20/09/16	mié 19/10/16	Grupo De Implementación	
224	Centro-df distrito federal 2	78 días	jue 21/07/16	sáb 29/10/16	Grupo De Implementación	
225	Centro-df distrito federal 1	78 días	jue 21/07/16	sáb 29/10/16	Grupo De Implementación	
226	Centro-df distrito federal 3	78 días	jue 21/07/16	sáb 29/10/16	Grupo De Implementación	
227	Centro-df distrito federal 4	78 días	jue 21/07/16	sáb 29/10/16	Grupo De Implementación	
228	Norte baja california 2	40 días	sáb 02/07/16	mar 23/08/16	Grupo De Implementación	
229	Norte aduana de tijuana	34 días	mié 24/08/16	mié 05/10/16	Grupo De Implementación	
230	Norte aduana de ensenada	23 días	vie 30/09/16	sáb 29/10/16	Grupo De Implementación	
231	Norte aduana de tecate	11 días	mié 24/08/16	mié 07/09/16	Grupo De Implementación	
232	Norte baja california 3	30 días	jue 08/09/16	vie 14/10/16	Grupo De Implementación	
233	Norte baja california 1	27 días	jue 21/07/16	mié 24/08/16	Grupo De Implementación	
234	Norte aduana de mexicali	24 días	jue 25/08/16	vie 23/09/16	Grupo De Implementación	
235	Norte baja california sur 1	35 días	jue 21/07/16	sáb 03/09/16	Grupo De Implementación	
236	Norte baja california sur 2	36 días	dom 04/09/16	mar 18/10/16	Grupo De Implementación	
237	Norte aduana de la paz	31 días	dom 31/07/16	jue 08/09/16	Grupo De Implementación	
238	Norte chihuahua 1	39 días	sáb 02/07/16	sáb 20/08/16	Grupo De Implementación	
239	Norte aduana de chihuahua	18 días	dom 21/08/16	dom 11/09/16	Grupo De Implementación	
240	Norte aduana de ojinaga	12 días	dom 21/08/16	dom 04/09/16	Grupo De Implementación	
241	Norte chihuahua 2	33 días	jue 21/07/16	jue 01/09/16	Grupo De Implementación	
242	Norte aduana de ciudad Juárez	34 días	vie 02/09/16	vie 14/10/16	Grupo De Implementación	
243	Norte aduana de puerto palomas	12 días	sáb 15/10/16	sáb 29/10/16	Grupo De Implementación	
244	Norte coahuila de zaragoza 2	45 días	sáb 02/07/16	mar 30/08/16	Grupo De Implementación	
245	Norte aduana de torreón	21 días	mié 31/08/16	sáb 24/09/16	Grupo De Implementación	
246	Norte coahuila de zaragoza 1	28 días	dom 25/09/16	sáb 29/10/16	Grupo De Implementación	
247	Norte coahuila de zaragoza 3	23 días	dom 31/07/16	lun 29/08/16	Grupo De Implementación	
248	Norte aduana de piedras negras	18 días	mar 30/08/16	mar 20/09/16	Grupo De Implementación	
249	Norte aduana de ciudad acuña	12 días	mié 21/09/16	mié 05/10/16	Grupo De Implementación	
250	Norte durango 1	30 días	mar 30/08/16	mié 05/10/16	Grupo De Implementación	
251	Norte nuevo león 2	58 días	sáb 02/07/16	mié 14/09/16	Grupo De Implementación	
252	Norte aduana de colombia	15 días	jue 15/09/16	mar 04/10/16	Grupo De Implementación	
253	Norte nuevo león 1	36 días	dom 31/07/16	mar 13/09/16	Grupo De Implementación	
254	Norte aduana de monterrey	20 días	mié 14/09/16	sáb 08/10/16	Grupo De Implementación	
255	Norte nuevo león 3	36 días	mar 30/08/16	jue 13/10/16	Grupo De Implementación	
256	Norte sinaloa 1	34 días	sáb 02/07/16	lun 15/08/16	Grupo De Implementación	
257	Norte sinaloa 3	24 días	mar 16/08/16	mié 14/09/16	Grupo De Implementación	
258	Norte sinaloa 2	34 días	jue 15/09/16	sáb 29/10/16	Grupo De Implementación	
259	Norte aduana de mazatlán	23 días	jue 15/09/16	vie 14/10/16	Grupo De Implementación	
260	Norte sonora 1	39 días	sáb 02/07/16	sáb 20/08/16	Grupo De Implementación	
261	Norte sonora 2	32 días	dom 21/08/16	jue 29/09/16	Grupo De Implementación	
262	Norte aduana de guaymas	15 días	vie 30/09/16	mié 19/10/16	Grupo De Implementación	
263	Norte sonora 3	31 días	dom 31/07/16	jue 08/09/16	Grupo De Implementación	



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	X J
264	Norte aduana de nogales	25 días	vie 09/09/16	sáb 08/10/16	Grupo De Implementación	
265	Norte aduana de naco	18 días	vie 09/09/16	vie 30/09/16	Grupo De Implementación	
266	Norte aduana de agua prieta	15 días	sáb 01/10/16	jue 20/10/16	Grupo De Implementación	
267	Norte aduana de san luis río colorado	19 días	sáb 24/09/16	mar 18/10/16	Grupo De Implementación	
268	Norte aduana de sonoyta	16 días	sáb 24/09/16	jue 13/10/16	Grupo De Implementación	
269	Norte aduana de nuevo laredo	37 días	sáb 02/07/16	jue 18/08/16	Grupo De Implementación	
270	Norte tamaulipas 3	27 días	vie 19/08/16	jue 22/09/16	Grupo De Implementación	
271	Norte aduana de ciudad camargo	15 días	vie 23/09/16	mié 12/10/16	Grupo De Implementación	
272	Norte aduana de ciudad miguel alemán	15 días	vie 23/09/16	mié 12/10/16	Grupo De Implementación	
273	Norte tamaulipas 4	28 días	sáb 20/08/16	vie 23/09/16	Grupo De Implementación	
274	Norte aduana de ciudad reynosa	23 días	sáb 24/09/16	dom 23/10/16	Grupo De Implementación	
275	Norte tamaulipas 2	28 días	dom 31/07/16	lun 05/09/16	Grupo De Implementación	
276	Norte aduana de matamoros	30 días	mar 06/09/16	mié 12/10/16	Grupo De Implementación	
277	Sur campeche 1	31 días	dom 31/07/16	jue 08/09/16	Grupo De Implementación	
278	Sur aduana de ciudad del carmen	13 días	sáb 10/09/16	sáb 24/09/16	Grupo De Implementación	
279	Sur chiapas 2	22 días	sáb 02/07/16	dom 31/07/16	Grupo De Implementación	
280	Sur aduana de ciudad hidalgo	36 días	lun 01/08/16	mié 14/09/16	Grupo De Implementación	
281	Sur chiapas 1	29 días	jue 15/09/16	lun 24/10/16	Grupo De Implementación	
282	Sur guerrero 1	27 días	jue 21/07/16	mié 24/08/16	Grupo De Implementación	
283	Sur aduana de acapulco	16 días	vie 26/08/16	mié 14/09/16	Grupo De Implementación	
284	Sur guerrero 2	23 días	vie 16/09/16	sáb 15/10/16	Grupo De Implementación	
285	Sur oaxaca 1	47 días	dom 31/07/16	mié 28/09/16	Grupo De Implementación	
286	Sur aduana de salina cruz	15 días	jue 29/09/16	mar 18/10/16	Grupo De Implementación	
287	Sur puebla 2	45 días	sáb 02/07/16	mar 30/08/16	Grupo De Implementación	
288	Sur aduana de puebla	16 días	jue 01/09/16	mar 20/09/16	Grupo De Implementación	
289	Sur puebla 1	47 días	dom 31/07/16	mié 28/09/16	Grupo De Implementación	
290	Sur quintana roo 2	30 días	sáb 02/07/16	mié 10/08/16	Grupo De Implementación	
291	Sur aduana de cancún	23 días	jue 11/08/16	vie 09/09/16	Grupo De Implementación	
292	Sur quintana roo 1	23 días	jue 11/08/16	vie 09/09/16	Grupo De Implementación	
293	Sur aduana subteniente lópez	16 días	sáb 10/09/16	jue 29/09/16	Grupo De Implementación	
294	Sur tabasco 1	40 días	dom 31/07/16	dom 18/09/16	Grupo De Implementación	
295	Sur aduana dos bocas	16 días	mar 20/09/16	dom 09/10/16	Grupo De Implementación	
296	Sur tamaulipas 1	27 días	sáb 02/07/16	vie 05/08/16	Grupo De Implementación	
297	Sur tamaulipas 5	27 días	sáb 06/08/16	vie 09/09/16	Grupo De Implementación	
298	Sur aduana de tampico	16 días	sáb 10/09/16	jue 29/09/16	Grupo De Implementación	
299	Sur aduana de altamira	23 días	vie 30/09/16	sáb 29/10/16	Grupo De Implementación	
300	Sur tlaxcala 1	28 días	mar 30/08/16	lun 03/10/16	Grupo De Implementación	
301	Sur veracruz 2	39 días	sáb 02/07/16	sáb 20/08/16	Grupo De Implementación	
302	Sur aduana de veracruz	36 días	dom 21/08/16	mar 04/10/16	Grupo De Implementación	
303	Sur aduana de coatzacoalcos	15 días	jue 22/09/16	mar 11/10/16	Grupo De Implementación	
304	Sur veracruz 3	36 días	dom 31/07/16	mar 13/09/16	Grupo De Implementación	
305	Sur veracruz 1	34 días	mié 14/09/16	vie 28/10/16	Grupo De Implementación	
306	Sur veracruz 5	31 días	dom 31/07/16	jue 08/09/16	Grupo De Implementación	
307	Sur aduana de tuxpan	16 días	sáb 10/09/16	jue 29/09/16	Grupo De Implementación	
308	Sur veracruz 4	33 días	mar 30/08/16	sáb 08/10/16	Grupo De Implementación	
309	Sur yucatán 1	36 días	dom 31/07/16	mar 13/09/16	Grupo De Implementación	



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5						
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	X J
310	Sur aduana de progreso	19 días	jue 15/09/16	dom 09/10/16	Grupo De Implementación	
311	Estabilización de la operación del servicio	69 días	sáb 02/07/16	jue 29/09/16		
312	Id-21 Iniciar estabilización de la operación del servicio	69 días	sáb 02/07/16	jue 29/09/16	Especialista Herramienta LanDesk, Especialista Herramienta S	
313	Monitoreo de los Componentes del Servicio	69 días	sáb 02/07/16	jue 29/09/16	Especialista Herramienta LanDesk, Especialista Herramienta S	
314	Validación de los Componentes del Servicio	69 días	sáb 02/07/16	jue 29/09/16	Especialista Herramienta LanDesk, Especialista Herramienta S	
315	Ajustes de Mejora del Servicio	69 días	sáb 02/07/16	jue 29/09/16	Especialista Herramienta LanDesk, Especialista Herramienta S	
316	Monitoreo, validación, ajustes y mejora del servicio	69 días	sáb 02/07/16	jue 29/09/16	Especialista Herramienta LanDesk, Especialista Herramienta S	
317	Liberar la conexión a terceros	1 día	mar 16/08/16	mar 16/08/16		
318	Id-22 Liberar la conexión a terceros	1 día	mar 16/08/16	mar 16/08/16	Líder de Proyecto	
319	Liberar esquema de integración de la herramienta de gestión de activos con SITE	1 día?	mié 17/08/16	mié 17/08/16		
320	Id-23 Liberar el esquema de integración herramienta de gestión de activos del licitante adjudicado con SITE	1 día?	mié 17/08/16	mié 17/08/16	Líder de Proyecto	
321	Revisión de Funcionamiento	1 día	mié 17/08/16	mié 17/08/16	Especialista Herramienta SCAP, Líder de Proyecto	
322	Validación del Funcionamiento de la Herramienta de Gestión de Activos (SCAP) con SITE	1 día	mié 17/08/16	mié 17/08/16	Especialista Herramienta SCAP, Líder de Proyecto	
323	Implementación y pruebas integrales de integración con la Mesa de Servicio SAT	35 días?	mié 17/08/16	vie 30/09/16		
324	Id-24 Implementar y realizar pruebas integrales del esquema de integración con la mesa de servicio SAT	35 días?	mié 17/08/16	vie 30/09/16	Administrador del Contrato, Especialista Mesa de Servicio, Líde	
325	Revisión de Funcionamiento	5 días	mié 17/08/16	mar 23/08/16	Administrador del Contrato, Especialista Mesa de Servicio, Líde	
326	Validación del funcionamiento de la Mesa de Servicio CA Service Desk 14.1	5 días	mié 24/08/16	mar 30/08/16	Administrador del Contrato, Especialista Mesa de Servicio, Líde	
327	Definición de pruebas integrales CA Service Desk 14.1 vs Remedy	2 días	mié 31/08/16	jue 01/09/16	Administrador del Contrato, Especialista Mesa de Servicio, Líde	
328	Acuerdo de realización de pruebas	2 días	vie 02/09/16	lun 05/09/16	Administrador del Contrato, Especialista Mesa de Servicio, Líde	
329	Ejecución de pruebas integrales CA Service Desk 14.1 vs Remedy	10 días	mar 06/09/16	jue 15/09/16	Administrador del Contrato, Especialista Mesa de Servicio, Líde	
330	Documentación de pruebas integrales	8 días	vie 16/09/16	mar 27/09/16	Administrador del Contrato, Especialista Mesa de Servicio, Líde	
331	Entrega de Memoria Técnica CA Service Desk 14.1	1 día	mié 28/09/16	mié 28/09/16	Administrador del Contrato, Especialista Mesa de Servicio, Líde	
332	Liberar esquema de integración con la mesa de servicio SAT	1 día	sáb 01/10/16	sáb 01/10/16		
333	Id-25 Liberar el esquema de integración con la mesa de servicio SAT	1 día	sáb 01/10/16	sáb 01/10/16	Especialista Mesa de Servicio, Líder de Proyecto	
334	Entrega de documentación de control operativo	1 día	sáb 29/10/16	sáb 29/10/16		
335	Id-26 Entregar la documentación del control operativo	1 día	sáb 29/10/16	sáb 29/10/16	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
336	Entrega de Memoria Técnica	1 día	sáb 29/10/16	sáb 29/10/16	Líder de Proyecto	
337	Revisión de Memoria Técnica	1 día	sáb 29/10/16	sáb 29/10/16	Líder de Proyecto	
338	Documento de cierre de etapa	1 día	sáb 29/10/16	sáb 29/10/16	Líder de Proyecto	
339	Firma y aceptación de cierre de etapa	1 día	sáb 29/10/16	sáb 29/10/16	Líder de Proyecto	
340	EJECUCIÓN Y CONTROL	813 días?	dom 30/10/16	sáb 30/11/19		
341	Id-27 Aplicar las gestorías del servicio	812 días?	lun 31/10/16	sáb 30/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
342	Gestión del Servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19		
343	Mesa de Servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19		
344	Entrega de Operación	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
345	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
346	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
347	Periodo de administración del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
348	Herramienta de Gestión de Activos	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19		
349	Entrega de Operación	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
350	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
351	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
352	Periodo de administración del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
353	Interconexión de Terceros	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19		
354	Entrega de Operación	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
355	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5						
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	X J
356	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
357	Periodo de administración del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
358	Herramienta de Administración de Inventarios y generación de resguardos (SITE - SCAP)	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19		
359	Entrega de Operación	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
360	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
361	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
362	Periodo de administración del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
363	Administración de Dispositivos Móviles	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19		
364	Entrega de Operación	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
365	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
366	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
367	Periodo de administración del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
368	Administración de PS	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19		
369	Entrega de Operación	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
370	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
371	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
372	Periodo de administración del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
373	Medición del Servicio y Entregables Periódicos	813 días?	dom 30/10/16	sáb 30/11/19		
374	Id-28 Aplicar la medición del cumplimiento del servicio y entregables periódicos y bajo demanda	811 días?	mar 01/11/16	sáb 30/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
375	Mesa de Servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19		
376	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
377	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
378	Reporte Continuo de Resultados	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
379	Herramienta de Gestión de Activos	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19		
380	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
381	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
382	Reporte Continuo de Resultados	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
383	Periodo de administración del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
384	Interconexión de Terceros	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19		
385	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
386	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
387	Reporte Continuo de Resultados	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
388	Periodo de administración del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
389	Herramienta de Administración de Inventarios y generación de resguardos (SITE - SCAP)	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19		
390	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
391	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
392	Reporte Continuo de Resultados	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
393	Periodo de administración del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
394	Administración de Dispositivos Móviles	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19		
395	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
396	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
397	Reporte Continuo de Resultados	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
398	Periodo de administración del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
399	Administración de PS	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19		
400	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
401	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	




ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5						
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	X J
402	Reporte Continuo de Resultados	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19	Líder de Proyecto, Administrador del Contrato	
403	CIERRE	257 días?	mar 01/01/19	lun 16/12/19		
404	Lista de verificación	224 días?	mar 01/01/19	jue 31/10/19		
405	Id-29 Elaborar lista de verificación (checklist) de las actividades y documentos necesarios para el cierre de contrato	224 días?	mar 01/01/19	jue 31/10/19	Administrador del Contrato, Líder de Proyecto	
406	Libro Blanco	223 días?	mié 02/01/19	jue 31/10/19		
407	Id-30 Conformar libro blanco	223 días?	mié 02/01/19	jue 31/10/19	Administrador del Contrato	
408	Donación de Perfiles	14 días	vie 01/03/19	mié 20/03/19		
409	Id-31 Definir la donación de perfiles	14 días	vie 01/03/19	mié 20/03/19	Administrador del Contrato, Líder de Proyecto	
410	Realizar una mesa de planeación	2 días	vie 01/03/19	lun 04/03/19	Administrador del Contrato, Líder de Proyecto	
411	Definir condiciones de donación de equipo	5 días	mar 05/03/19	lun 11/03/19	Administrador del Contrato, Líder de Proyecto	
412	Acordar lineamientos de donación de equipo	5 días	mar 12/03/19	lun 18/03/19	Administrador del Contrato, Líder de Proyecto	
413	Firma acuerdo de donación de equipo	2 días	mar 19/03/19	mié 20/03/19	Administrador del Contrato, Líder de Proyecto	
414	Plan de Retiro de PS	1 día	lun 01/04/19	lun 01/04/19		
415	Id-32 Entregar plan de retiro de equipo para los perfiles que aplique	1 día	lun 01/04/19	lun 01/04/19	Líder de Proyecto	
416	Elaborar plan de retiro de equipos para los perfiles que aplique	1 día	lun 01/04/19	lun 01/04/19	Líder de Proyecto	
417	Verificar el plan de retiro de equipos para los perfiles que aplique	1 día	lun 01/04/19	lun 01/04/19	Administrador del Contrato, Líder de Proyecto	
418	Retiro de PS Donados	175 días	sáb 06/04/19	sáb 30/11/19		
419	Id-33 Retirar los perfiles que así fueron definidos	175 días	sáb 06/04/19	sáb 30/11/19	Líder de Proyecto	
420	Solicitar autorización del SAT para ejecutar el plan de retiro de equipos	10 días	sáb 06/04/19	mié 17/04/19	Líder de Proyecto	
421	Retiro de Equipo	175 días	sáb 06/04/19	sáb 30/11/19	Administrador del Contrato	
422	Verificar cumplimiento del checklist para el cierre	4 días?	vie 01/11/19	mié 06/11/19	Administrador del Contrato, Líder de Proyecto	
423	Id-34 Verificar el cumplimiento del checklist de actividades y documentos para el cierre	4 días?	vie 01/11/19	mié 06/11/19	Administrador del Contrato[550%], Líder de Proyecto[550%]	
424	Comparar el monitoreo contra el checklist	4 días?	vie 01/11/19	mié 06/11/19	Administrador del Contrato, Líder de Proyecto	
425	Reportar hallazgos	4 días?	vie 01/11/19	mié 06/11/19	Administrador del Contrato, Líder de Proyecto	
426	Validación del último mes	33 días	vie 01/11/19	lun 16/12/19	Administrador del Contrato, Líder de Proyecto	
427	Id-35 Validar último mes de niveles de servicio y firmar acta de entrega de los servicios	33 días	vie 01/11/19	lun 16/12/19	Administrador del Contrato, Líder de Proyecto	
428	Comparar el monitoreo contra el checklist	33 días	vie 01/11/19	lun 16/12/19	Administrador del Contrato, Líder de Proyecto	
429	Documentar reporte de hallazgos	33 días	vie 01/11/19	lun 16/12/19	Administrador del Contrato, Líder de Proyecto	
430	Verificar los niveles de servicio	33 días	vie 01/11/19	lun 16/12/19	Administrador del Contrato, Líder de Proyecto	




ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

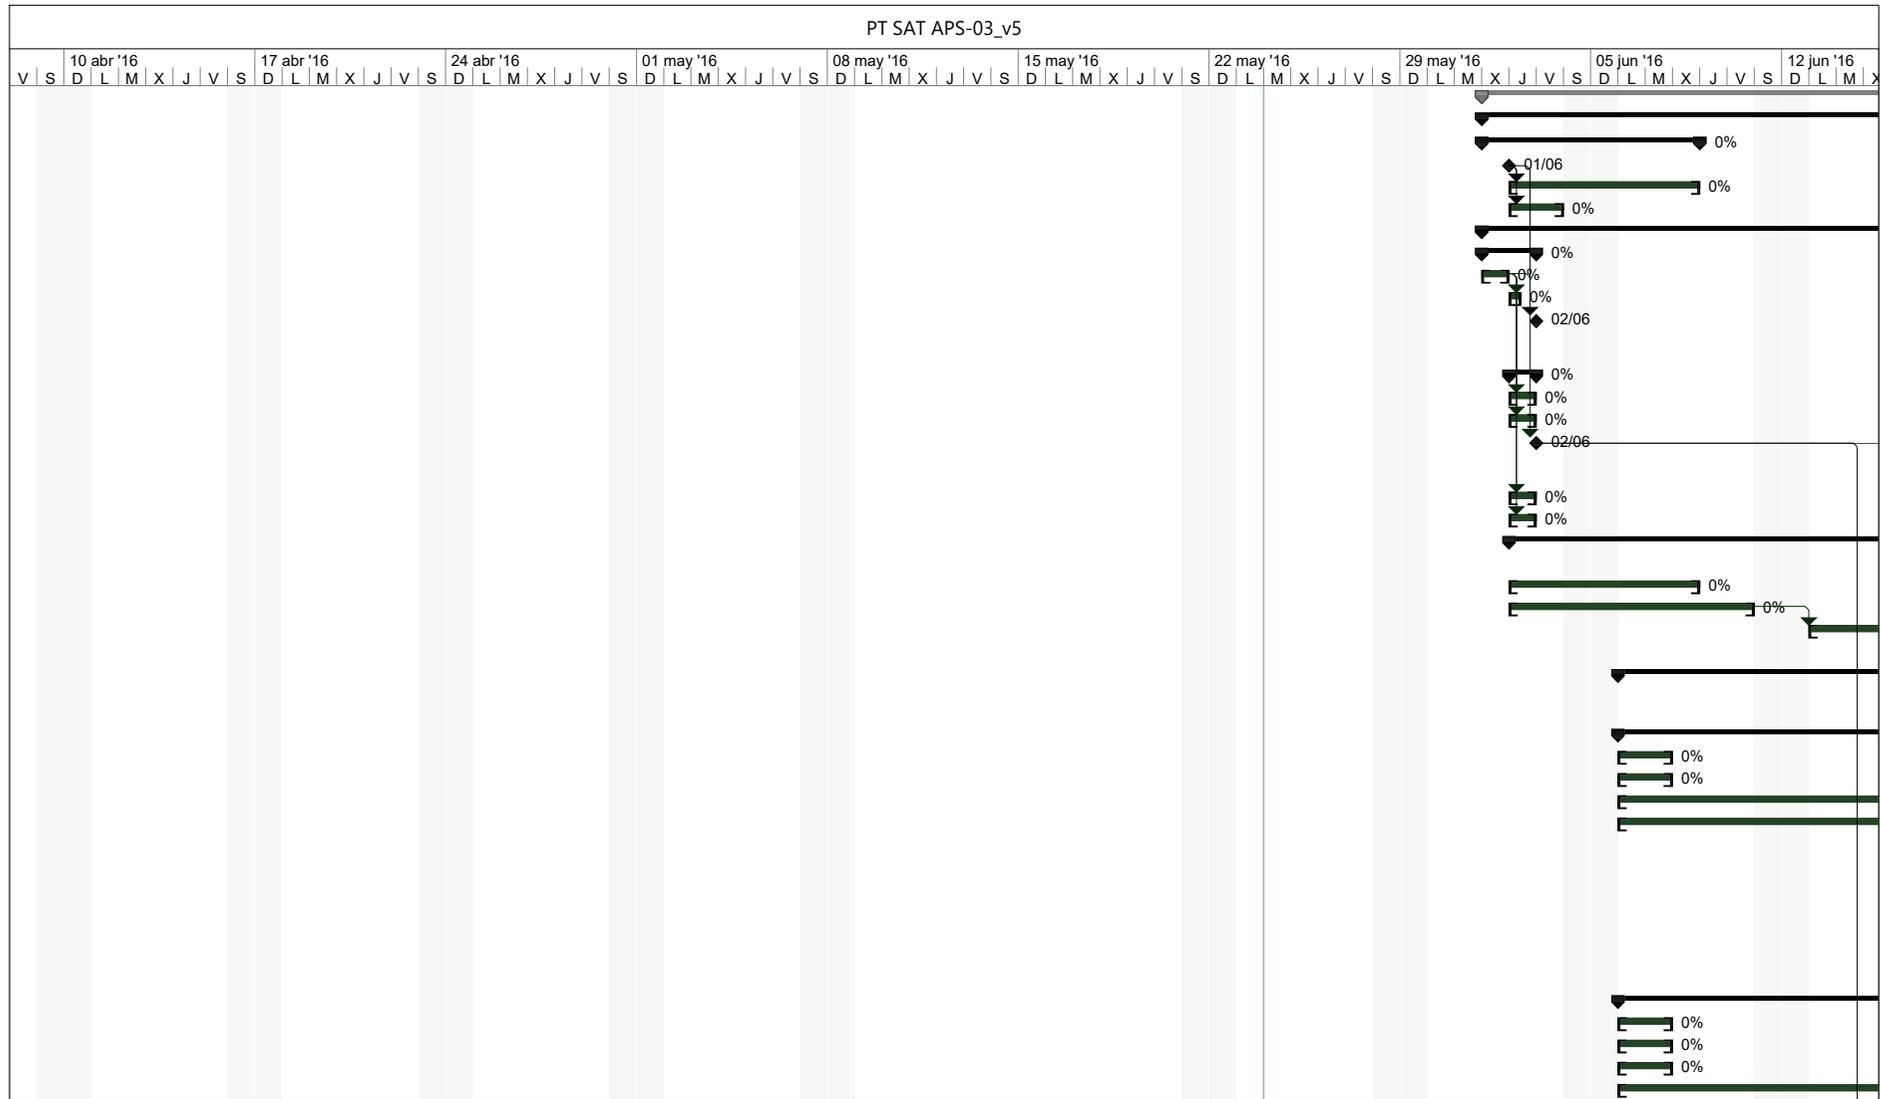


ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5

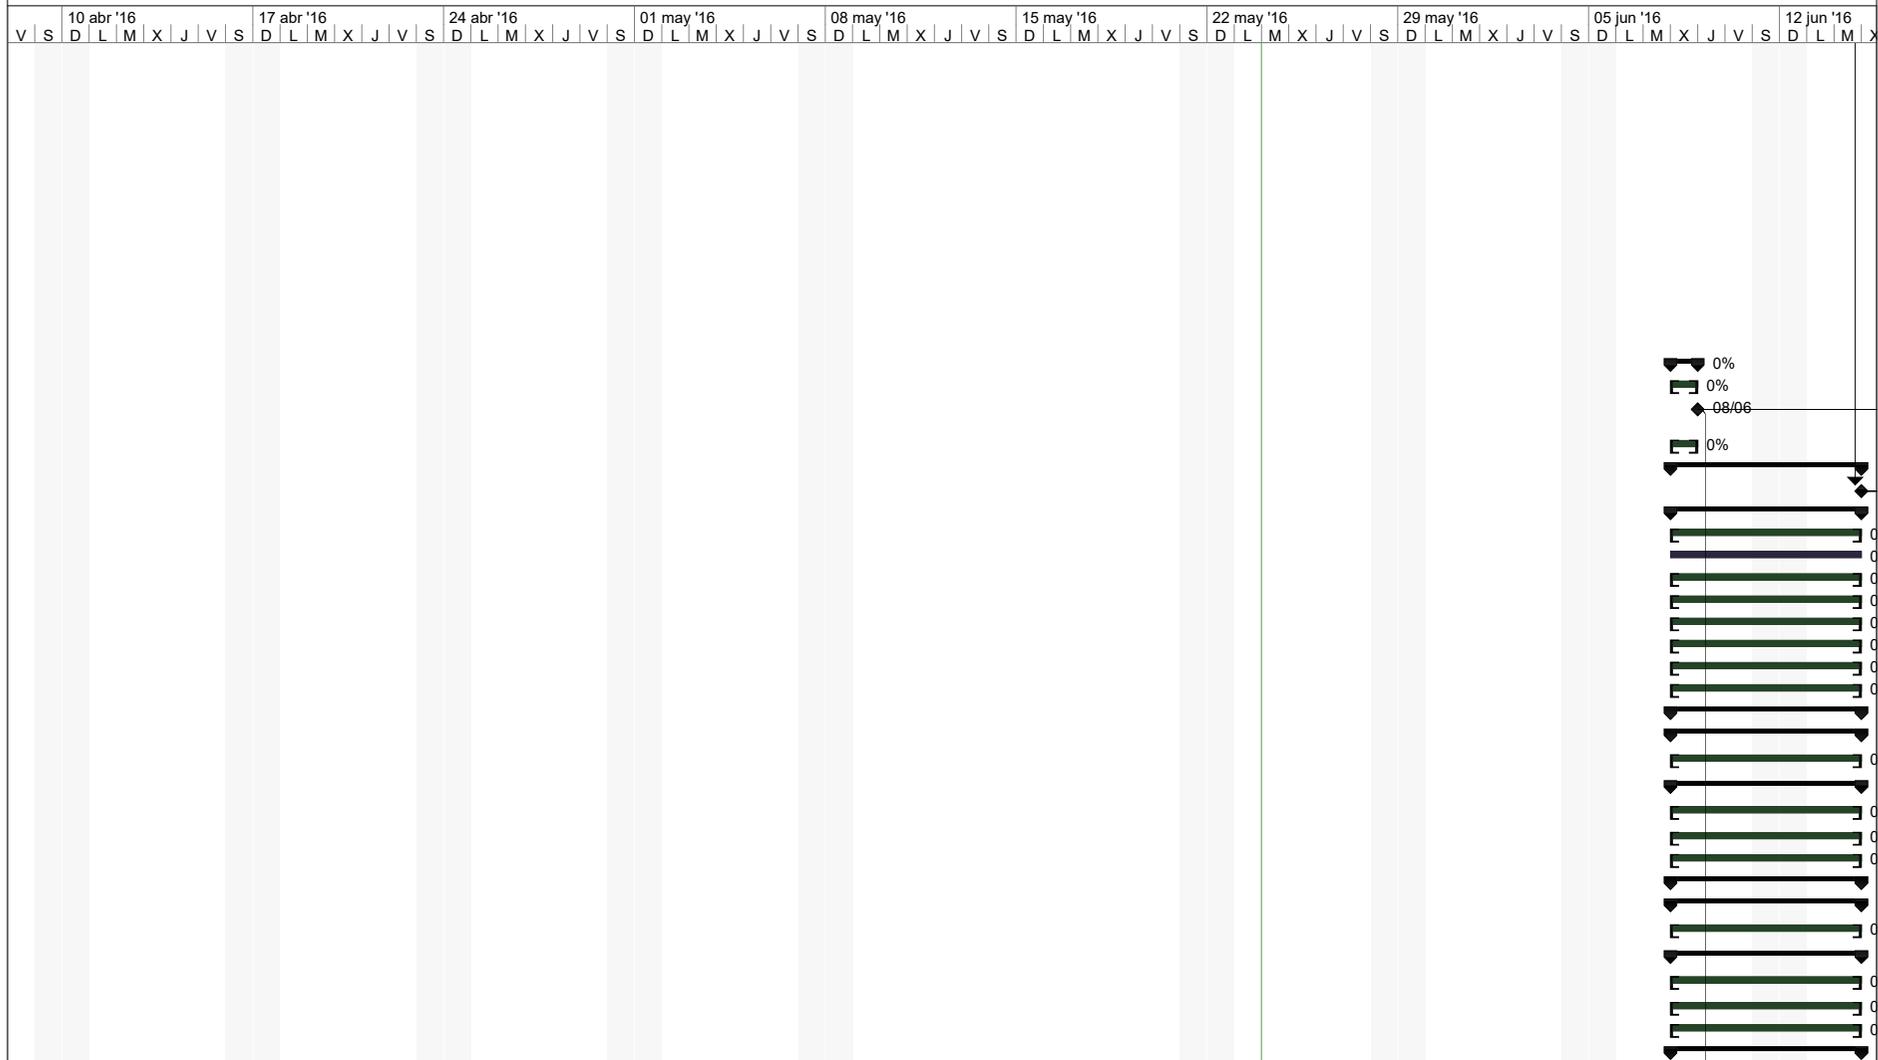

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

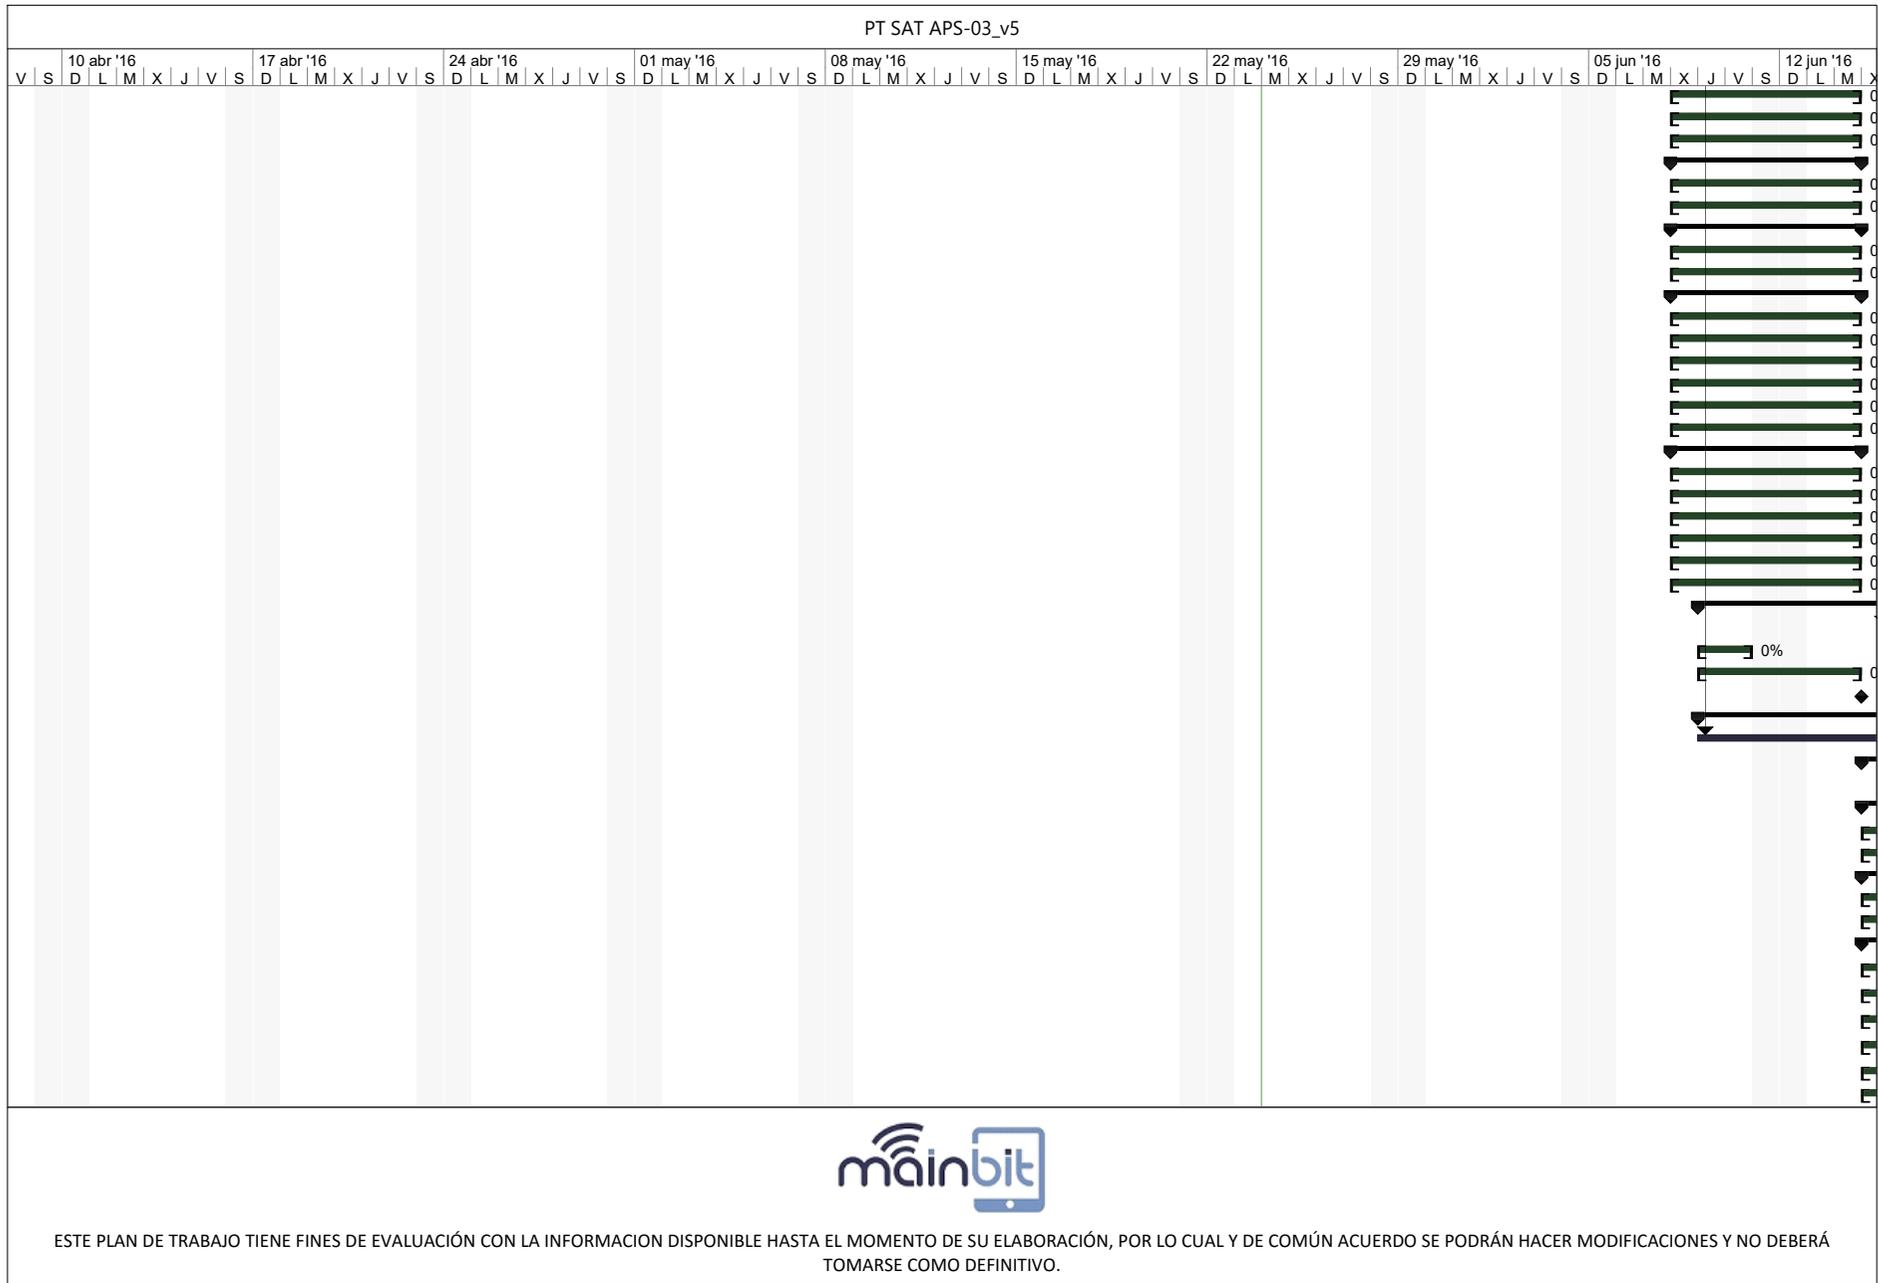


ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.


PT SAT APS-03_v5																																																			
10 abr '16		17 abr '16		24 abr '16		01 may '16		08 may '16		15 may '16		22 may '16		29 may '16		05 jun '16		12 jun '16																																	
V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S								




ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

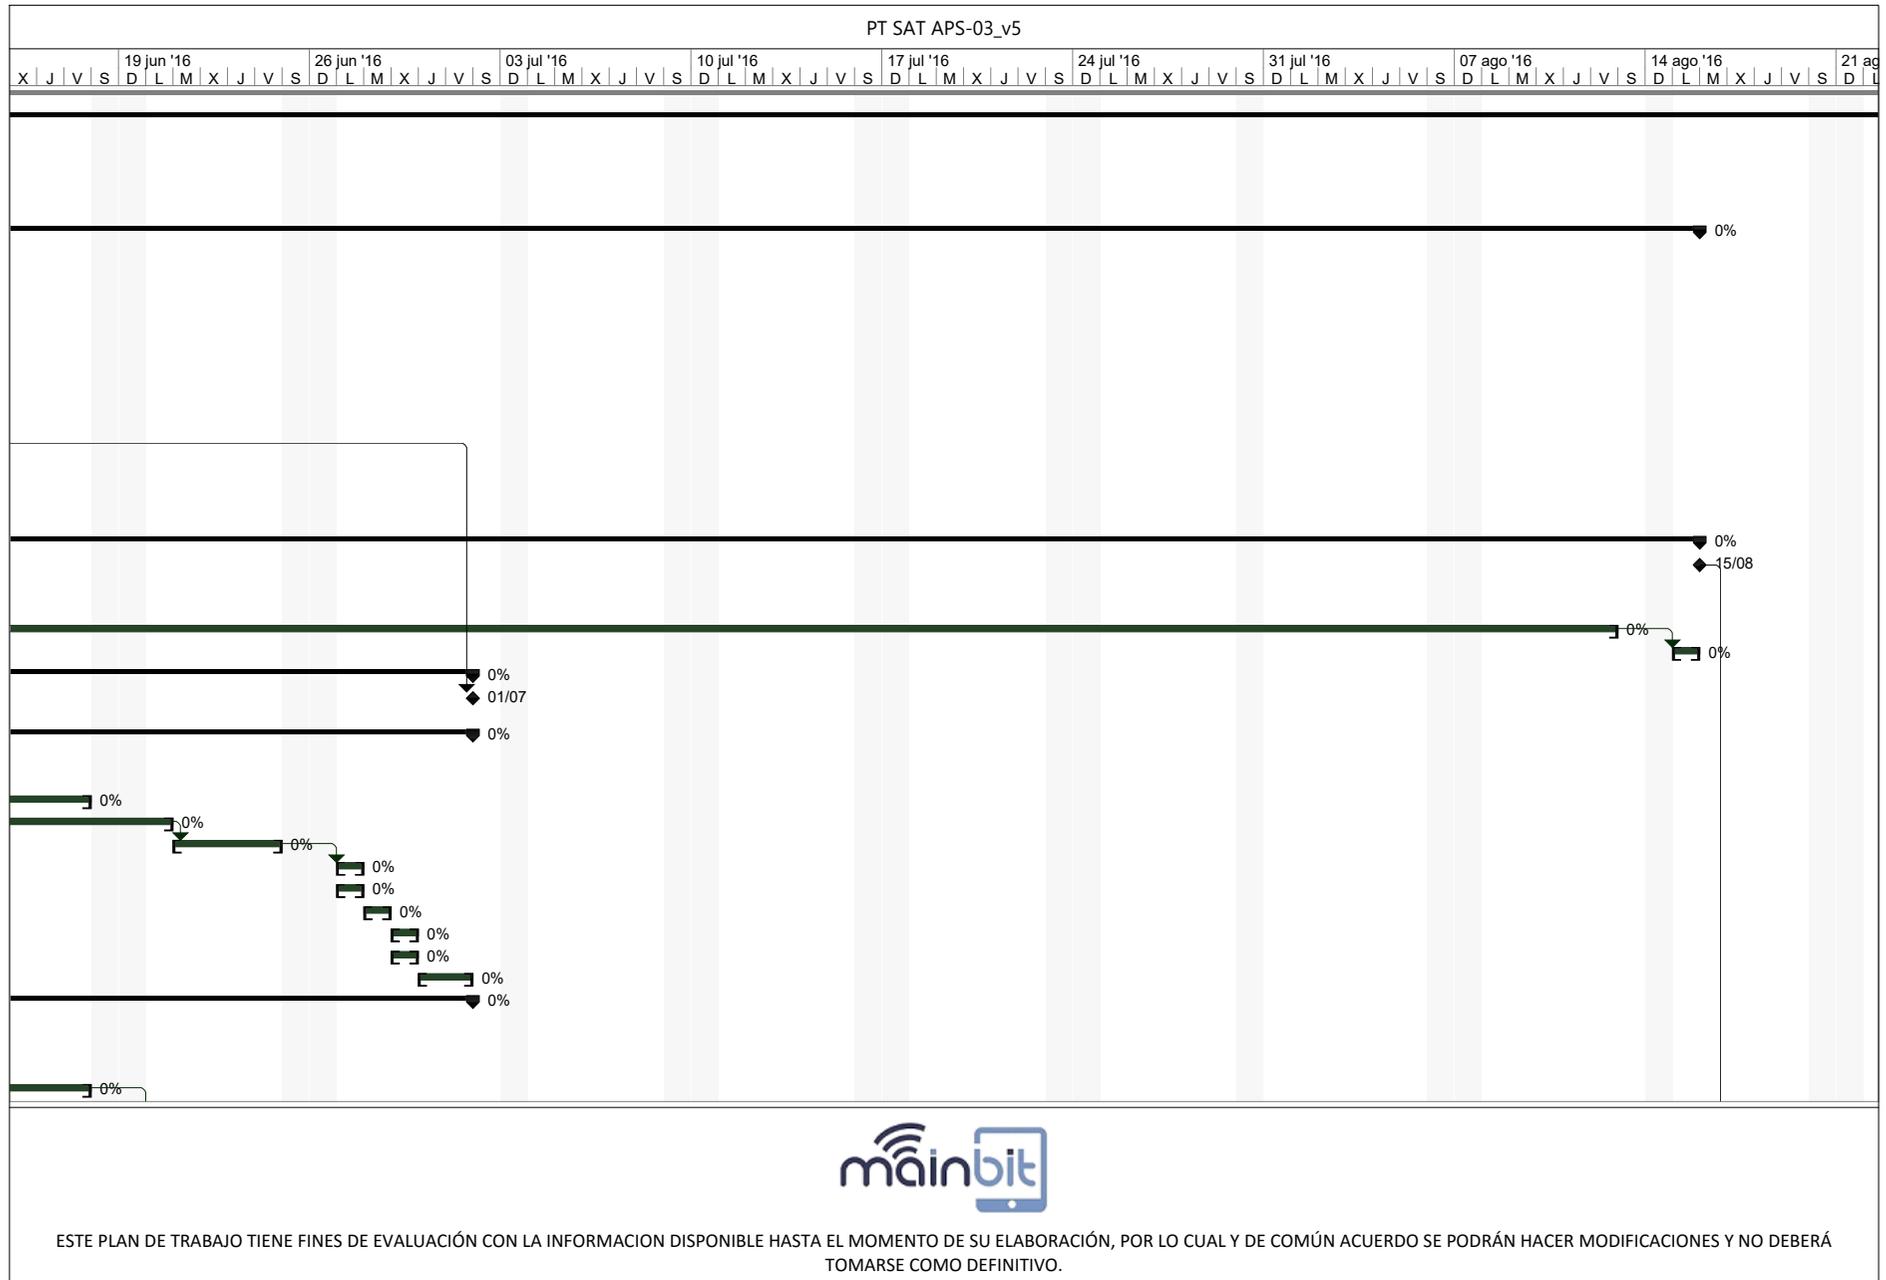



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

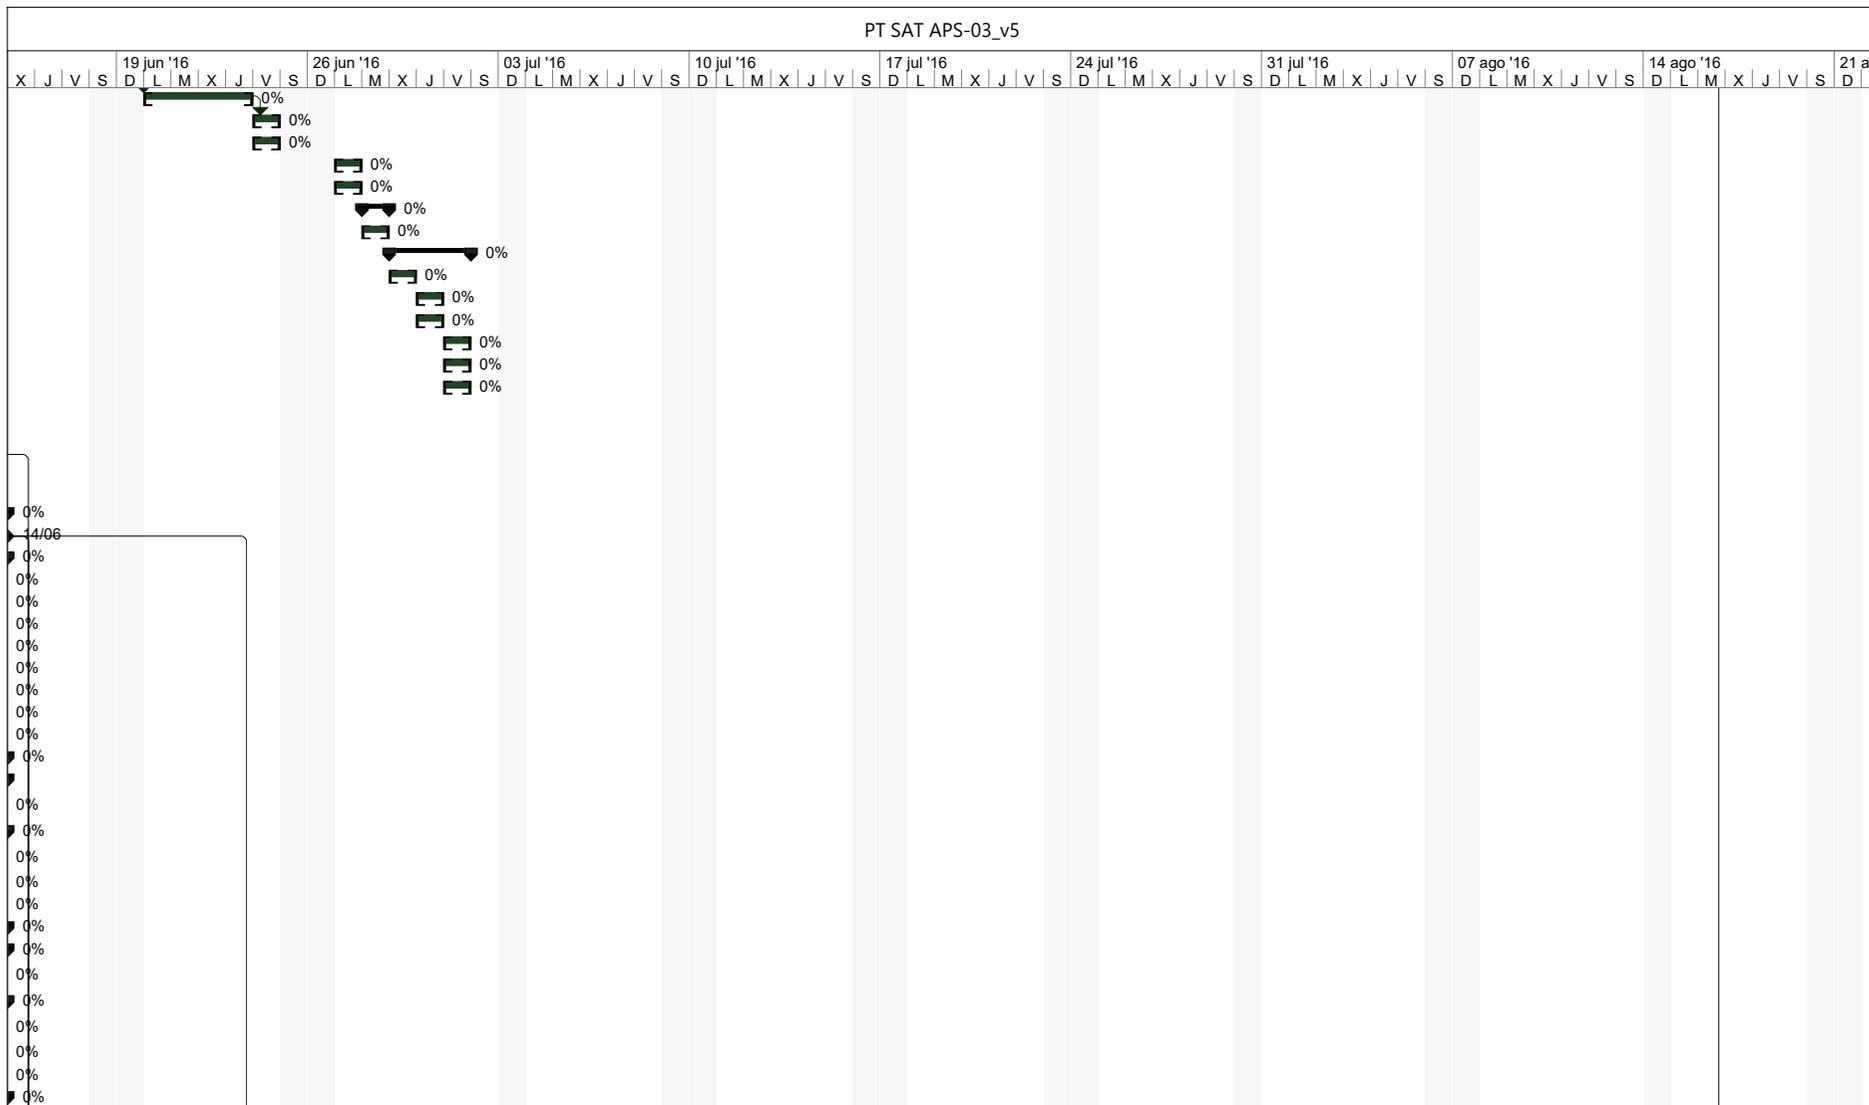


ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

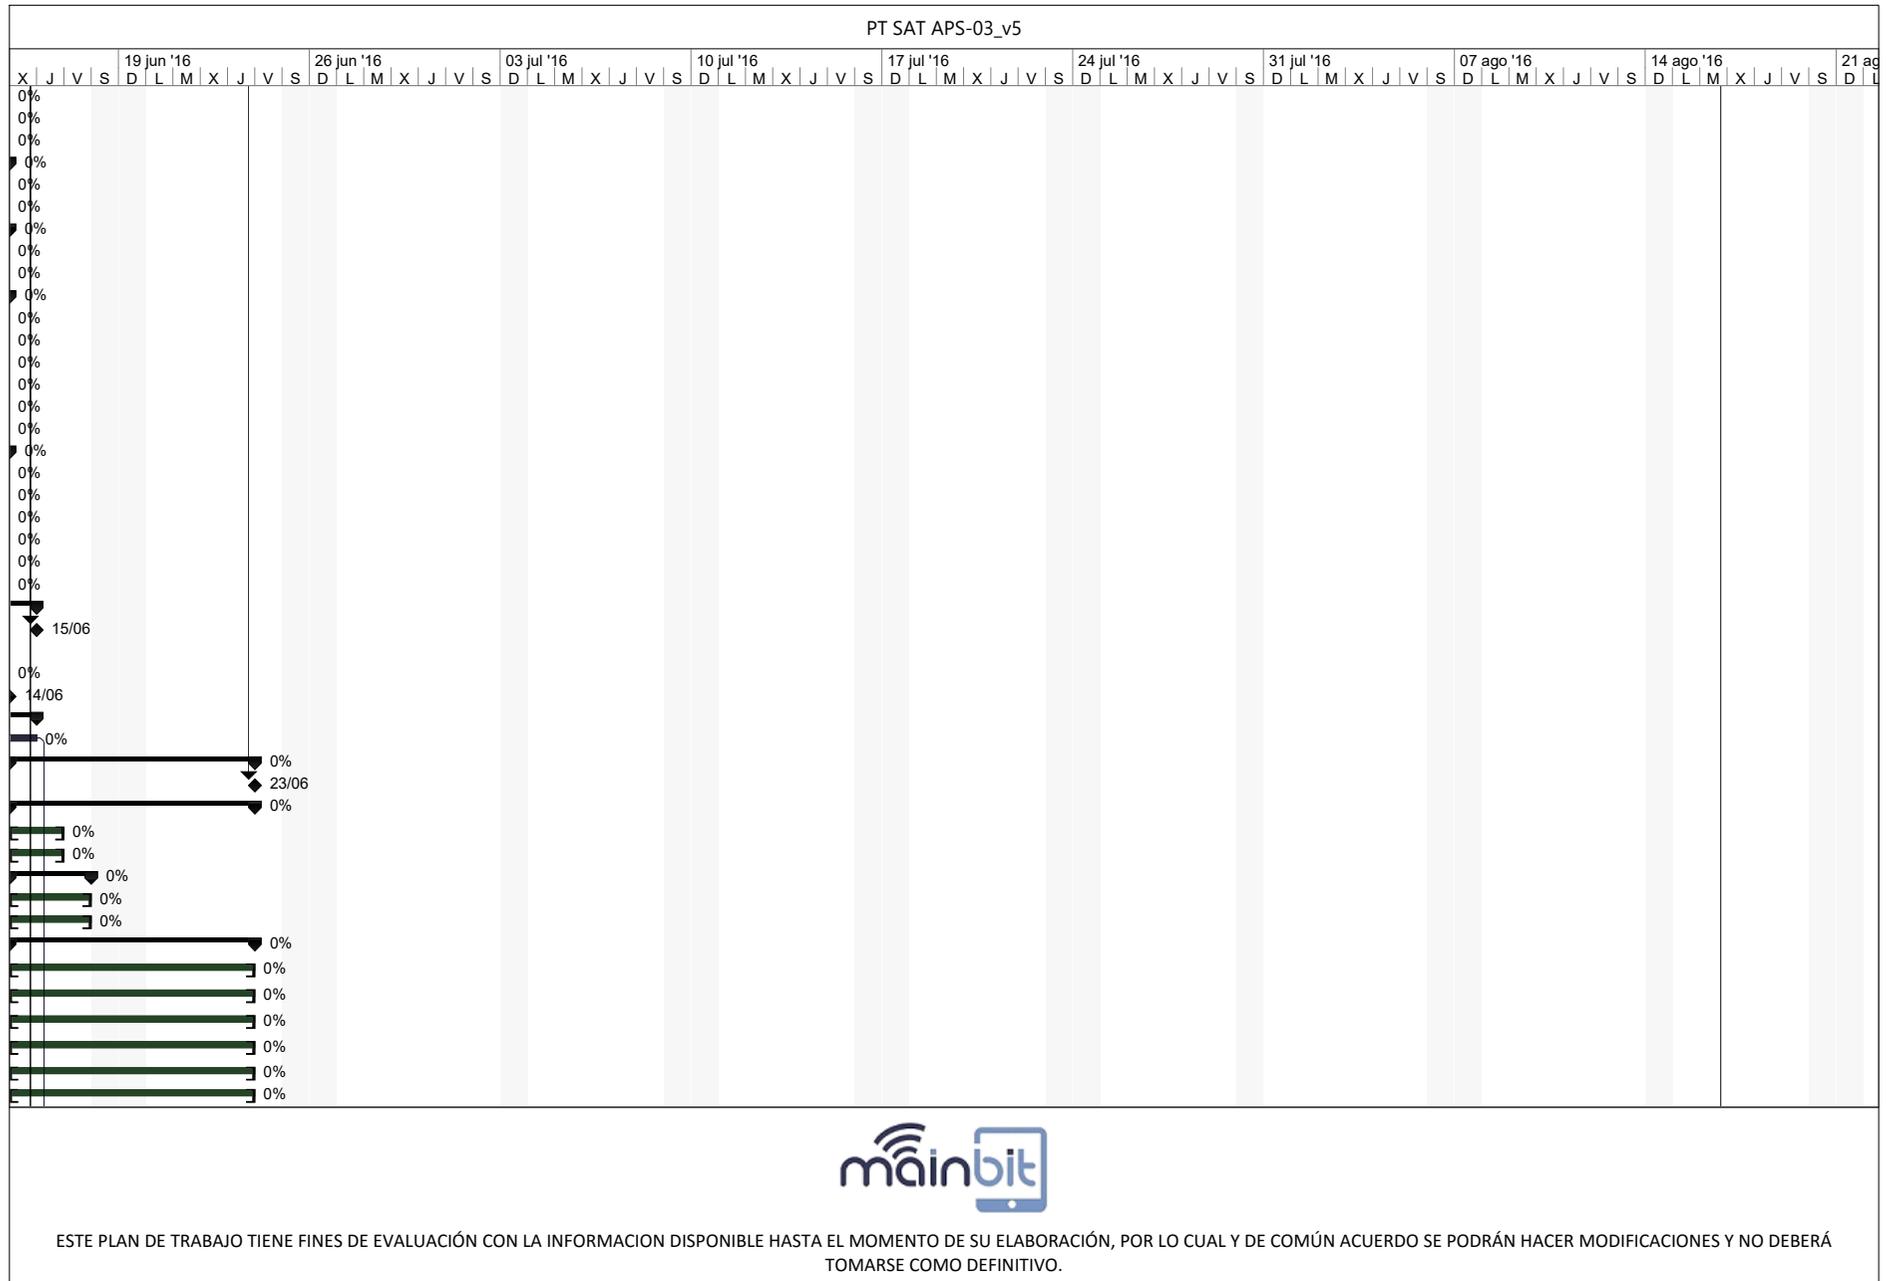

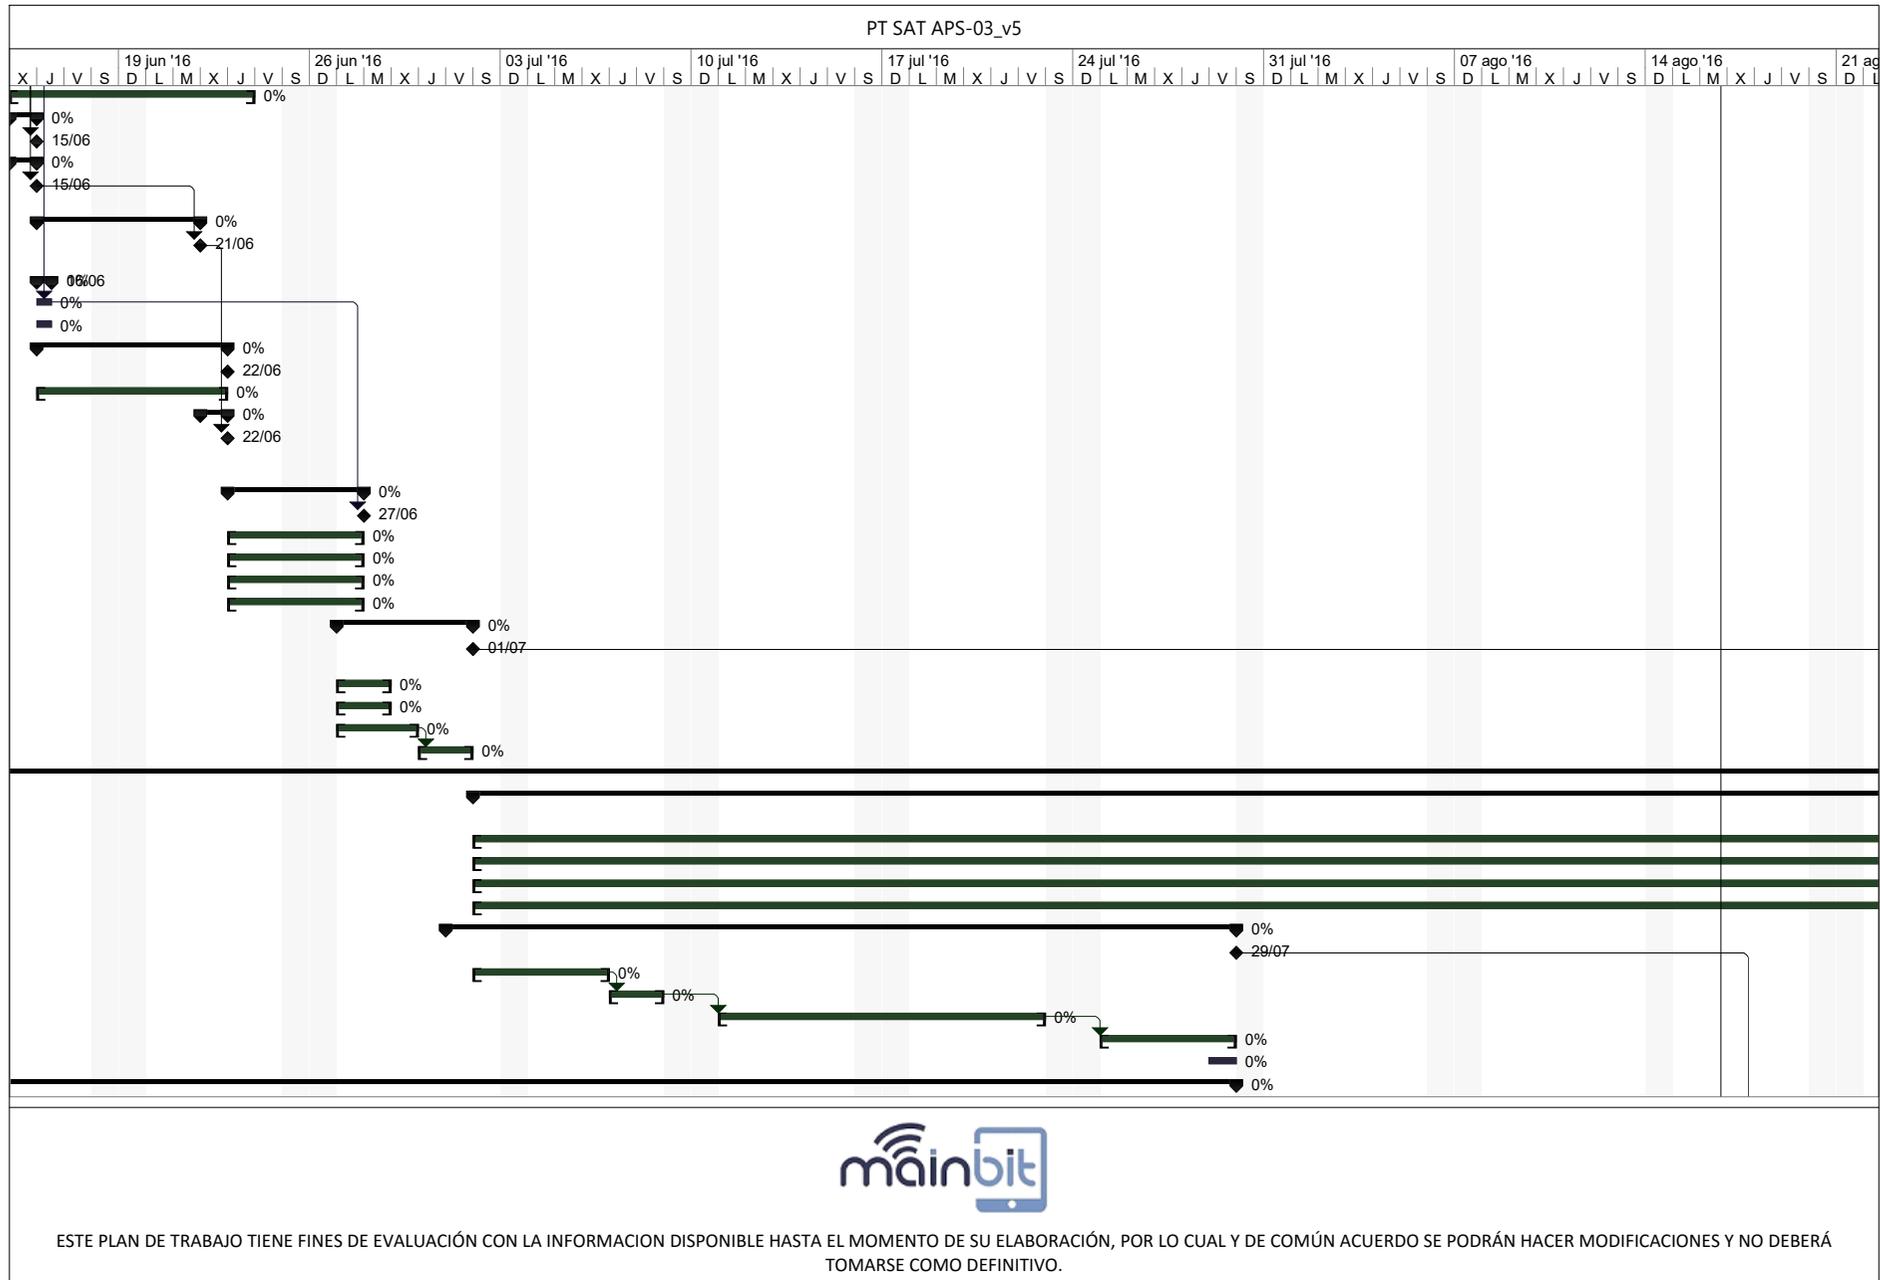


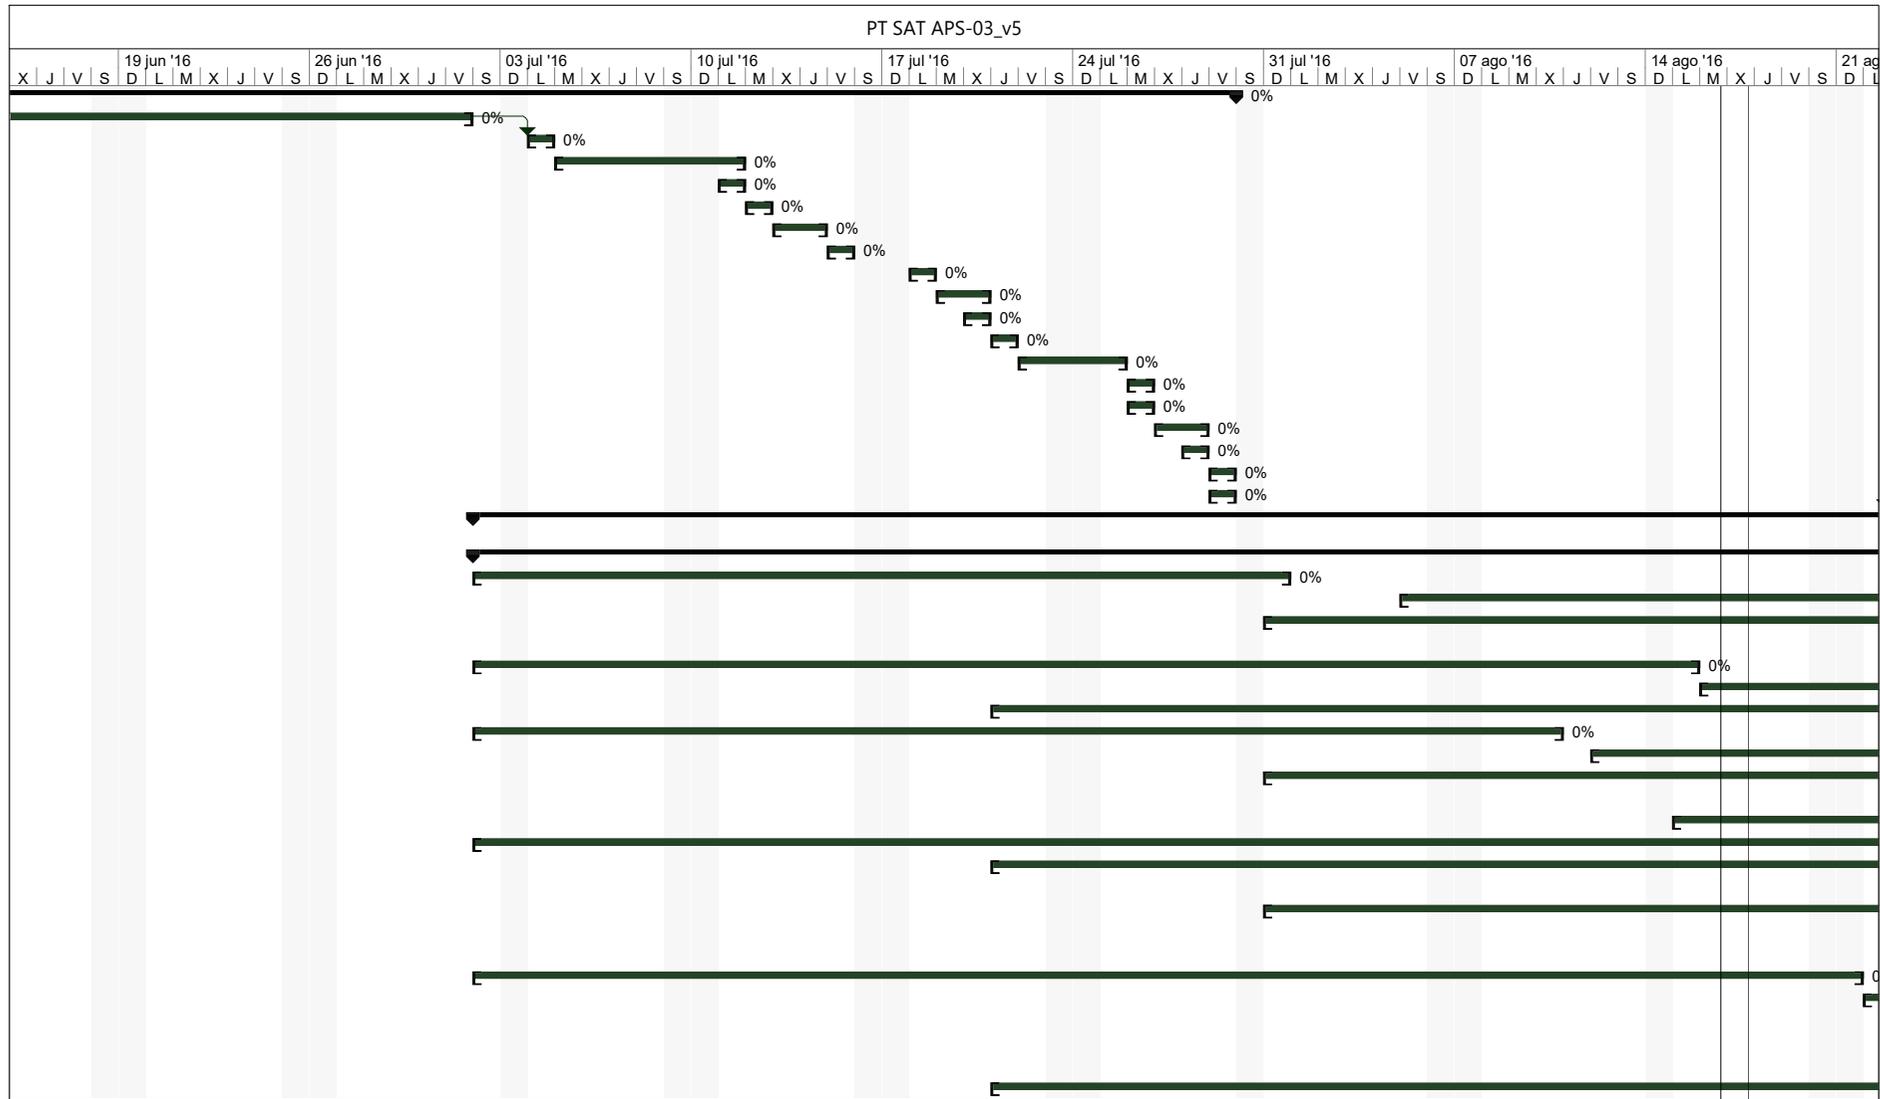


ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

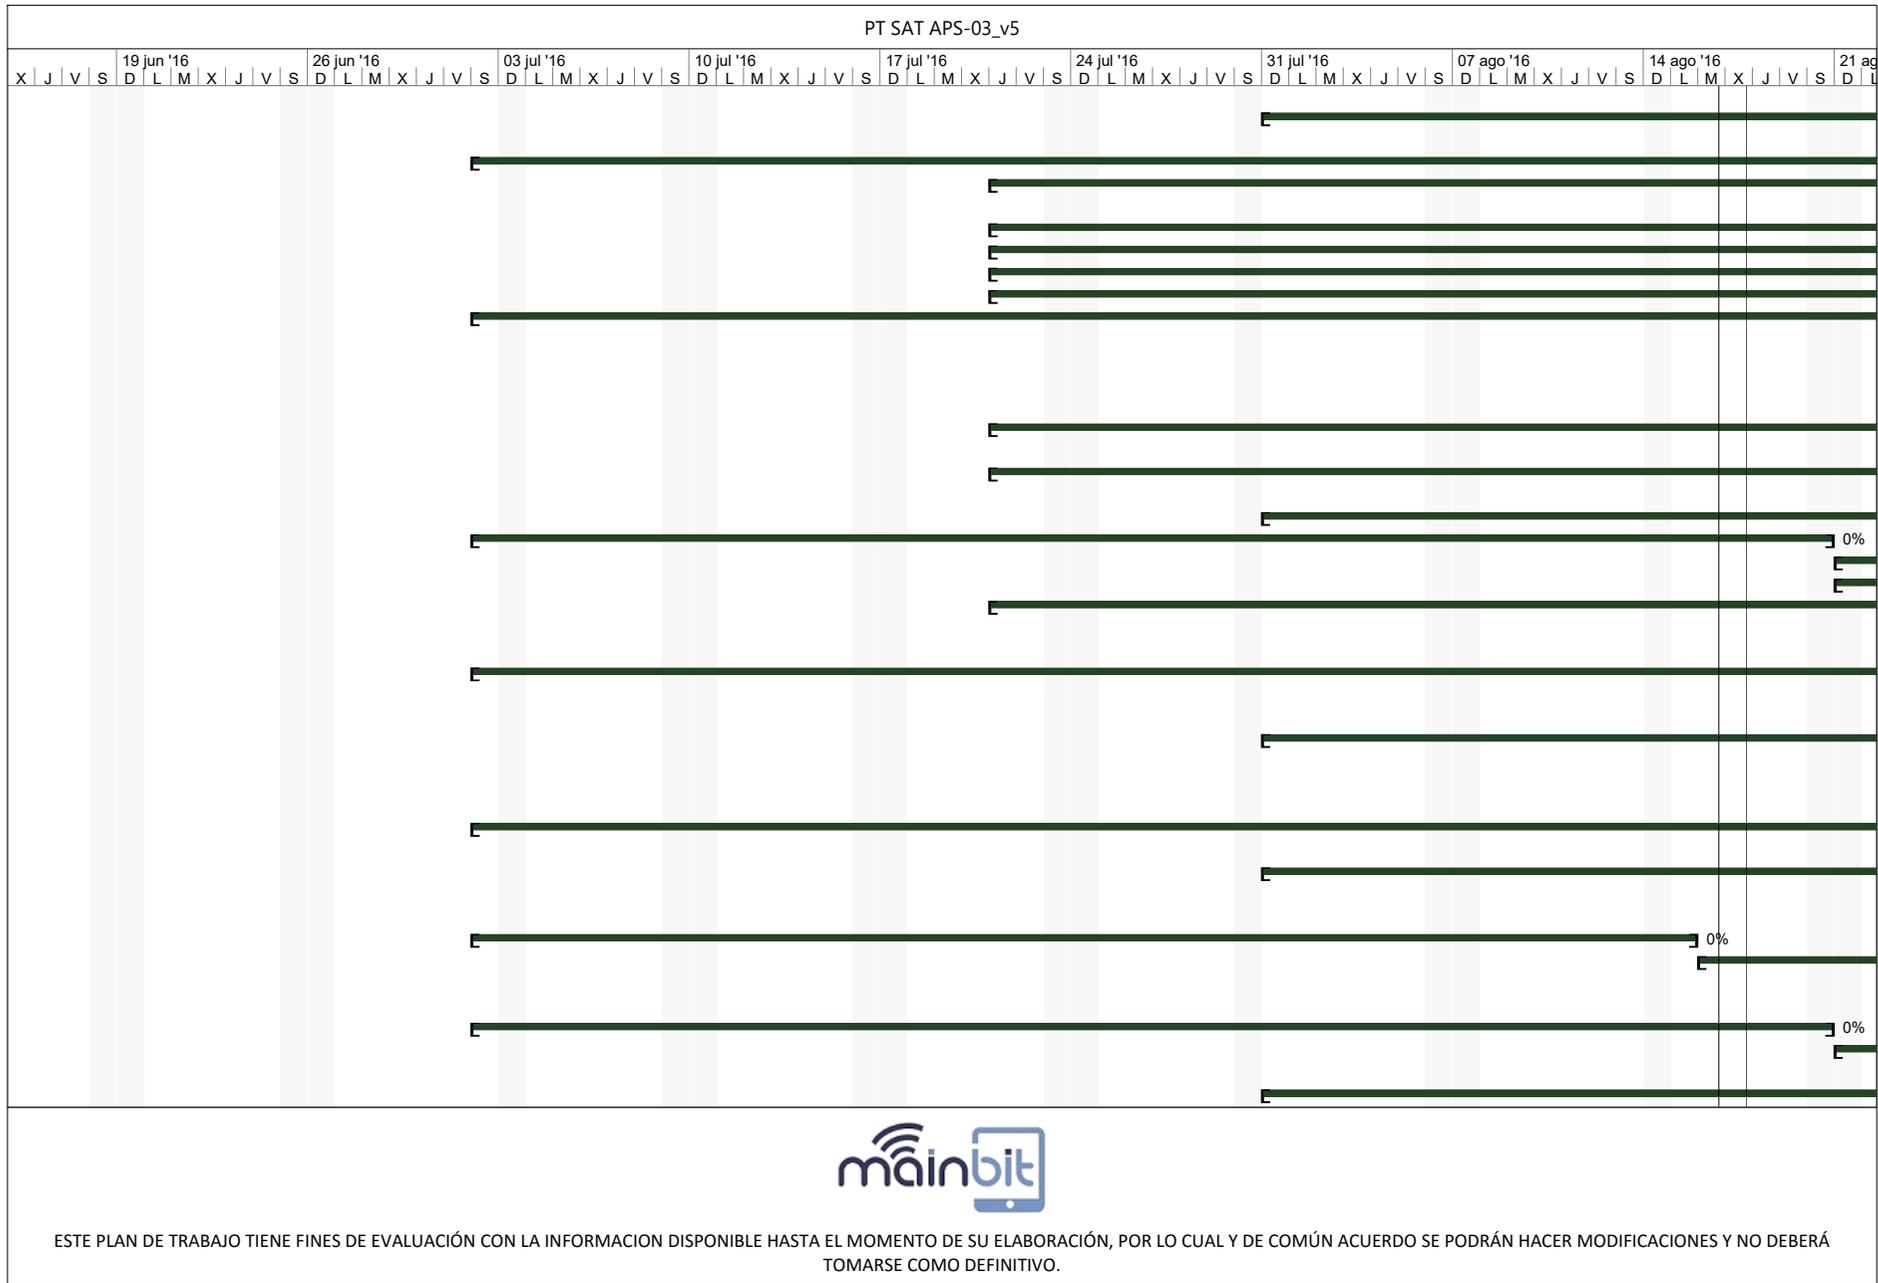

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

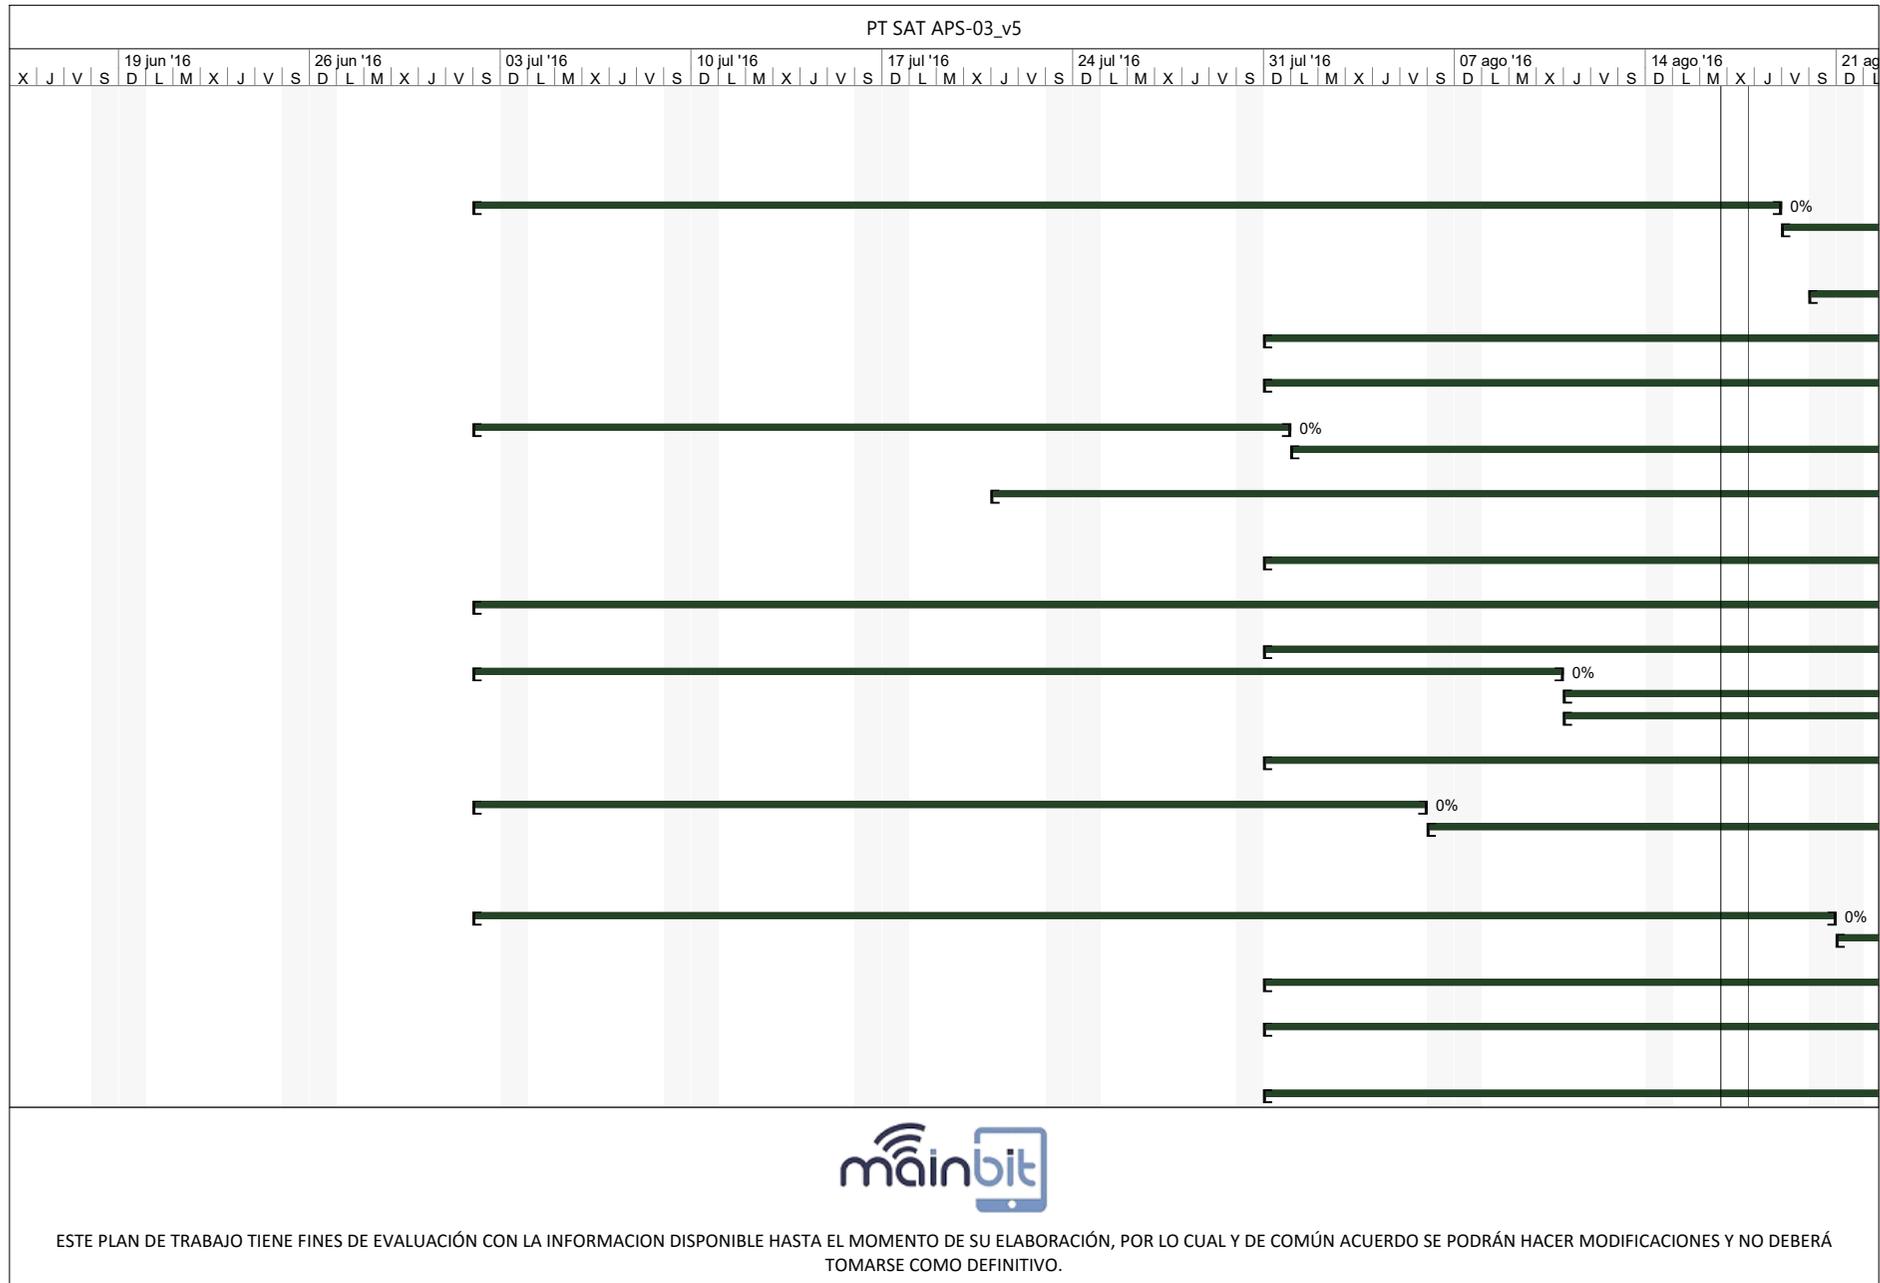

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

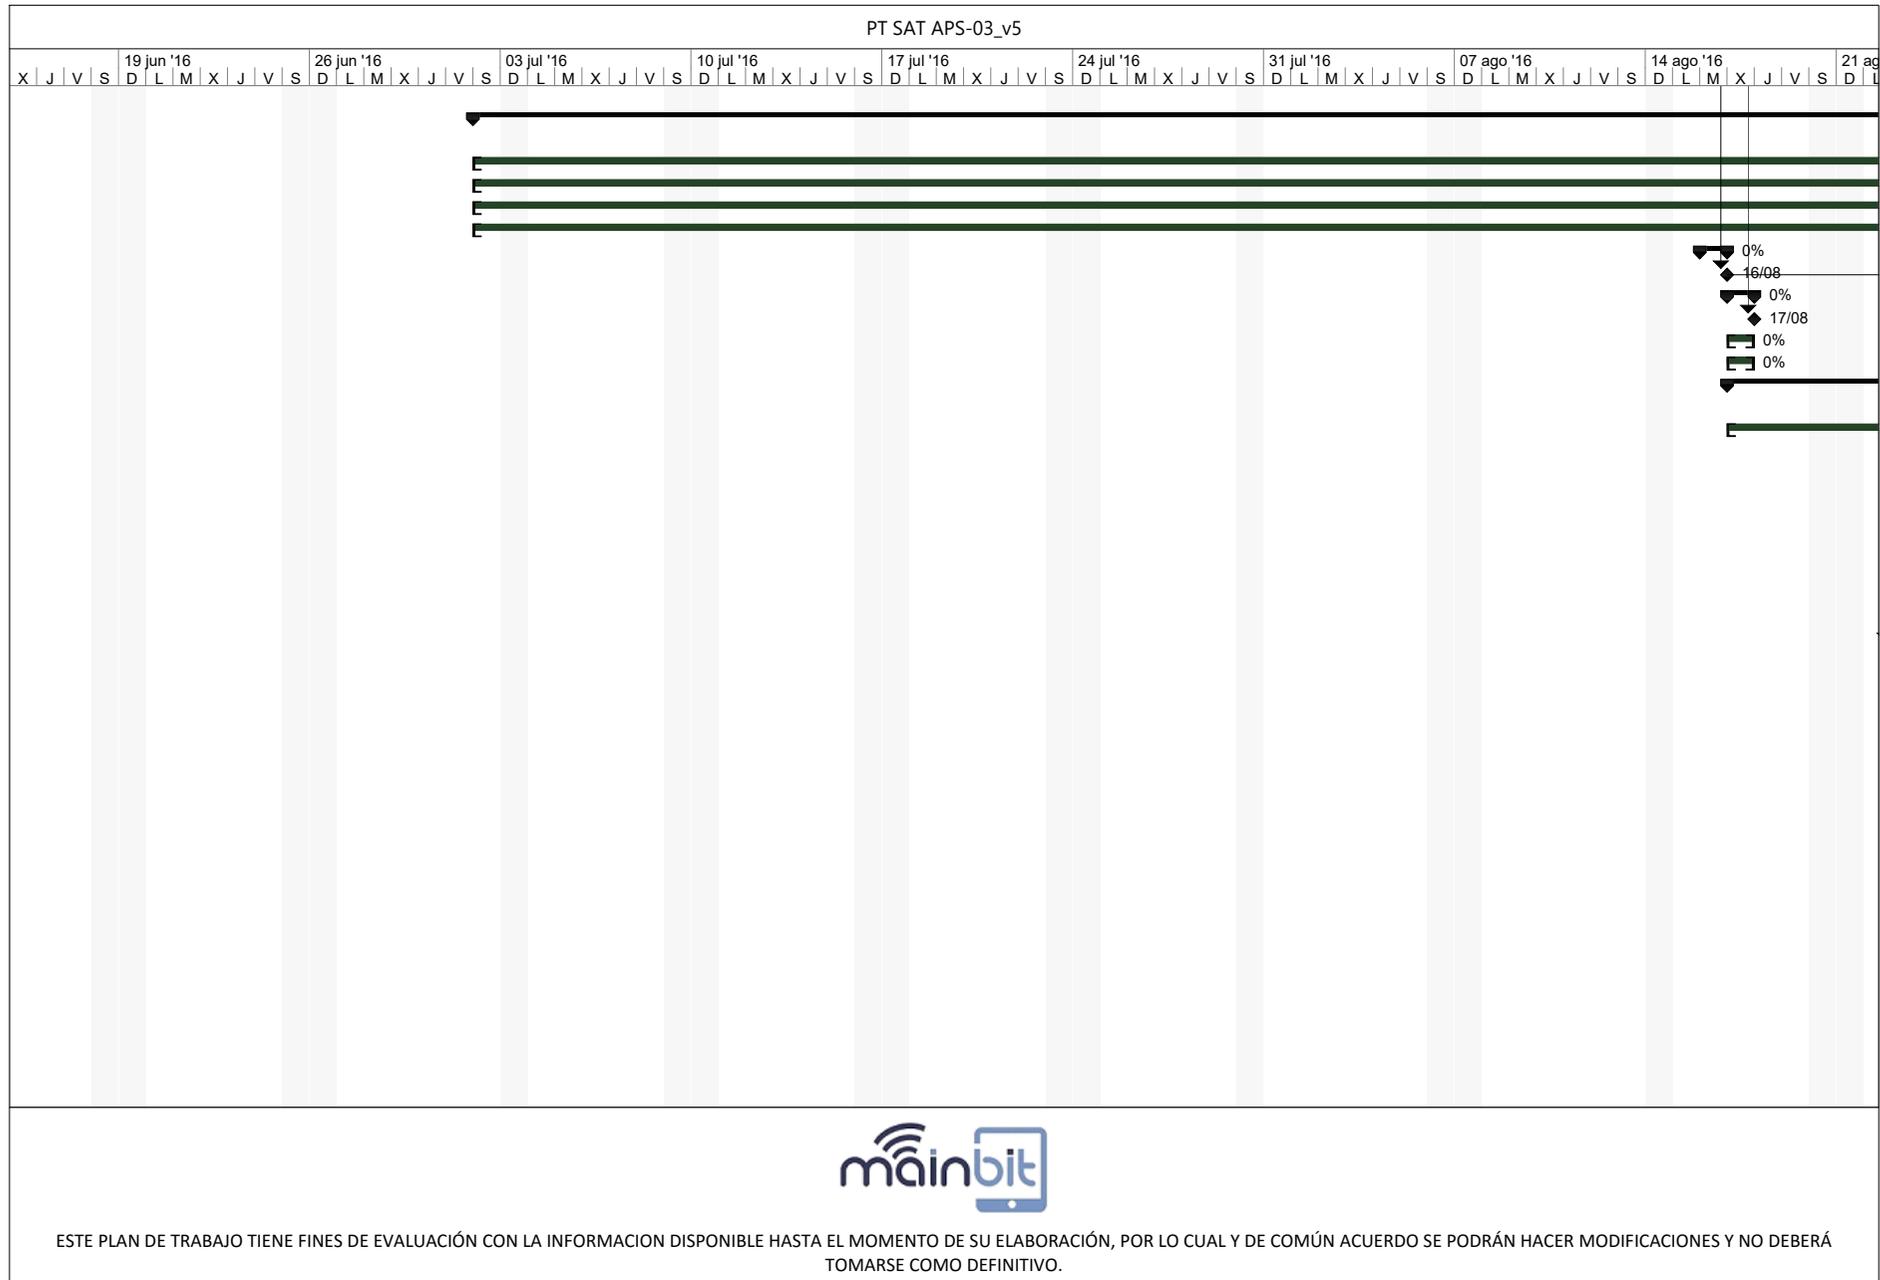

PT SAT APS-03_v5

ago '16	28 ago '16	04 sep '16	11 sep '16	18 sep '16	25 sep '16	02 oct '16	09 oct '16	16 oct '16	23 oct '16
L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive-like mark.


PT SAT APS-03_v5


ago '16	28 ago '16	04 sep '16	11 sep '16	18 sep '16	25 sep '16	02 oct '16	09 oct '16	16 oct '16	23 oct '16
L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S

--	--




ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

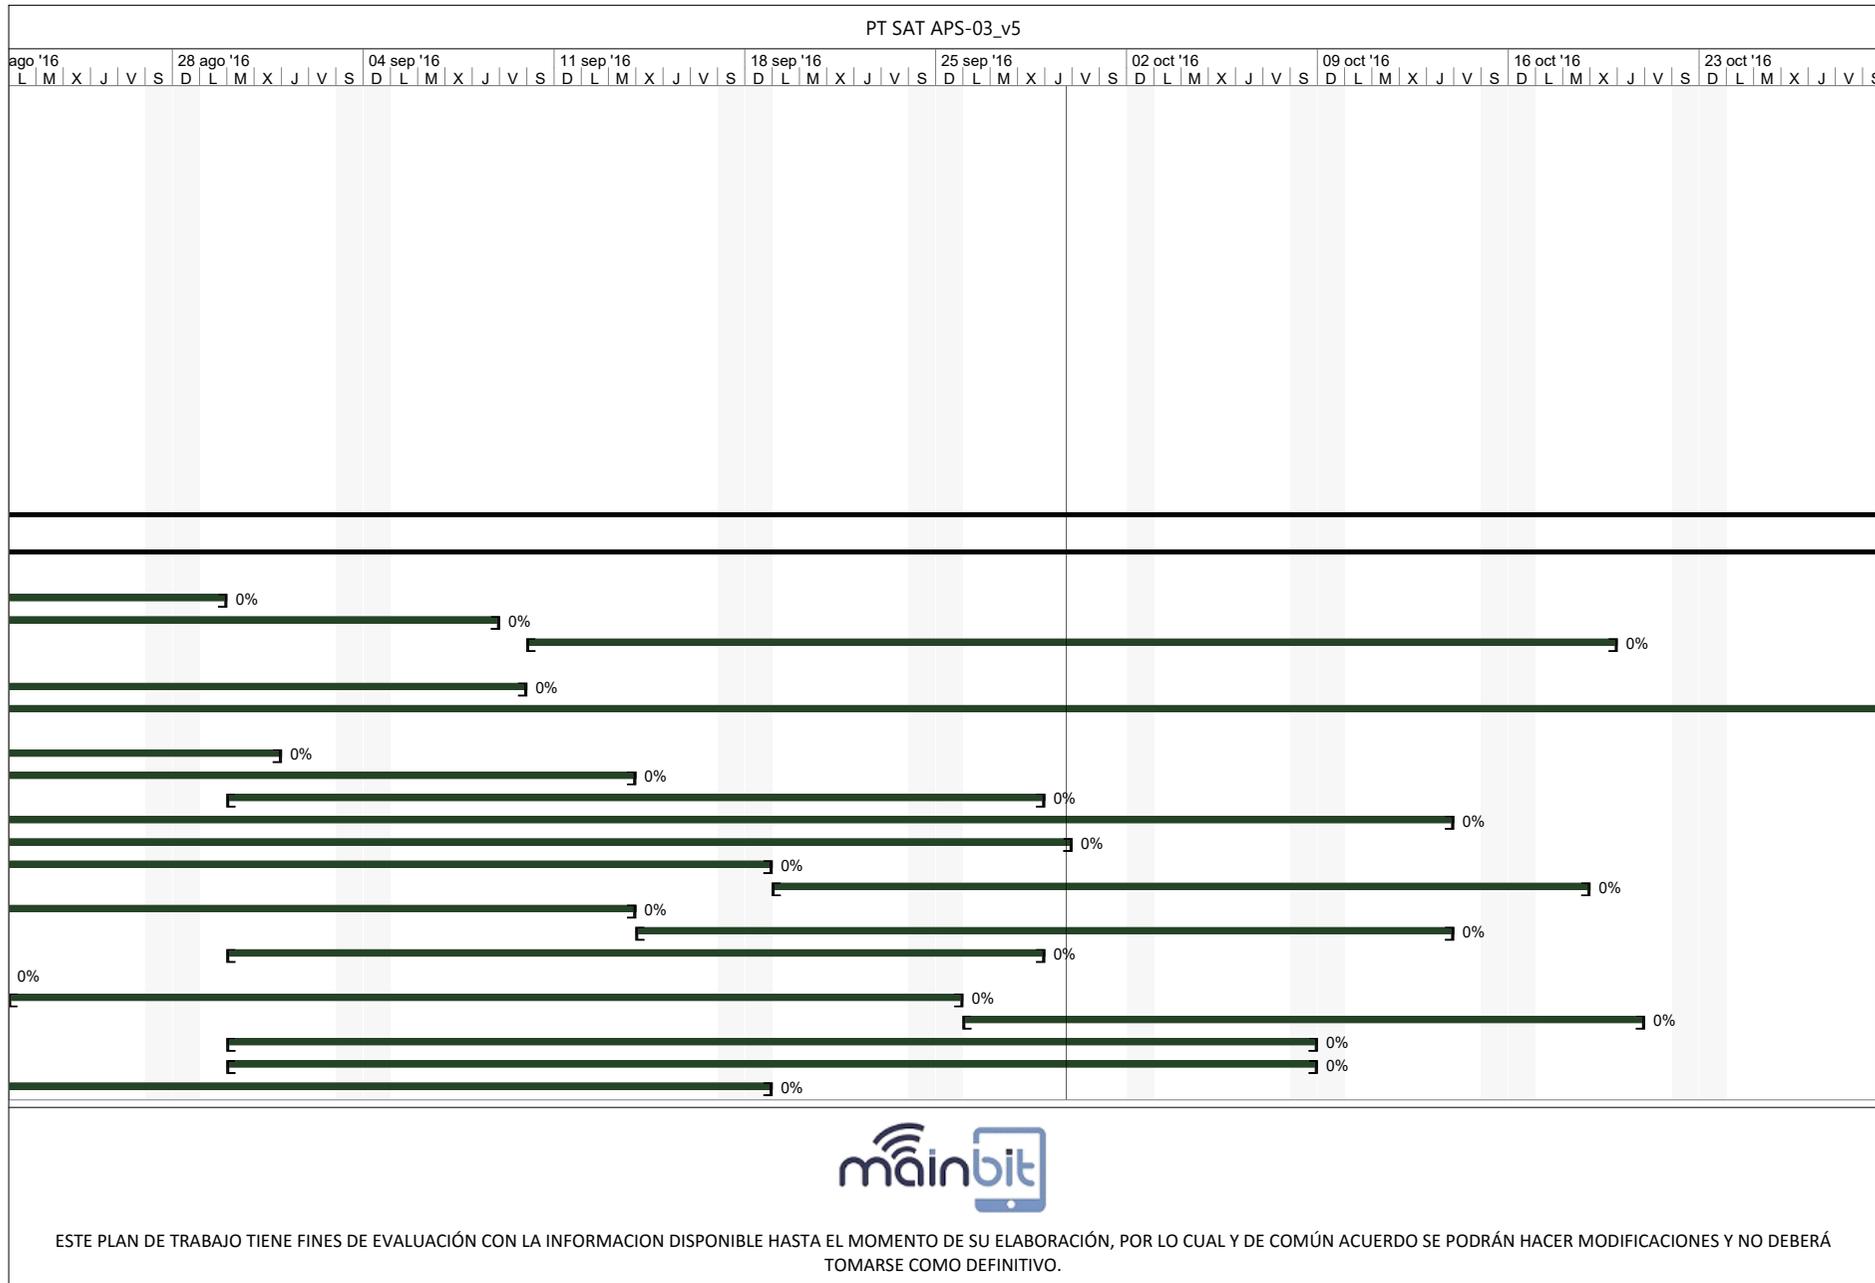


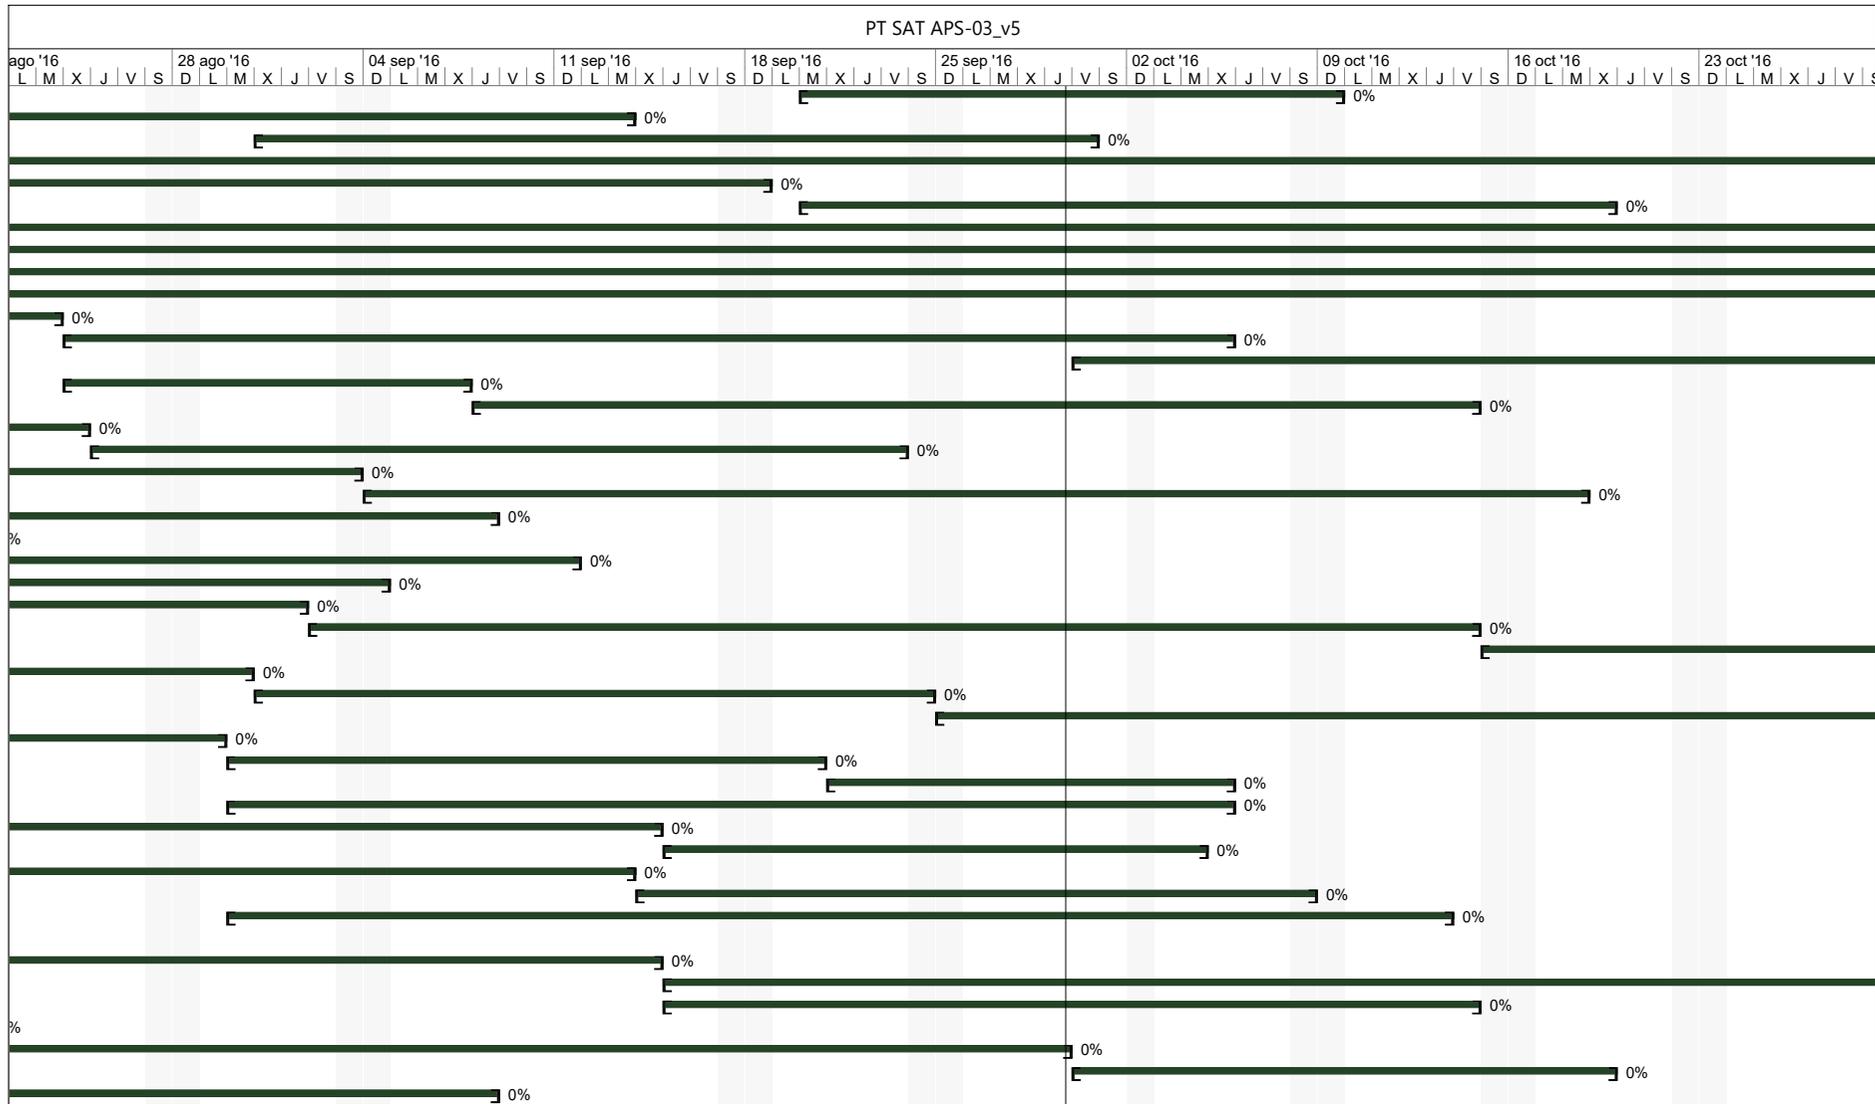ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

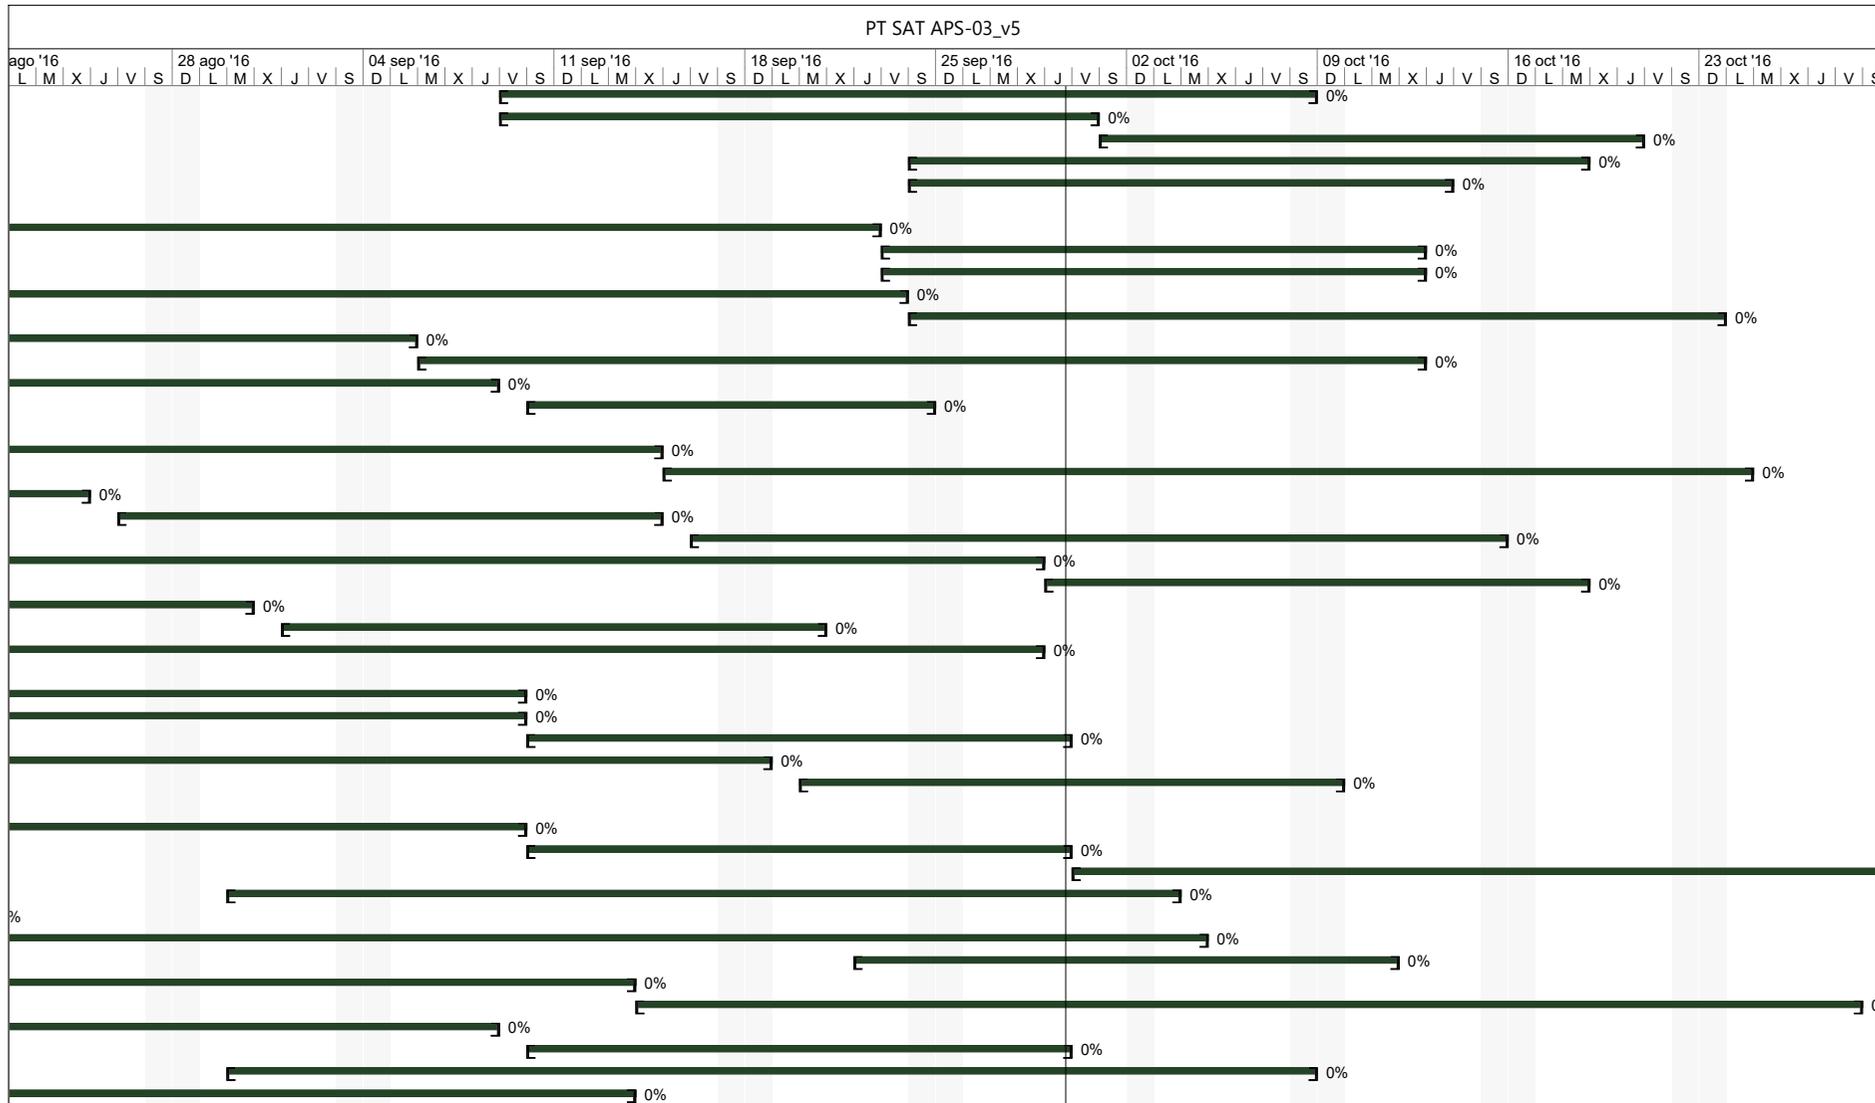

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

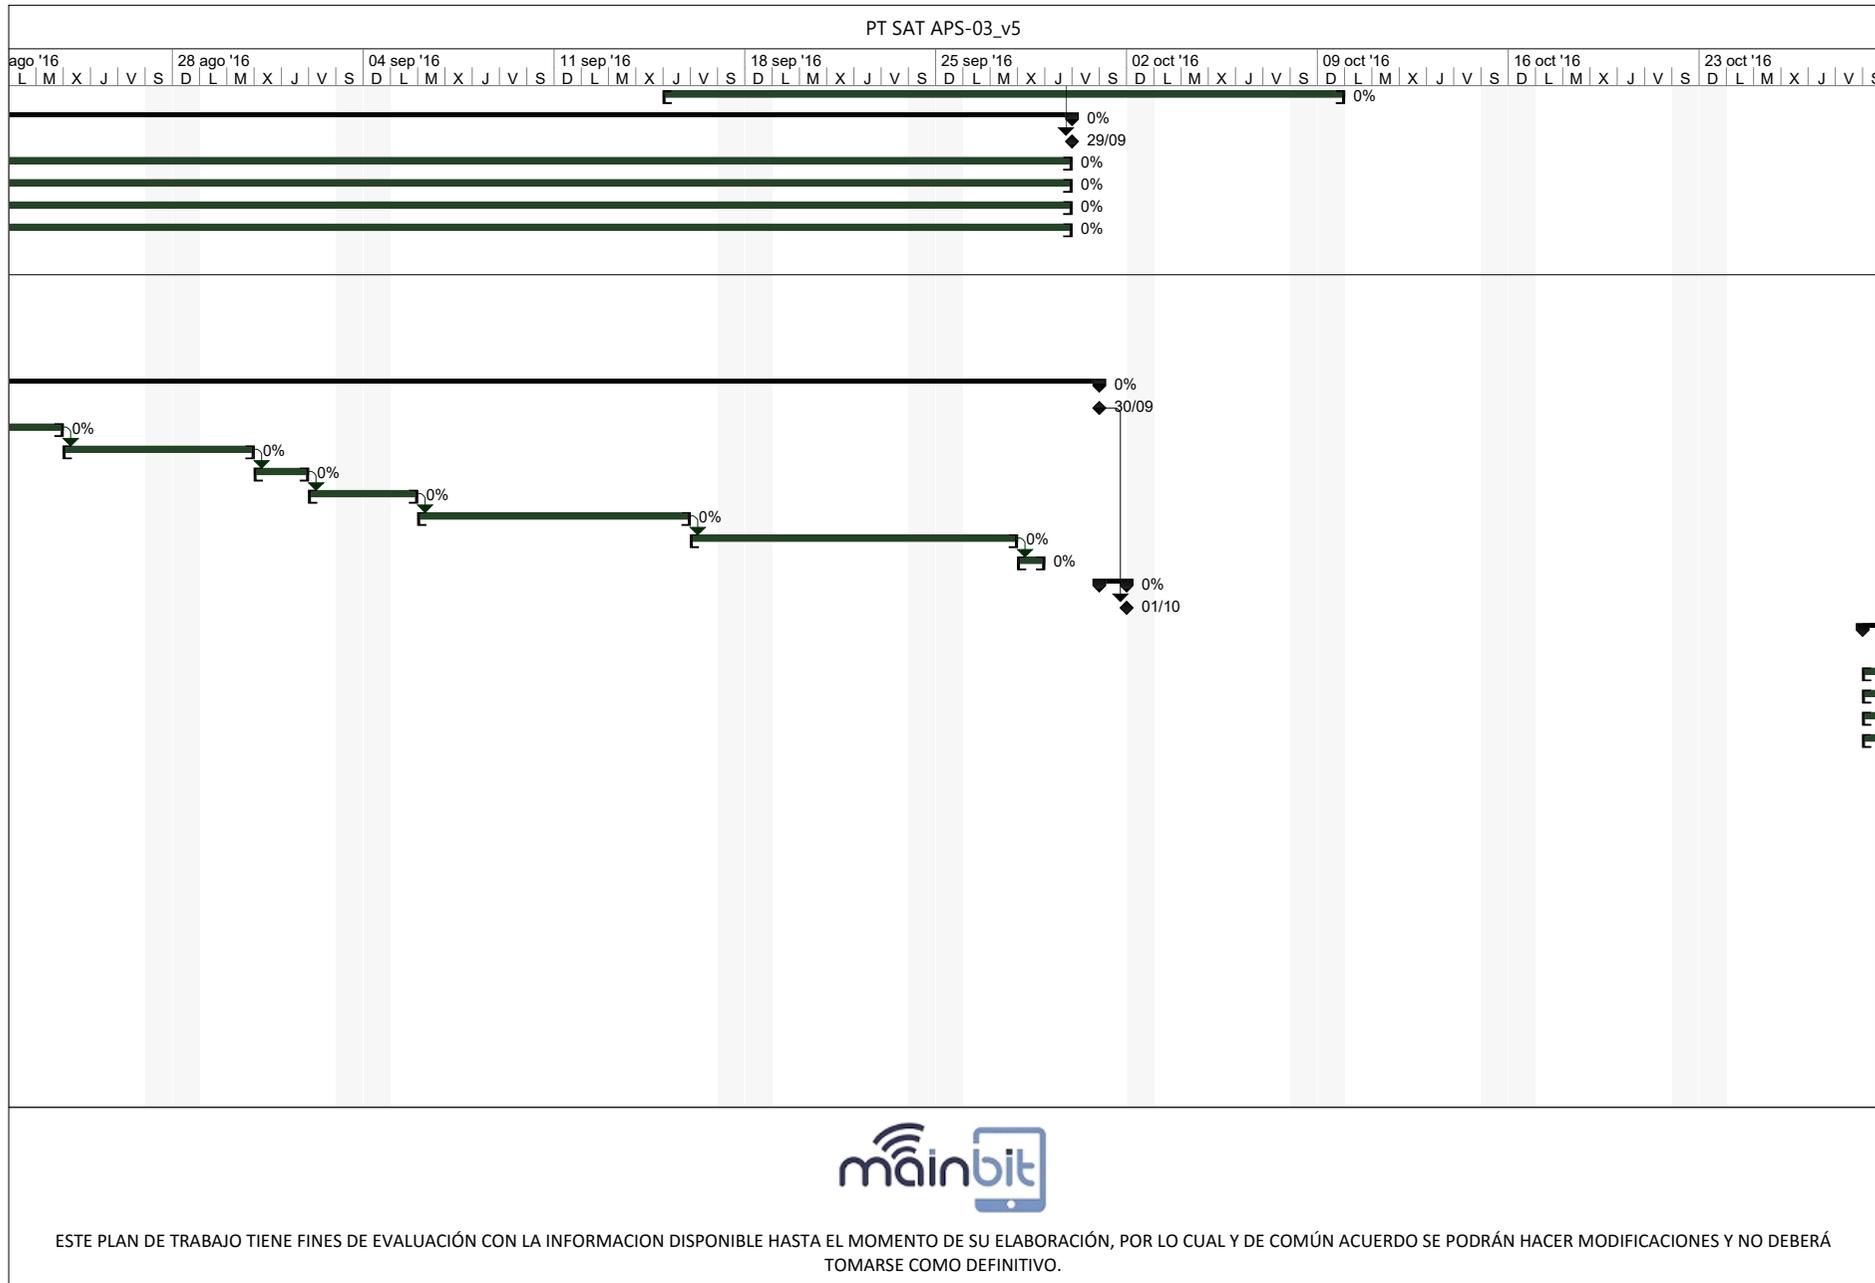

PT SAT APS-03_v5

30 oct '16	06 nov '16	13 nov '16	20 nov '16	27 nov '16	04 dic '16	11 dic '16	18 dic '16	25 dic '16	01 ene '17
S D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S

--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5																																																																						
30 oct '16					06 nov '16					13 nov '16					20 nov '16					27 nov '16					04 dic '16					11 dic '16					18 dic '16					25 dic '16					01 ene '17																									
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S

0%
 0%
 28/10
 0%
 0%
 0%





ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5																																																															
30 oct '16				06 nov '16				13 nov '16				20 nov '16				27 nov '16				04 dic '16				11 dic '16				18 dic '16				25 dic '16				01 ene '17																											
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 10%; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;"> <p>00/10</p> <p>0%</p> <p>0%</p> </div> <div style="width: 90%;"></div> </div>																																																															



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

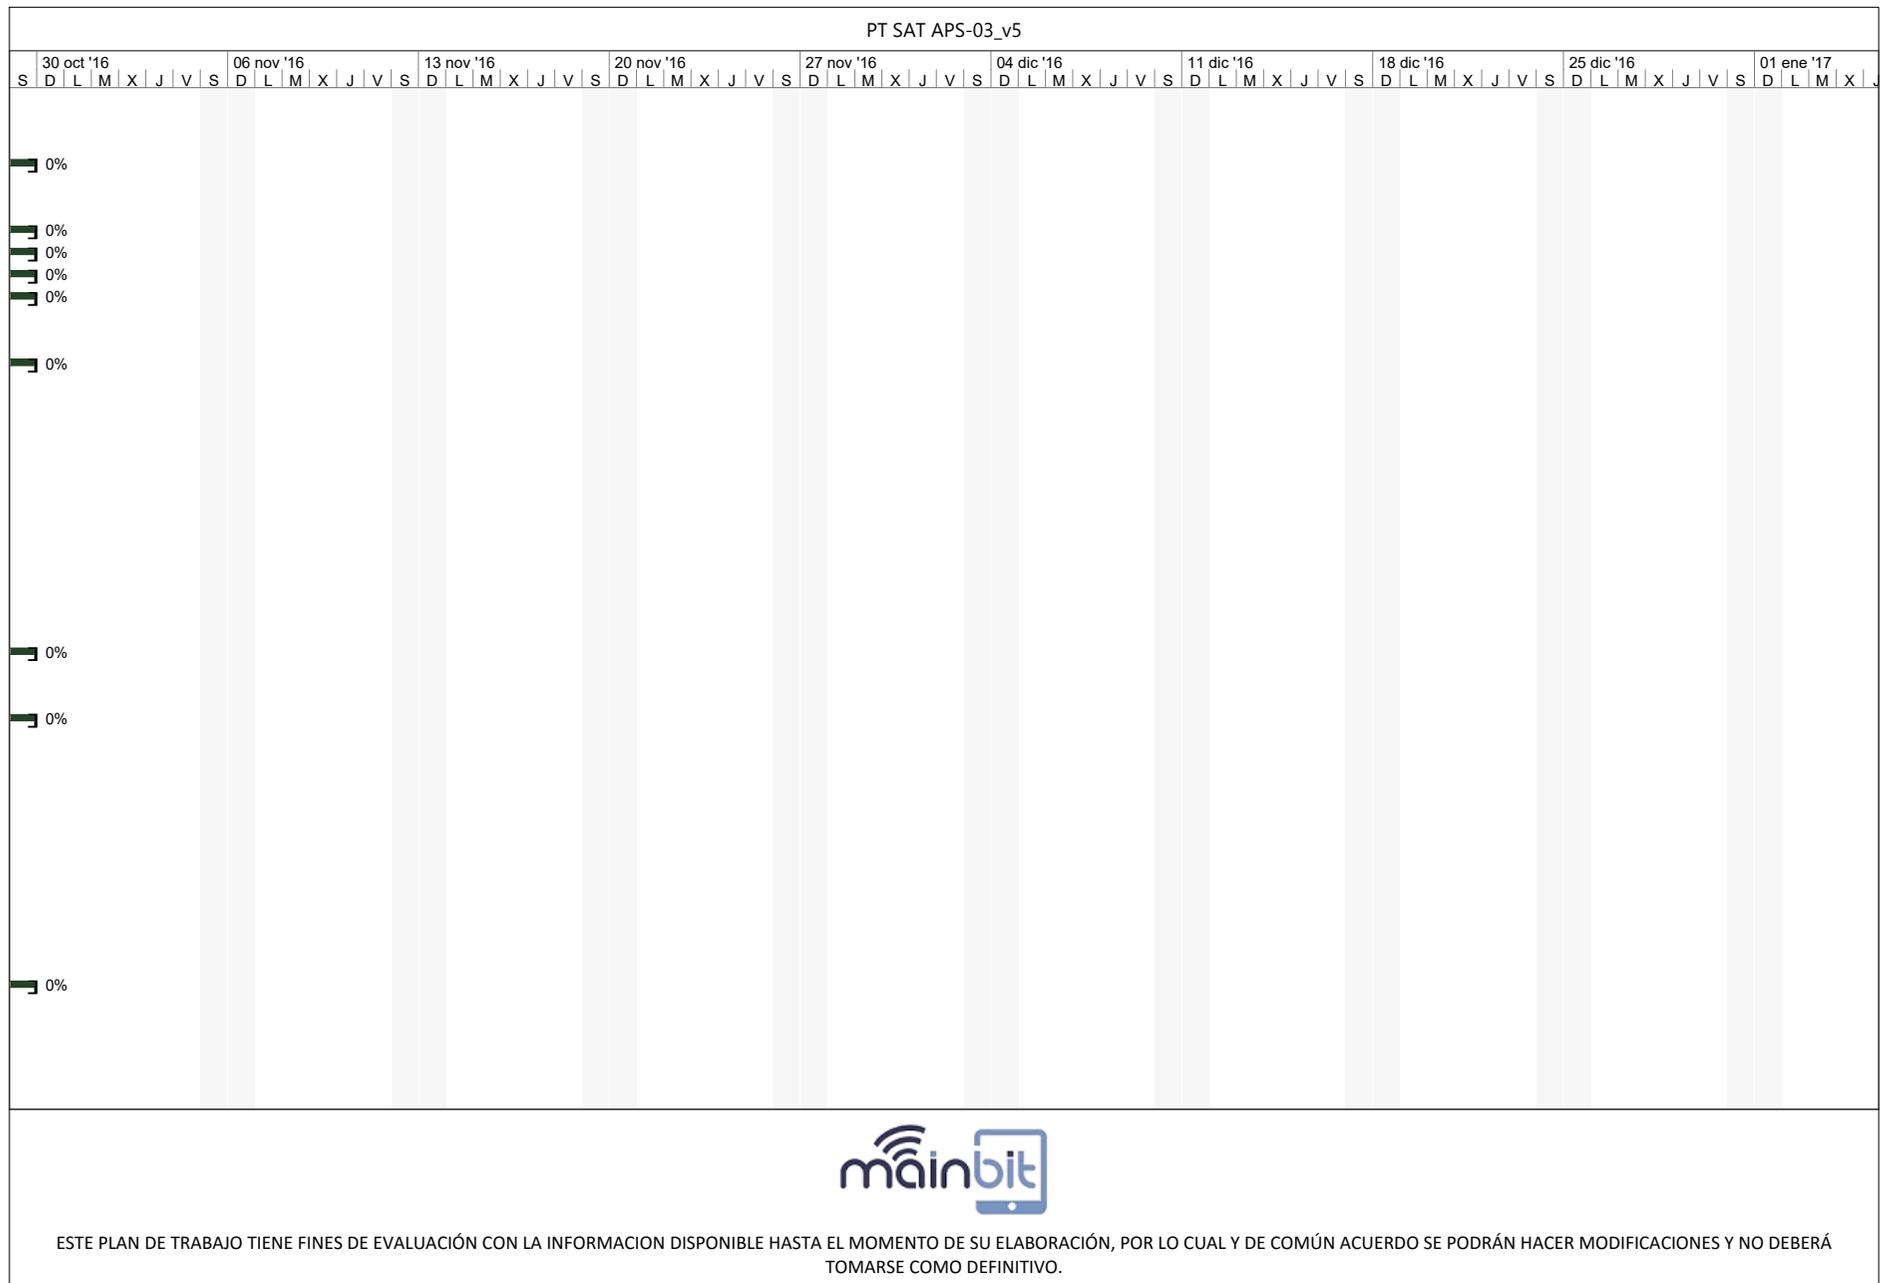

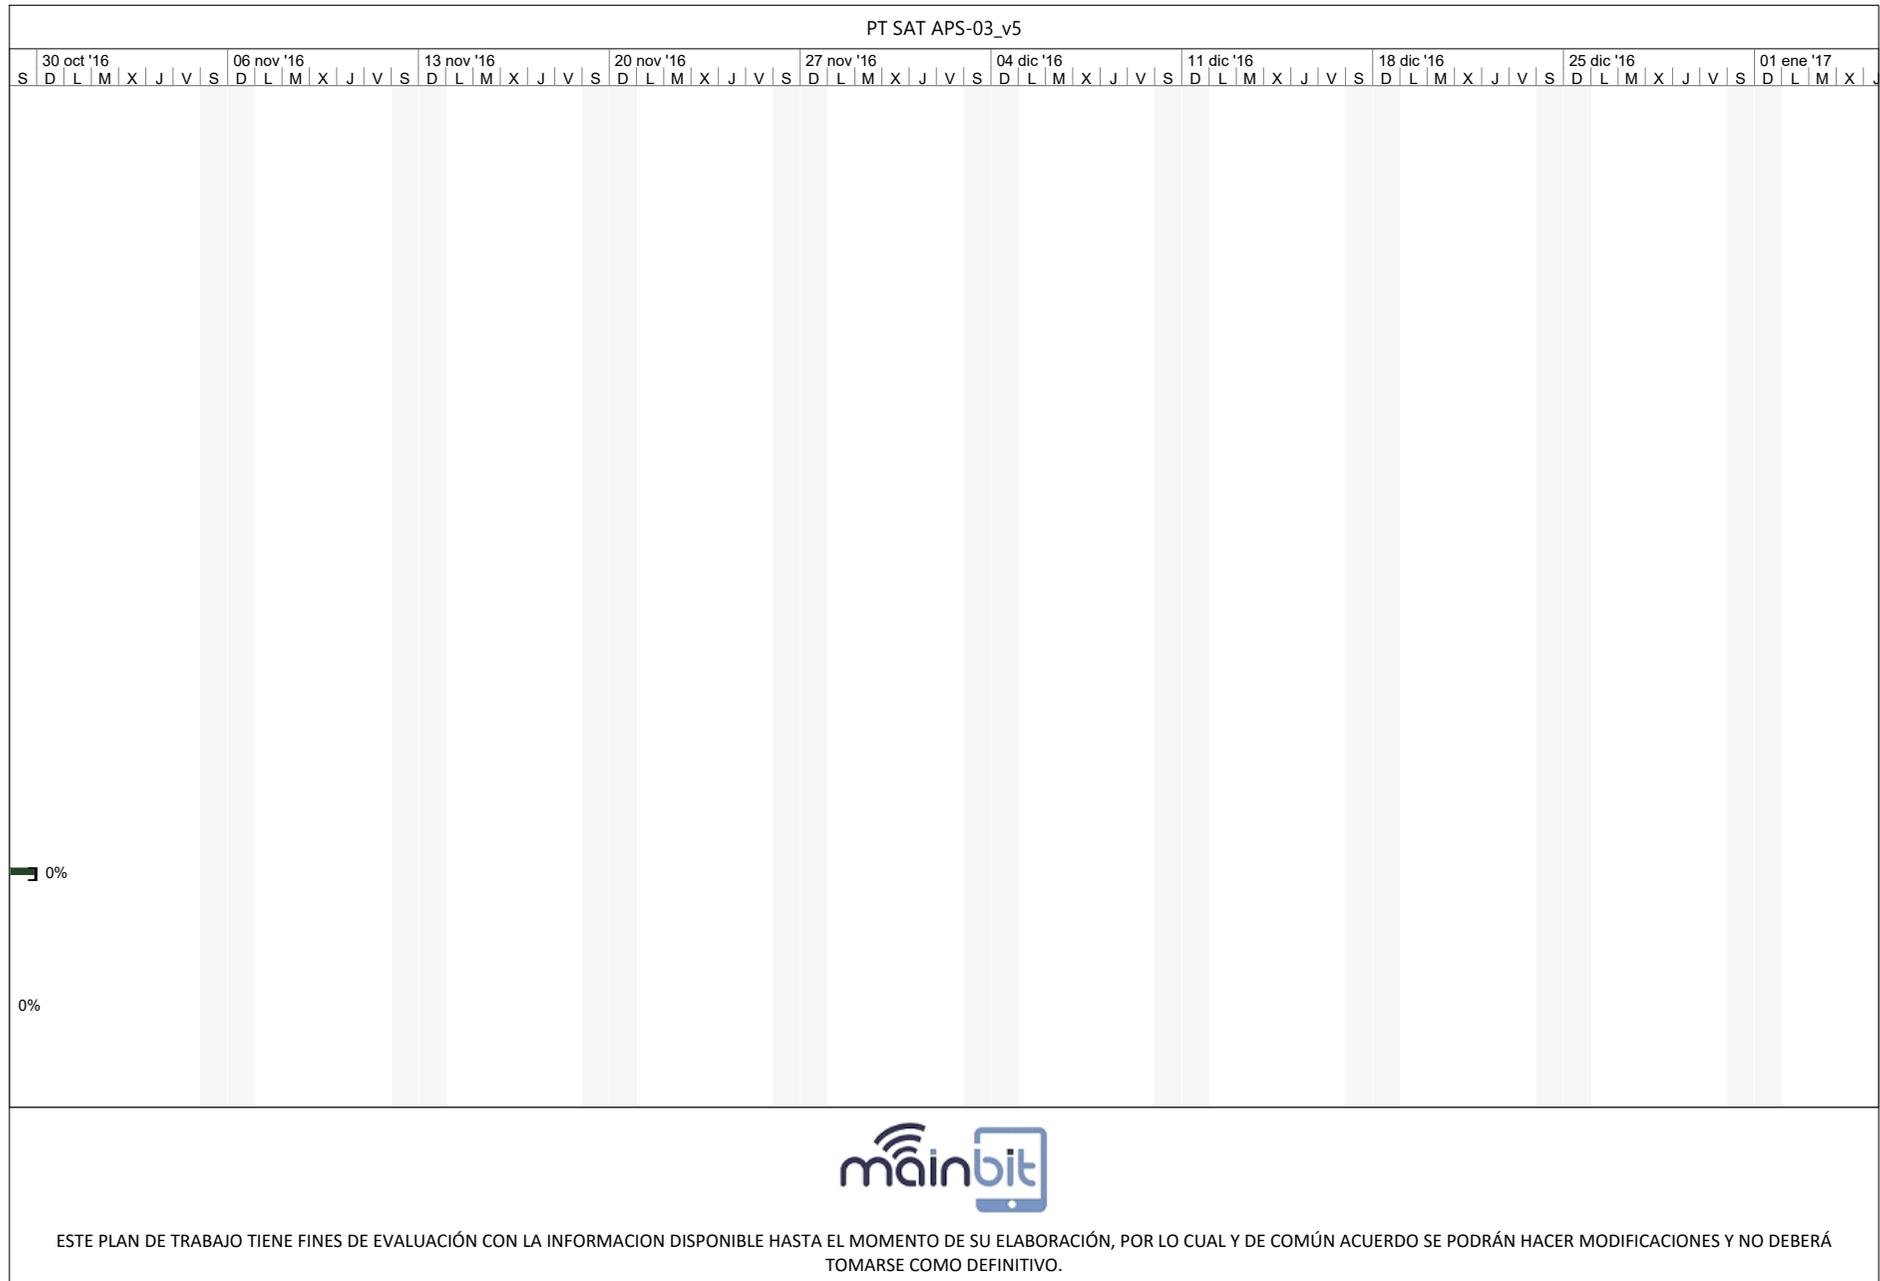PT SAT APS-03_v5

30 oct '16					06 nov '16					13 nov '16					20 nov '16					27 nov '16					04 dic '16					11 dic '16					18 dic '16					25 dic '16					01 ene '17											
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S

- 0%
- 29/10
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5

S	30 oct '16	06 nov '16	13 nov '16	20 nov '16	27 nov '16	04 dic '16	11 dic '16	18 dic '16	25 dic '16	01 ene '17																																						
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5

S	30 oct '16	06 nov '16	13 nov '16	20 nov '16	27 nov '16	04 dic '16	11 dic '16	18 dic '16	25 dic '16	01 ene '17
	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S

[Empty Work Area]										
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5																																																																																																							
	08 ene '17			15 ene '17			22 ene '17			29 ene '17			05 feb '17			12 feb '17			19 feb '17			26 feb '17			05 mar '17			12 mar '17																																																																											
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5																																	
08 ene '17			15 ene '17			22 ene '17			29 ene '17			05 feb '17			12 feb '17			19 feb '17			26 feb '17			05 mar '17			12 mar '17						
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.

PT SAT APS-03_v5

08 ene '17			15 ene '17			22 ene '17			29 ene '17			05 feb '17			12 feb '17			19 feb '17			26 feb '17			05 mar '17			12 mar '17													
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5											
'17	19 mar '17	26 mar '17	02 abr '17	09 abr '17	16 abr '17	23 abr '17	30 abr '17	07 may '17	14 may '17		2
M	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
X	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
J	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
S	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5

'17	19 mar '17	26 mar '17	02 abr '17	09 abr '17	16 abr '17	23 abr '17	30 abr '17	07 may '17	14 may '17	2
M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5											
'17	19 mar '17	26 mar '17	02 abr '17	09 abr '17	16 abr '17	23 abr '17	30 abr '17	07 may '17	14 may '17		2
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5											
21 may '17	28 may '17	04 jun '17	11 jun '17	18 jun '17	25 jun '17	02 jul '17	09 jul '17	16 jul '17	23 jul '17		
D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5

21 may '17	28 may '17	04 jun '17	11 jun '17	18 jun '17	25 jun '17	02 jul '17	09 jul '17	16 jul '17	23 jul '17
D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name.

PT SAT APS-03_v5

21 may '17	28 may '17	04 jun '17	11 jun '17	18 jun '17	25 jun '17	02 jul '17	09 jul '17	16 jul '17	23 jul '17
D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S
This area contains a large grid of light gray vertical bars, representing a Gantt chart or resource allocation plan, which is mostly empty.									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

A vertical handwritten signature in blue ink, located on the right side of the page near the bottom.

PT SAT APS-03_v5																																		
V	S	30 jul '17			06 ago '17			13 ago '17			20 ago '17			27 ago '17			03 sep '17			10 sep '17			17 sep '17			24 sep '17			01 oct '17					
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5

	30 jul '17		06 ago '17		13 ago '17		20 ago '17		27 ago '17		03 sep '17		10 sep '17		17 sep '17		24 sep '17		01 oct '17						
V S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5

X J V S	08 oct '17 D L M X J V S	15 oct '17 D L M X J V S	22 oct '17 D L M X J V S	29 oct '17 D L M X J V S	05 nov '17 D L M X J V S	12 nov '17 D L M X J V S	19 nov '17 D L M X J V S	26 nov '17 D L M X J V S	03 dic '17 D L M X J V S	10 dic '17 D L M X J V S
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5																																																																		
08 oct '17			15 oct '17			22 oct '17			29 oct '17			05 nov '17			12 nov '17			19 nov '17			26 nov '17			03 dic '17			10 dic '17																																							
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5

dic '17	17 dic '17	24 dic '17	31 dic '17	07 ene '18	14 ene '18	21 ene '18	28 ene '18	04 feb '18	11 feb '18
L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5										
dic '17	17 dic '17	24 dic '17	31 dic '17	07 ene '18	14 ene '18	21 ene '18	28 ene '18	04 feb '18	11 feb '18	
L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5

dic '17	17 dic '17	24 dic '17	31 dic '17	07 ene '18	14 ene '18	21 ene '18	28 ene '18	04 feb '18	11 feb '18
L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5																																																																							
18 feb '18			25 feb '18			04 mar '18			11 mar '18			18 mar '18			25 mar '18			01 abr '18			08 abr '18			15 abr '18			22 abr '18																																												
S	D	L	M	X	J	V	S	S	D	L	M	X	J	V	S	S	D	L	M	X	J	V	S	S	D	L	M	X	J	V	S	S	D	L	M	X	J	V	S	S	D	L	M	X	J	V	S	S	D	L	M	X	J	V	S	S	D	L	M	X	J	V	S	S	D	L	M	X	J	V	S



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5

18 feb '18					25 feb '18					04 mar '18					11 mar '18					18 mar '18					25 mar '18					01 abr '18					08 abr '18					15 abr '18					22 abr '18											
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5																																																										
29 abr '18			06 may '18			13 may '18			20 may '18			27 may '18			03 jun '18			10 jun '18			17 jun '18			24 jun '18			01 jul '18																															
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5

J	V	S	29 abr '18			06 may '18			13 may '18			20 may '18			27 may '18			03 jun '18			10 jun '18			17 jun '18			24 jun '18			01 jul '18									
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S		



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

[Handwritten signature]

PT SAT APS-03_v5																																												
J	V	S	29 abr '18			06 may '18			13 may '18			20 may '18			27 may '18			03 jun '18			10 jun '18			17 jun '18			24 jun '18			01 jul '18														
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5																																								
8	08 jul '18		15 jul '18		22 jul '18		29 jul '18		05 ago '18		12 ago '18		19 ago '18		26 ago '18		02 sep '18		0																					
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5																											
8	08 jul '18		15 jul '18		22 jul '18		29 jul '18		05 ago '18		12 ago '18		19 ago '18		26 ago '18		02 sep '18		0								
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5																																	
8	08 jul '18		15 jul '18		22 jul '18		29 jul '18		05 ago '18		12 ago '18		19 ago '18		26 ago '18		02 sep '18		0														
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5

09 sep '18	16 sep '18	23 sep '18	30 sep '18	07 oct '18	14 oct '18	21 oct '18	28 oct '18	04 nov '18	11 nov '18
D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5

09 sep '18	16 sep '18	23 sep '18	30 sep '18	07 oct '18	14 oct '18	21 oct '18	28 oct '18	04 nov '18	11 nov '18
D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5

V S	18 nov '18	25 nov '18	02 dic '18	09 dic '18	16 dic '18	23 dic '18	30 dic '18	06 ene '19	13 ene '19	20 ene '19
D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.


PT SAT APS-03_v5

	27 ene '19	03 feb '19	10 feb '19	17 feb '19	24 feb '19	03 mar '19	10 mar '19	17 mar '19	24 mar '19	31 mar '19
X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

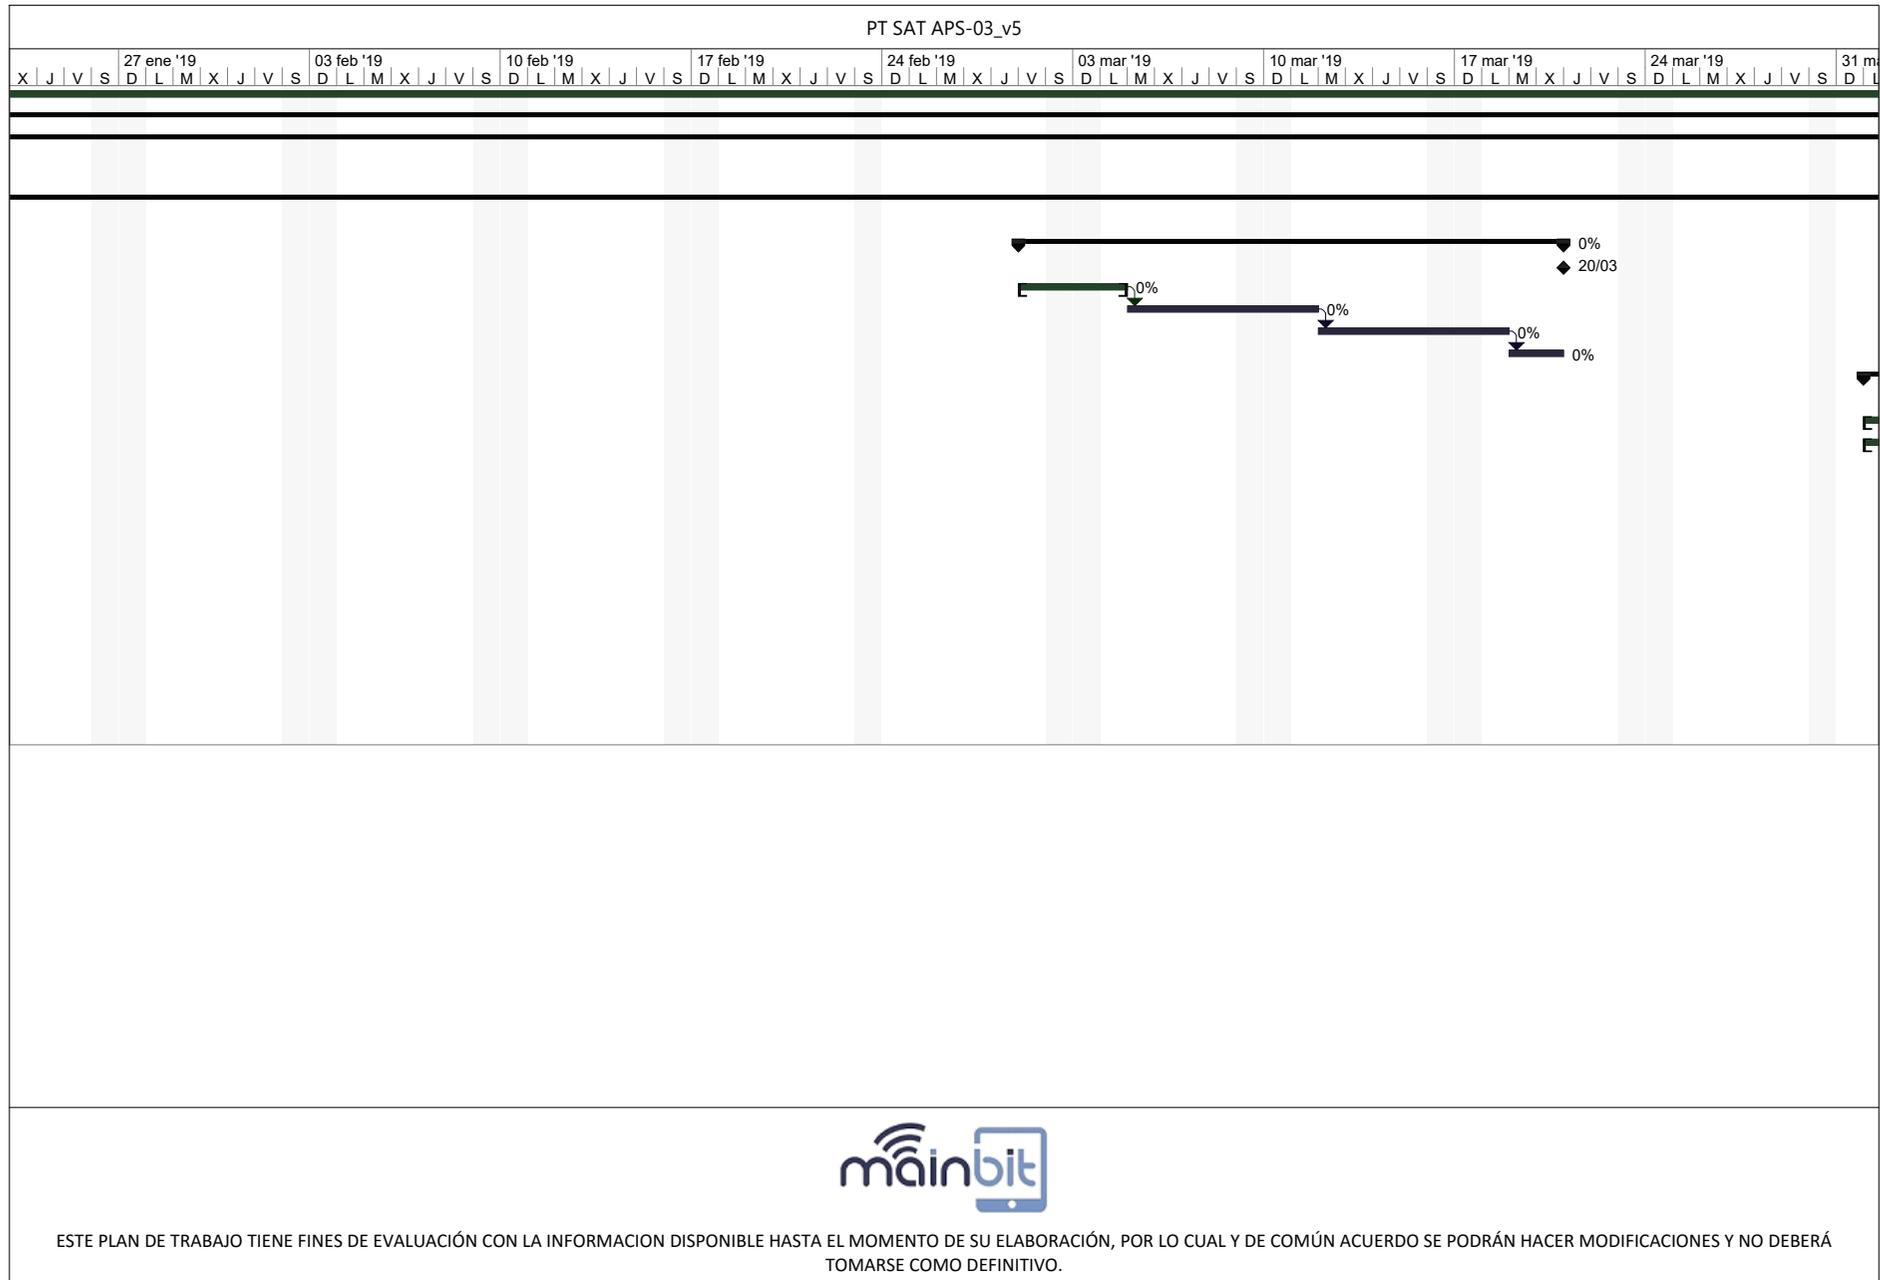

PT SAT APS-03_v5


mar '19	07 abr '19	14 abr '19	21 abr '19	28 abr '19	05 may '19	12 may '19	19 may '19	26 may '19	02 jun '19
L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive-like mark.

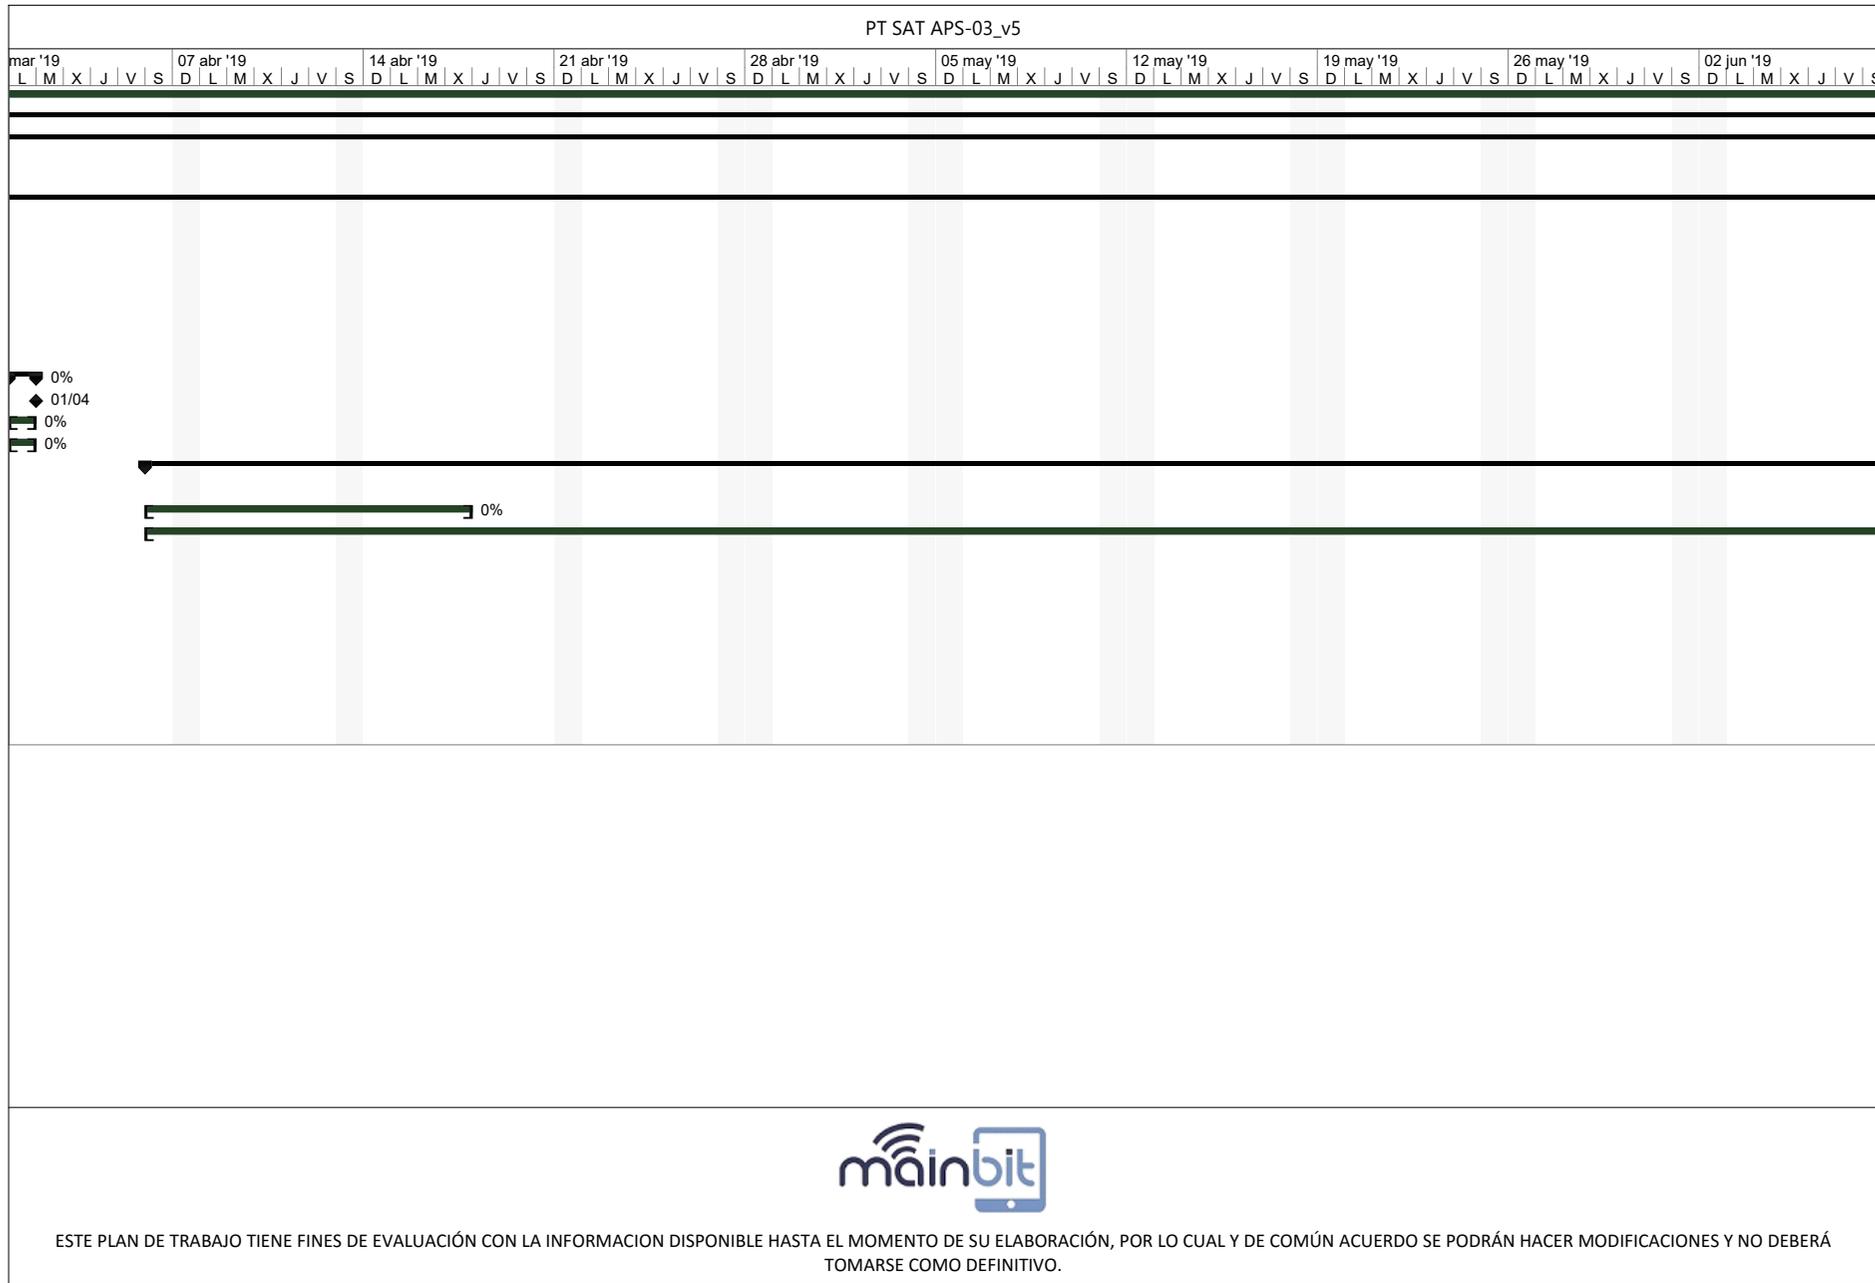

PT SAT APS-03_v5																																																								
09 jun '19			16 jun '19			23 jun '19			30 jun '19			07 jul '19			14 jul '19			21 jul '19			28 jul '19			04 ago '19			11 ago '19																													
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5

09 jun '19	16 jun '19	23 jun '19	30 jun '19	07 jul '19	14 jul '19	21 jul '19	28 jul '19	04 ago '19	11 ago '19
S D L M X J V S	S D L M X J V S	S D L M X J V S	S D L M X J V S	S D L M X J V S	S D L M X J V S	S D L M X J V S	S D L M X J V S	S D L M X J V S	S D L M X J V S



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.



PT SAT APS-03_v5

09 jun '19	16 jun '19	23 jun '19	30 jun '19	07 jul '19	14 jul '19	21 jul '19	28 jul '19	04 ago '19	11 ago '19
S D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'J' or similar character, located in the bottom right corner of the page.

PT SAT APS-03_v5

	18 ago '19	25 ago '19	01 sep '19	08 sep '19	15 sep '19	22 sep '19	29 sep '19	06 oct '19	13 oct '19	20 oct '19
J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

[Handwritten signature]

PT SAT APS-03_v5

J	V	S	18 ago '19	D	L	M	X	J	V	S	25 ago '19	D	L	M	X	J	V	S	01 sep '19	D	L	M	X	J	V	S	08 sep '19	D	L	M	X	J	V	S	15 sep '19	D	L	M	X	J	V	S	22 sep '19	D	L	M	X	J	V	S	29 sep '19	D	L	M	X	J	V	S	06 oct '19	D	L	M	X	J	V	S	13 oct '19	D	L	M	X	J	V	S	20 oct '19	D	L	M	X	J	V	S
---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a loop at the bottom and a horizontal stroke at the top.

PT SAT APS-03_v5																																	
19	27 oct '19			03 nov '19			10 nov '19			17 nov '19			24 nov '19			01 dic '19			08 dic '19			15 dic '19			22 dic '19			2					
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
0%																																	
0%																																	




ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5																																																												
19	27 oct '19					03 nov '19					10 nov '19					17 nov '19					24 nov '19					01 dic '19					08 dic '19					15 dic '19					22 dic '19					2														
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

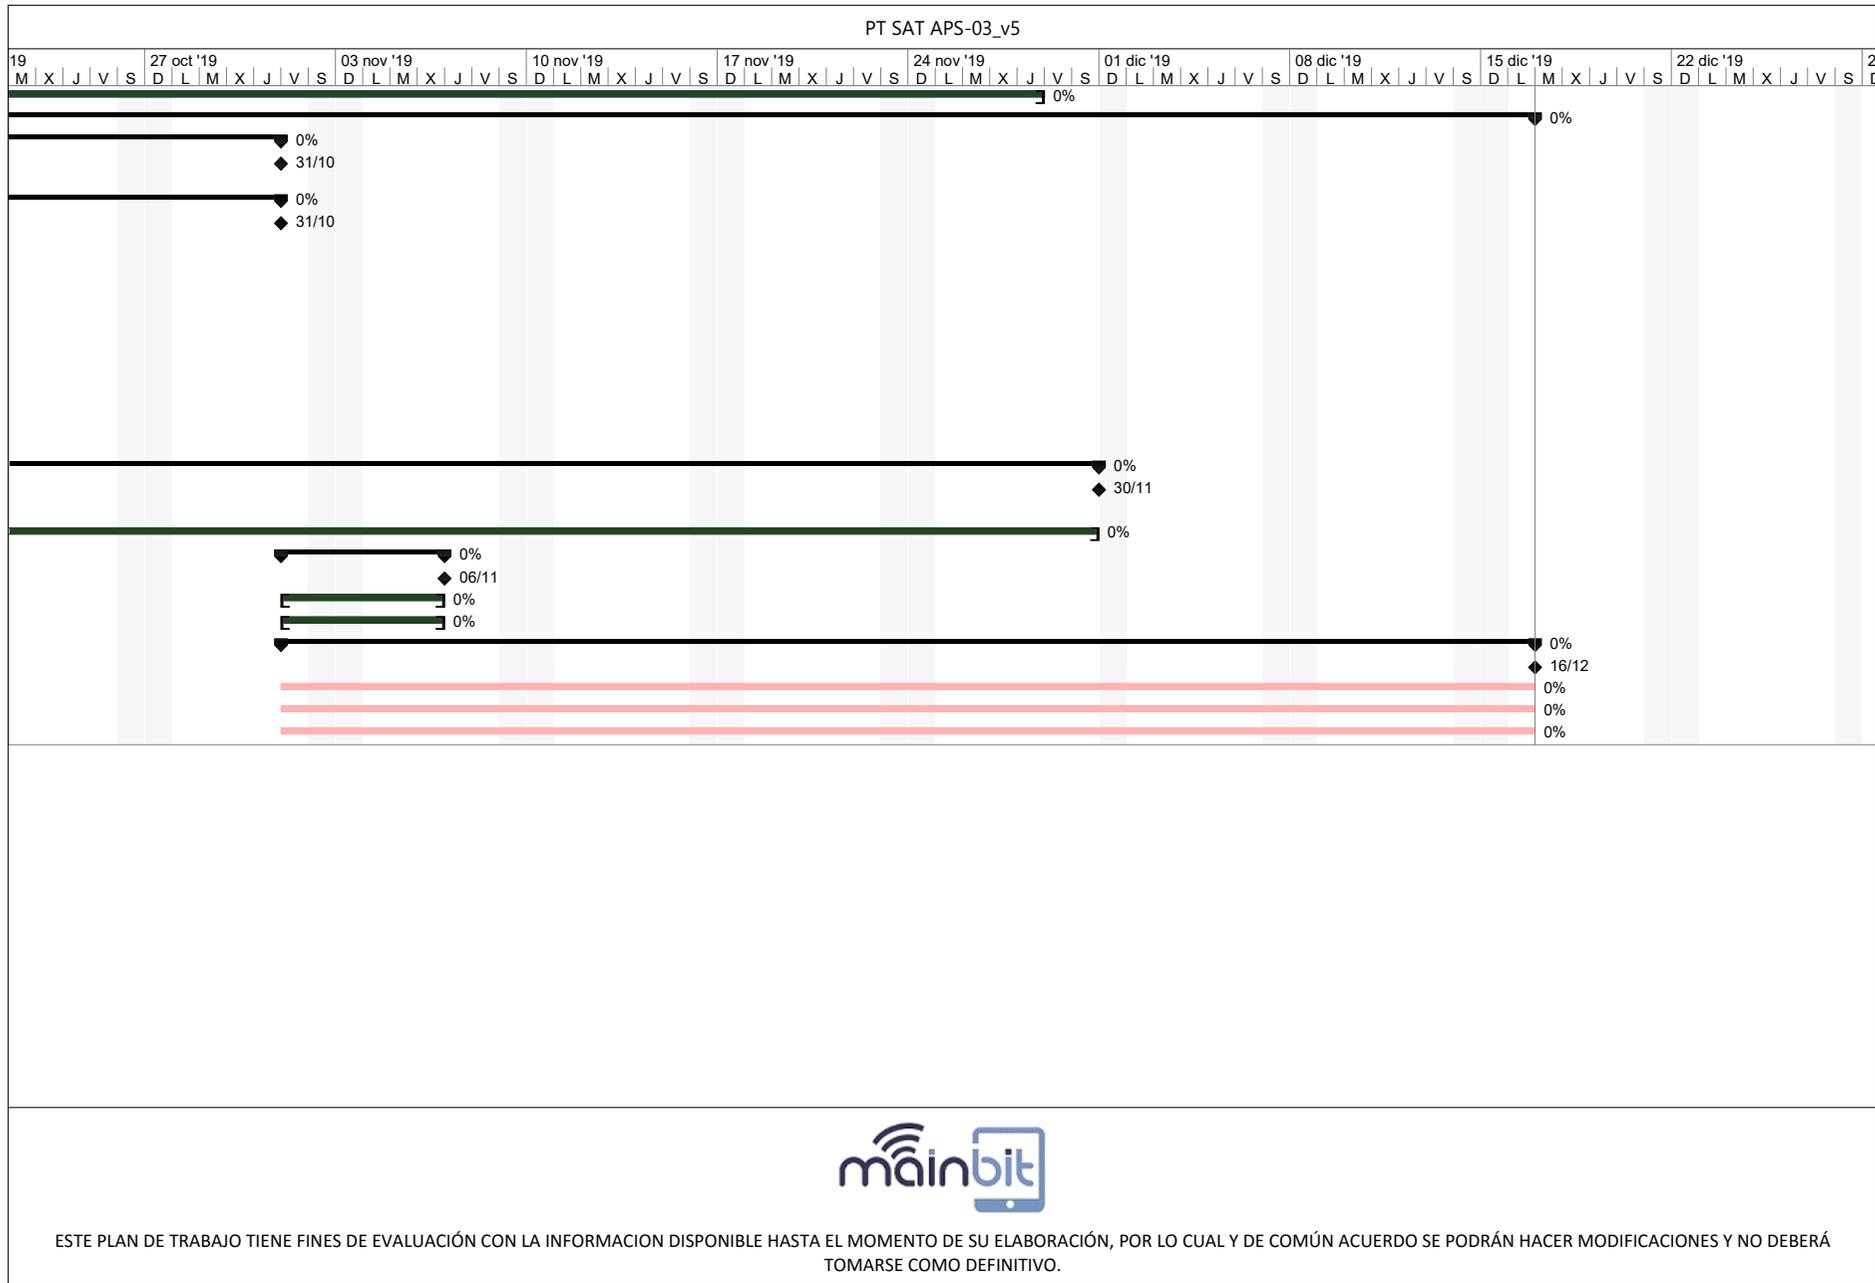

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.
