

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	Proyecto1	939 días?	mié 01/06/16	lun 16/12/19
1	PT - Servicios APS-3 SAT	939 días?	mié 01/06/16	lun 16/12/19
2	INICIO	6 días?	mié 01/06/16	mié 08/06/16
3	Id-00 Informar Fallo de la licitación APS-3 (APROXIMADO)	1 día?	mié 01/06/16	mié 01/06/16
4	Firma del Contrato (Aproximado)	5 días	jue 02/06/16	mié 08/06/16
5	Solicitud de Fabricación de Puestos de Servicio	2 días	jue 02/06/16	vie 03/06/16
6	PLANIFICACIÓN	57 días?	mié 01/06/16	lun 15/08/16
7	Presentación del grupo administrador del proyecto de implementación	2 días	mié 01/06/16	jue 02/06/16
8	Notificación del Fallo del Servicio APS-3 al personal involucrado	1 día	mié 01/06/16	mié 01/06/16
9	Preparación del personal convocado en punto de reunión	0.2 días	jue 02/06/16	jue 02/06/16
10	Id-01 El licitante adjudicado presentará al líder de los servicios APS-3, considerando hasta el nivel 3 conforme al grupo administrador del proyecto de implementación, al administrador del contrato en el inmueble "El Reloj" mencionado en el apéndice 1	1 día	jue 02/06/16	jue 02/06/16
11	Acordar y Confirmar Actividades Previas de las Mesas de Planeación	1 día?	jue 02/06/16	jue 02/06/16
12	Preparativos de las mesas de planeación y programación	1 día?	jue 02/06/16	jue 02/06/16
13	Explicación a MAINBIT de temas prioritarios	1 día?	jue 02/06/16	jue 02/06/16
14	Id-02 Confirmar y acordar las actividades previas a mesas de planeación a) Preparativos de las mesas de planeación y programación b) Explicar al licitante adjudicado los temas prioritarios que debe tener claro y preciso.	1 día	jue 02/06/16	jue 02/06/16
15	Levantamiento de Acta de Acuerdos Previos	1 día?	jue 02/06/16	jue 02/06/16
16	Firma de Acta de Acuerdos Previos por involucrados	1 día?	jue 02/06/16	jue 02/06/16
17	Conexión a Terceros	56 días?	jue 02/06/16	lun 15/08/16
18	Id-03 Implementar la gestión de conexión a terceros.	56 días?	jue 02/06/16	lun 15/08/16
19	Apegarse a la Normativa de conexión a terceros - Apéndice 9	5 días	jue 02/06/16	mié 08/06/16
20	Analizar y validar la Arquitectura de interconexión	7 días	jue 02/06/16	vie 10/06/16
21	Construcción de Enlace de las Instalaciones de Mainbit hacia el Centro de Datos del SAT	47 días	lun 13/06/16	vie 12/08/16
22	Pruebas de Interconexión a Terceros	1 día	lun 15/08/16	lun 15/08/16
23	Implementación herramienta de gestión de activos y administración remota	20 días	lun 06/06/16	vie 01/07/16
24	Id-04 Implementar en inmuebles del SAT los servidores de la herramienta de la gestión de activos del licitante adjudicado y herramienta de administración remota de activos.	20 días	lun 06/06/16	vie 01/07/16
25	Herramienta de Gestión de Activos SCAP	20 días	lun 06/06/16	vie 01/07/16
26	Instalación de SO y Configuración de Servidor	2 días	lun 06/06/16	mar 07/06/16
27	Instalación de Software	2 días	lun 06/06/16	mar 07/06/16
28	Carga de Base de Datos	10 días	lun 06/06/16	vie 17/06/16
29	Instalación y configuración de aplicativo SCAP	11 días	lun 06/06/16	lun 20/06/16



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
30	Pruebas de funcionamiento	4 días	mar 21/06/16	vie 24/06/16
31	Traslado de Servidor hacia el Inmueble del SAT	1 día	lun 27/06/16	lun 27/06/16
32	Ingreso de Servidor en Inmueble del SAT	1 día	lun 27/06/16	lun 27/06/16
33	Ingreso de servidor en dominio SAT	1 día	mar 28/06/16	mar 28/06/16
34	Asiganción de IP fija en servidor	1 día	mié 29/06/16	mié 29/06/16
35	Revision de apertura de puertos de comunicación	1 día	mié 29/06/16	mié 29/06/16
36	Pruebas de funcionamiento	2 días	jue 30/06/16	vie 01/07/16
37	Herramienta de Administración Remota Aranda Asset Management	20 días	lun 06/06/16	vie 01/07/16
38	Instalación de SO y Configuración de Servidor	2 días	lun 06/06/16	mar 07/06/16
39	Instalación de Software	2 días	lun 06/06/16	mar 07/06/16
40	Carga de Base de Datos	2 días	lun 06/06/16	mar 07/06/16
41	Instalación y configuración de aplicativo Aranda Asset Management	10 días	lun 06/06/16	vie 17/06/16
42	Pruebas de funcionamiento	4 días	lun 20/06/16	jue 23/06/16
43	Traslado de Servidor hacia el Inmueble del SAT	1 día	vie 24/06/16	vie 24/06/16
44	Ingreso de Servidor en Inmueble del SAT	1 día	vie 24/06/16	vie 24/06/16
45	Ingreso de servidor en dominio SAT	1 día	lun 27/06/16	lun 27/06/16
46	Asiganción de IP fija en servidor	1 día	lun 27/06/16	lun 27/06/16
47	Configurar Core Server	1 día	mar 28/06/16	mar 28/06/16
48	Verificar Pruebas de Aplicaciones	1 día	mar 28/06/16	mar 28/06/16
49	Configurar Consolas Core y WEB	3 días	mié 29/06/16	vie 01/07/16
50	Pruebas de Cliente y Consola	1 día	mié 29/06/16	mié 29/06/16
51	Verificar Datos y Funcionalidad de Cliente en Consola	1 día	jue 30/06/16	jue 30/06/16
52	Verificar Consola WEB	1 día	jue 30/06/16	jue 30/06/16
53	Pruebas de Funcionalidad Consola WEB	1 día	vie 01/07/16	vie 01/07/16
54	Revision de apertura de puertos de comunicación	1 día	vie 01/07/16	vie 01/07/16
55	Pruebas de funcionamiento	1 día	vie 01/07/16	vie 01/07/16
56	Entrega de equipo para generación de imagen base	1 día	mié 08/06/16	mié 08/06/16
57	Lógica para la entrega de equipos	1 día	mié 08/06/16	mié 08/06/16
58	Id-05 Entregar equipos para generar imagen base y pruebas mencionadas en la Sección 3.4.1 "Fase de planificación"	1 día	mié 08/06/16	mié 08/06/16
59	Firma de recepción de equipos para la generación de imágenes	1 día	mié 08/06/16	mié 08/06/16
60	Mesas de Planeación	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
61	Id-06 Realizar las mesas de planeación y programación, entre el SAT, terceros y el licitante adjudicado.	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
62	Comunicación de lineamientos del SAT	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
63	Programar en conjunto con el SAT el arranque del servicio	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
64	Definir alcances, interacción, acciones y aspectos generales del proyecto.	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
65	Definir la distribución geográfica de inmuebles y volumetrías.	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
66	Definir aspectos para el suministro, instalación, configuración y puesta en operación de los PS.	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
67	Definir documentación para la entrega y recepción de equipos.	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
68	Definir Plan de Ant y Rec de Fen Nat o Sociales de la G. de Continuidad.	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
69	Definición de los elementos para la generación de imagen base y de implementación.	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
70	Material didáctico sobre el uso de los PS y accesorios.	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
71	Herramienta de Mesa de Servicio CA Services Desk 14.1	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
72	Análisis y Evaluación Ambiente Actual	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
73	Revisión Procesos	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
74	Análisis de procesos existentes	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
75	Entrevista involucrados	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
76	Elaboración de documentación de acuerdos	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
77	Firma de Acuerdos	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
78	Herramienta de Administracion Remota de Activos Aranda Asset Management 8.0	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
79	Análisis y Evaluación Ambiente Actual	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
80	Revisión del ambiente actual	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
81	Análisis de procesos existentes	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
82	Entrevista involucrados	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
83	Elaboración de documentación de acuerdos	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
84	Firma de Acuerdos	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
85	Interconexión de Terceros	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
86	Análisis de las condiciones actuales	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
87	Evaluación de infraestructura actual	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
88	Generación de propuesta de conexión de tercero	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
89	Herramienta de administración de inventarios y generación de resguardos (SITE - SCAP)	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
90	Preparativos de las mesas de planeación y programación	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
91	Explicar al licitante adjudicado los temas prioritarios que debe tener claro y preciso	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
92	Administración de Dispositivos Móviles Aranda MDM	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
93	Junta de Inicio	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
94	Identificar líderes del proyecto y miembros del equipo de trabajo	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
95	Implementar Plataforma de PS	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5.mpp

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
96	Confirmar inmuebles	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
97	Verificar enlaces en cada inmueble	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
98	Determinar espacio de almacenamiento de equipo en cada inmueble	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
99	Verificar condiciones actuales de la red	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
100	Realizar documento de Acuerdos	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
101	Firma de Acuerdos	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
102	Programación en conjunto con el SAT y Tercero involucrados en el servicio	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
103	Identificar líderes del proyecto y miembros del equipo de trabajo	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
104	Validación de requerimientos de entrega en Datacenter SAT	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
105	Validación de requerimientos de entrega inicial sitios definidos por el SAT	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
106	Validación de acuerdos con terceros	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
107	Elaboración de documentos de acuerdos	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
108	Firma de documento y cierre de etapa MDM	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
109	Verificar cumplimiento de especificaciones técnicas de los PS	5 días	jue 09/06/16	mié 15/06/16
110	Id-07 Verificar cumplimiento de especificaciones técnicas de los PS y accesorios propuestos	5 días	jue 09/06/16	mié 15/06/16
111	Montaje de laboratorio en instalaciones del SAT (si aplica)	2 días	jue 09/06/16	vie 10/06/16
112	Revisión física y lógica	4 días	jue 09/06/16	mar 14/06/16
113	Validación de especificaciones técnicas	5 días	mié 08/06/16	mar 14/06/16
114	Construcción de Imágenes de PS	5 días	jue 09/06/16	mié 15/06/16
115	Id-08 Construir Imágenes Base de los Perfiles de PS	5 días	jue 09/06/16	mié 15/06/16
116	Habilitar Mesa de Servicio Temporal	7 días	mié 15/06/16	jue 23/06/16
117	Id-09 Habilitar la mesa de servicio temporal	7 días	mié 15/06/16	jue 23/06/16
118	Acceso a Herramienta de la MS SAT	7 días	mié 15/06/16	jue 23/06/16
119	Conexión con Mesa de Servicio del SAT desde las Instalaciones de Mainbit	2 días	mié 15/06/16	jue 16/06/16
120	Configuración de los procesos de gestión del servicio para el servicio APS-3	2 días	mié 15/06/16	jue 16/06/16
121	Procesos	3 días	mié 15/06/16	vie 17/06/16
122	Establecimiento de procesos requeridos para el APS-3	3 días	mié 15/06/16	vie 17/06/16
123	Verificación de procesos	3 días	mié 15/06/16	vie 17/06/16
124	Pruebas	7 días	mié 15/06/16	jue 23/06/16
125	Pruebas creación de tickets	7 días	mié 15/06/16	jue 23/06/16
126	Pruebas modificación tickets	7 días	mié 15/06/16	jue 23/06/16
127	Pruebas adjuntar documentos	7 días	mié 15/06/16	jue 23/06/16
128	Pruebas bitacora	7 días	mié 15/06/16	jue 23/06/16



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45320

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
129	Pruebas cambios de estatus	7 días	mié 15/06/16	jue 23/06/16
130	Documentación	7 días	mié 15/06/16	jue 23/06/16
131	Firma de documentación	7 días	mié 15/06/16	jue 23/06/16
132	Entrega de matriz de implementación	1 día	mié 15/06/16	mié 15/06/16
133	Id-10 Entregar matriz de implementación	1 día	mié 15/06/16	mié 15/06/16
134	Entrega de la versión complemento del Plan de Trabajo Detallado	1 día	mié 15/06/16	mié 15/06/16
135	Id-11 Entregar la versión complemento al programa de trabajo general resultado de actividades de las mesas de PyP	1 día	mié 15/06/16	mié 15/06/16
136	Análisis y Revisión de Actividades Complementarias del Plan de Trabajo	4 días	jue 16/06/16	mar 21/06/16
137	Id-12 Analizar y revisar las actividades complementarias establecidas de manera adicional en el programa de trabajo general detallado entregado durante mesas de planeación.	4 días	jue 16/06/16	mar 21/06/16
138	Entrega de Imágenes Base para los Perfiles PS	0.5 días	jue 16/06/16	jue 16/06/16
139	Id-13 Entregar imágenes base de los perfiles de PS	0.5 días	jue 16/06/16	jue 16/06/16
140	Firma de la Documentación	0.5 días	jue 16/06/16	jue 16/06/16
141	Construcción de Imágenes de Implementación de PS	5 días?	jue 16/06/16	mié 22/06/16
142	Id-14 Construir imágenes de implementación de PS definidos en las mesas de planeación y programación	5 días?	jue 16/06/16	mié 22/06/16
143	Preparación de Imágenes para Clonación de PS	5 días	jue 16/06/16	mié 22/06/16
144	Liberación del Plan de Trabajo Detallado con Actividades Complementarias	1 día?	mié 22/06/16	mié 22/06/16
145	Id-15 Aceptar las actividades complementarias y liberar el programa de trabajo general detallado ajustado por parte del licitante adjudicado que complementa con las actividades definidas en las mesas de planeación y programación.	1 día?	mié 22/06/16	mié 22/06/16
146	Pruebas Piloto del Proceso de Implementación en 2 Inmuebles	3 días	jue 23/06/16	lun 27/06/16
147	Id-16 Realizar prueba piloto del proceso de implementación en al menos 2 inmuebles	3 días	jue 23/06/16	lun 27/06/16
148	Definir pruebas Piloto del Proceso de Implementación	3 días	jue 23/06/16	lun 27/06/16
149	Acordar condiciones, alcances y objetivos de las pruebas	3 días	jue 23/06/16	lun 27/06/16
150	Ejecutar pruebas	3 días	jue 23/06/16	lun 27/06/16
151	Elaborar documentación del resultado de las pruebas	3 días	jue 23/06/16	lun 27/06/16
152	Pruebas de PS en 2 inmuebles en ambiente operativo	5 días	lun 27/06/16	vie 01/07/16
153	Id-17 Probar PS en al menos 2 inmuebles en ambiente operativo con la cantidad que se menciona en la Sección 3.4.1 "Fase de planificación"	5 días	lun 27/06/16	vie 01/07/16
154	Definir pruebas de PS en ambiente operativo	2 días	lun 27/06/16	mar 28/06/16
155	Acordar condiciones, alcances y objetivos de las pruebas	2 días	lun 27/06/16	mar 28/06/16
156	Ejecutar pruebas	3 días	lun 27/06/16	mié 29/06/16
157	Elaborar documentación del resultado de las pruebas	2 días	jue 30/06/16	vie 01/07/16
158	IMPLEMENTACIÓN	112 días?	lun 06/06/16	sáb 29/10/16



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45321

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
159	Establecer la documentación del control operativo	91 días	sáb 02/07/16	vie 28/10/16
160	Id-18 Establecer la documentación del control operativo	91 días	sáb 02/07/16	vie 28/10/16
161	Acordar documentación del control operativo	91 días	sáb 02/07/16	vie 28/10/16
162	Ajustar documentación del control operativo	91 días	sáb 02/07/16	vie 28/10/16
163	Validar documentación del control operativo	91 días	sáb 02/07/16	vie 28/10/16
164	Liberar documentación del control operativo	91 días	sáb 02/07/16	vie 28/10/16
165	Implementar esquema de integración de herramienta de gestión de activos	22 días	vie 01/07/16	vie 29/07/16
166	Id-19 Implementar esquema de integración herramienta de gestión de activos de Mainbit con SITE	22 días	vie 01/07/16	vie 29/07/16
167	Definición de flujos de integración	4 días	sáb 02/07/16	mié 06/07/16
168	Especificar parametros de los métodos de Web Service de la herramienta SITE	2 días	jue 07/07/16	vie 08/07/16
169	Creación de cliente Web Service	10 días	lun 11/07/16	vie 22/07/16
170	Consumo o llamado a métodos del Web Service de la herramienta SITE	5 días	lun 25/07/16	vie 29/07/16
171	Pruebas de funcionamiento entre ambas herramientas	1 día	vie 29/07/16	vie 29/07/16
172	Implementación de la Solucion Aranda MDM	41 días	lun 06/06/16	vie 29/07/16
173	Implementación Aranda MDM	41 días	lun 06/06/16	vie 29/07/16
174	Entrega de Infraestructura en los inmuebles del SAT para MDM	20 días	lun 06/06/16	vie 01/07/16
175	Desarrollar la estrategia de Adopción	1 día	lun 04/07/16	lun 04/07/16
176	Instalación física de componentes	5 días	mar 05/07/16	lun 11/07/16
177	Validacion de requisitos de MDM	1 día	lun 11/07/16	lun 11/07/16
178	Instalación de roles CN/DS/API/AWCM	1 día	mar 12/07/16	mar 12/07/16
179	Instalación de AWCC	2 días	mié 13/07/16	jue 14/07/16
180	Instalación de Secure Email Gateway	1 día	vie 15/07/16	vie 15/07/16
181	Instalación del Servicio de Notificación Correo Electrónico	1 día	lun 18/07/16	lun 18/07/16
182	Instalación de VM Identity Manager	2 días	mar 19/07/16	mié 20/07/16
183	Personalización y Configuración de políticas y Administración	1 día	mié 20/07/16	mié 20/07/16
184	Integración de Certificados	1 día	jue 21/07/16	jue 21/07/16
185	Integración LDAP/ Directorio Activo	2 días	vie 22/07/16	lun 25/07/16
186	Piloto en Producción	1 día	mar 26/07/16	mar 26/07/16
187	Liberación de Pruebas	1 día	mar 26/07/16	mar 26/07/16
188	Estabilización	2 días	mié 27/07/16	jue 28/07/16
189	Entrega de Operación	1 día	jue 28/07/16	jue 28/07/16
190	Entrega de Memoria Técnica	1 día	vie 29/07/16	vie 29/07/16
191	Firma de Aceptación	1 día	vie 29/07/16	vie 29/07/16



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
192	Id-20 Implementar la plataforma de PS (revisar el plan de despliegue por localidad que se encuentra en el apéndice 3 "Plan de despliegue e implementación".	92 días	sáb 02/07/16	sáb 29/10/16
193	Implementación de la plataforma de PS (Logística, Entrega, Migración, Puesta a Punto de los PS)	92 días	sáb 02/07/16	sáb 29/10/16
194	Centro aguascalientes 1	22 días	sáb 02/07/16	dom 31/07/16
195	Centro aduana de aguascalientes	18 días	vie 05/08/16	lun 29/08/16
196	Centro colima 1	31 días	dom 31/07/16	jue 08/09/16
197	Centro aduana de manzanillo	31 días	sáb 10/09/16	mié 19/10/16
198	Centro méxico 1	34 días	sáb 02/07/16	lun 15/08/16
199	Centro aduana de toluca	19 días	mar 16/08/16	vie 09/09/16
200	Centro méxico 2	78 días	jue 21/07/16	sáb 29/10/16
201	Centro guanajuato 2	30 días	sáb 02/07/16	mié 10/08/16
202	Centro aduana de guanajuato	15 días	vie 12/08/16	mié 31/08/16
203	Centro guanajuato 3	36 días	dom 31/07/16	mar 13/09/16
204	Centro guanajuato 1	24 días	mar 30/08/16	mié 28/09/16
205	Centro hidalgo 1	47 días	lun 15/08/16	jue 13/10/16
206	Centro jalisco 2	69 días	sáb 02/07/16	jue 29/09/16
207	Centro jalisco 3	47 días	jue 21/07/16	dom 18/09/16
208	Centro jalisco 4	23 días	lun 19/09/16	mar 18/10/16
209	Centro jalisco 1	36 días	dom 31/07/16	mar 13/09/16
210	Centro aduana de guadalajara	23 días	mié 14/09/16	jue 13/10/16
211	Centro jalisco 5	24 días	mar 30/08/16	mié 28/09/16
212	Centro michoacán 1	39 días	sáb 02/07/16	dom 21/08/16
213	Centro michoacán 2	28 días	lun 22/08/16	dom 25/09/16
214	Centro aduana de lázaro cárdenas	20 días	lun 26/09/16	jue 20/10/16
215	Centro morelos 1	33 días	mar 30/08/16	sáb 08/10/16
216	Centro nayarit 1	33 días	mar 30/08/16	sáb 08/10/16
217	Centro querétaro 1	47 días	jue 21/07/16	dom 18/09/16
218	Centro aduana de querétaro	16 días	mar 20/09/16	dom 09/10/16
219	Centro san luis potosí 1	36 días	dom 31/07/16	mar 13/09/16
220	Centro zacatecas 1	25 días	mié 31/08/16	vie 30/09/16
221	Centro-df distrito federal 5	92 días	sáb 02/07/16	sáb 29/10/16
222	Centro-df aduana del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico	47 días	jue 21/07/16	dom 18/09/16
223	Centro-df aduana de méxico	23 días	mar 20/09/16	mié 19/10/16
224	Centro-df distrito federal 2	78 días	jue 21/07/16	sáb 29/10/16



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45323

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
225	Centro-df distrito federal 1	78 días	jue 21/07/16	sáb 29/10/16
226	Centro-df distrito federal 3	78 días	jue 21/07/16	sáb 29/10/16
227	Centro-df distrito federal 4	78 días	jue 21/07/16	sáb 29/10/16
228	Norte baja california 2	40 días	sáb 02/07/16	mar 23/08/16
229	Norte aduana de tijuana	34 días	mié 24/08/16	mié 05/10/16
230	Norte aduana de ensenada	23 días	vie 30/09/16	sáb 29/10/16
231	Norte aduana de tecate	11 días	mié 24/08/16	mié 07/09/16
232	Norte baja california 3	30 días	jue 08/09/16	vie 14/10/16
233	Norte baja california 1	27 días	jue 21/07/16	mié 24/08/16
234	Norte aduana de mexicali	24 días	jue 25/08/16	vie 23/09/16
235	Norte baja california sur 1	35 días	jue 21/07/16	sáb 03/09/16
236	Norte baja california sur 2	36 días	dom 04/09/16	mar 18/10/16
237	Norte aduana de la paz	31 días	dom 31/07/16	jue 08/09/16
238	Norte chihuahua 1	39 días	sáb 02/07/16	sáb 20/08/16
239	Norte aduana de chihuahua	18 días	dom 21/08/16	dom 11/09/16
240	Norte aduana de ojinaga	12 días	dom 21/08/16	dom 04/09/16
241	Norte chihuahua 2	33 días	jue 21/07/16	jue 01/09/16
242	Norte aduana de ciudad Juárez	34 días	vie 02/09/16	vie 14/10/16
243	Norte aduana de puerto palomas	12 días	sáb 15/10/16	sáb 29/10/16
244	Norte coahuila de zaragoza 2	45 días	sáb 02/07/16	mar 30/08/16
245	Norte aduana de torreón	21 días	mié 31/08/16	sáb 24/09/16
246	Norte coahuila de zaragoza 1	28 días	dom 25/09/16	sáb 29/10/16
247	Norte coahuila de zaragoza 3	23 días	dom 31/07/16	lun 29/08/16
248	Norte aduana de piedras negras	18 días	mar 30/08/16	mar 20/09/16
249	Norte aduana de ciudad acuña	12 días	mié 21/09/16	mié 05/10/16
250	Norte durango 1	30 días	mar 30/08/16	mié 05/10/16
251	Norte nuevo león 2	58 días	sáb 02/07/16	mié 14/09/16
252	Norte aduana de colombia	15 días	jue 15/09/16	mar 04/10/16
253	Norte nuevo león 1	36 días	dom 31/07/16	mar 13/09/16
254	Norte aduana de monterrey	20 días	mié 14/09/16	sáb 08/10/16
255	Norte nuevo león 3	36 días	mar 30/08/16	jue 13/10/16
256	Norte sinaloa 1	34 días	sáb 02/07/16	lun 15/08/16
257	Norte sinaloa 3	24 días	mar 16/08/16	mié 14/09/16
258	Norte sinaloa 2	34 días	jue 15/09/16	sáb 29/10/16



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45324

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
259	Norte aduana de mazatlán	23 días	jue 15/09/16	vie 14/10/16
260	Norte sonora 1	39 días	sáb 02/07/16	sáb 20/08/16
261	Norte sonora 2	32 días	dom 21/08/16	jue 29/09/16
262	Norte aduana de guaymas	15 días	vie 30/09/16	mié 19/10/16
263	Norte sonora 3	31 días	dom 31/07/16	jue 08/09/16
264	Norte aduana de nogales	25 días	vie 09/09/16	sáb 08/10/16
265	Norte aduana de naco	18 días	vie 09/09/16	vie 30/09/16
266	Norte aduana de agua prieta	15 días	sáb 01/10/16	jue 20/10/16
267	Norte aduana de san luis río colorado	19 días	sáb 24/09/16	mar 18/10/16
268	Norte aduana de sonoyta	16 días	sáb 24/09/16	jue 13/10/16
269	Norte aduana de nuevo laredo	37 días	sáb 02/07/16	jue 18/08/16
270	Norte tamaulipas 3	27 días	vie 19/08/16	jue 22/09/16
271	Norte aduana de ciudad camargo	15 días	vie 23/09/16	mié 12/10/16
272	Norte aduana de ciudad miguel alemán	15 días	vie 23/09/16	mié 12/10/16
273	Norte tamaulipas 4	28 días	sáb 20/08/16	vie 23/09/16
274	Norte aduana de ciudad reynosa	23 días	sáb 24/09/16	dom 23/10/16
275	Norte tamaulipas 2	28 días	dom 31/07/16	lun 05/09/16
276	Norte aduana de matamoros	30 días	mar 06/09/16	mié 12/10/16
277	Sur campeche 1	31 días	dom 31/07/16	jue 08/09/16
278	Sur aduana de ciudad del carmen	13 días	sáb 10/09/16	sáb 24/09/16
279	Sur chiapas 2	22 días	sáb 02/07/16	dom 31/07/16
280	Sur aduana de ciudad hidalgo	36 días	lun 01/08/16	mié 14/09/16
281	Sur chiapas 1	29 días	jue 15/09/16	lun 24/10/16
282	Sur guerrero 1	27 días	jue 21/07/16	mié 24/08/16
283	Sur aduana de acapulco	16 días	vie 26/08/16	mié 14/09/16
284	Sur guerrero 2	23 días	vie 16/09/16	sáb 15/10/16
285	Sur oaxaca 1	47 días	dom 31/07/16	mié 28/09/16
286	Sur aduana de salina cruz	15 días	jue 29/09/16	mar 18/10/16
287	Sur puebla 2	45 días	sáb 02/07/16	mar 30/08/16
288	Sur aduana de puebla	16 días	jue 01/09/16	mar 20/09/16
289	Sur puebla 1	47 días	dom 31/07/16	mié 28/09/16
290	Sur quintana roo 2	30 días	sáb 02/07/16	mié 10/08/16
291	Sur aduana de cancún	23 días	jue 11/08/16	vie 09/09/16
292	Sur quintana roo 1	23 días	jue 11/08/16	vie 09/09/16



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45325

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
293	Sur aduana subteniente lópez	16 días	sáb 10/09/16	jue 29/09/16
294	Sur tabasco 1	40 días	dom 31/07/16	dom 18/09/16
295	Sur aduana dos bocas	16 días	mar 20/09/16	dom 09/10/16
296	Sur tamaulipas 1	27 días	sáb 02/07/16	vie 05/08/16
297	Sur tamaulipas 5	27 días	sáb 06/08/16	vie 09/09/16
298	Sur aduana de tampico	16 días	sáb 10/09/16	jue 29/09/16
299	Sur aduana de altamira	23 días	vie 30/09/16	sáb 29/10/16
300	Sur tlaxcala 1	28 días	mar 30/08/16	lun 03/10/16
301	Sur veracruz 2	39 días	sáb 02/07/16	sáb 20/08/16
302	Sur aduana de veracruz	36 días	dom 21/08/16	mar 04/10/16
303	Sur aduana de coatzacoalcos	15 días	jue 22/09/16	mar 11/10/16
304	Sur veracruz 3	36 días	dom 31/07/16	mar 13/09/16
305	Sur veracruz 1	34 días	mié 14/09/16	vie 28/10/16
306	Sur veracruz 5	31 días	dom 31/07/16	jue 08/09/16
307	Sur aduana de tuxpan	16 días	sáb 10/09/16	jue 29/09/16
308	Sur veracruz 4	33 días	mar 30/08/16	sáb 08/10/16
309	Sur yucatán 1	36 días	dom 31/07/16	mar 13/09/16
310	Sur aduana de progreso	19 días	jue 15/09/16	dom 09/10/16
311	Estabilización de la operación del servicio	69 días	sáb 02/07/16	jue 29/09/16
312	Id-21 Iniciar estabilización de la operación del servicio	69 días	sáb 02/07/16	jue 29/09/16
313	Monitoreo de los Componentes del Servicio	69 días	sáb 02/07/16	jue 29/09/16
314	Validación de los Componentes del Servicio	69 días	sáb 02/07/16	jue 29/09/16
315	Ajustes de Mejora del Servicio	69 días	sáb 02/07/16	jue 29/09/16
316	Monitoreo, validación, ajustes y mejora del servicio	69 días	sáb 02/07/16	jue 29/09/16
317	Liberar la conexión a terceros	1 día	mar 16/08/16	mar 16/08/16
318	Id-22 Liberar la conexión a terceros	1 día	mar 16/08/16	mar 16/08/16
319	Liberar esquema de integración de la herramienta de gestión de activos con SITE	1 día?	mié 17/08/16	mié 17/08/16
320	Id-23 Liberar el esquema de integración herramienta de gestión de activos del licitante adjudicado con SITE	1 día?	mié 17/08/16	mié 17/08/16
321	Revisión de Funcionamiento	1 día	mié 17/08/16	mié 17/08/16
322	Validación del Funcionamiento de la Herramienta de Gestión de Activos (SCAP) con SITE	1 día	mié 17/08/16	mié 17/08/16
323	Implementación y pruebas integrales de integración con la Mesa de Servicio SAT	35 días?	mié 17/08/16	vie 30/09/16
324	Id-24 Implementar y realizar pruebas integrales del esquema de integración con la mesa de servicio SAT	35 días?	mié 17/08/16	vie 30/09/16
325	Revisión de Funcionamiento	5 días	mié 17/08/16	mar 23/08/16
326	Validación del funcionamiento de la Mesa de Servicio CA Service Desk 14.1	5 días	mié 24/08/16	mar 30/08/16



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45326

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
327	Definición de pruebas integrales CA Service Desk 14.1 vs Remedy	2 días	mié 31/08/16	jue 01/09/16
328	Acuerdo de realización de pruebas	2 días	vie 02/09/16	lun 05/09/16
329	Ejecución de pruebas integrales CA Service Desk 14.1 vs Remedy	10 días	mar 06/09/16	jue 15/09/16
330	Documentación de pruebas integrales	8 días	vie 16/09/16	mar 27/09/16
331	Entrega de Memoria Técnica CA Service Desk 14.1	1 día	mié 28/09/16	mié 28/09/16
332	Liberar esquema de integración con la mesa de servicio SAT	1 día	sáb 01/10/16	sáb 01/10/16
333	Id-25 Liberar el esquema de integración con la mesa de servicio SAT	1 día	sáb 01/10/16	sáb 01/10/16
334	Entrega de documentación de control operativo	1 día	sáb 29/10/16	sáb 29/10/16
335	Id-26 Entregar la documentación del control operativo	1 día	sáb 29/10/16	sáb 29/10/16
336	Entrega de Memoria Técnica	1 día	sáb 29/10/16	sáb 29/10/16
337	Revisión de Memoria Técnica	1 día	sáb 29/10/16	sáb 29/10/16
338	Documento de cierre de etapa	1 día	sáb 29/10/16	sáb 29/10/16
339	Firma y aceptación de cierre de etapa	1 día	sáb 29/10/16	sáb 29/10/16
340	EJECUCIÓN Y CONTROL	813 días?	dom 30/10/16	sáb 30/11/19
341	Id-27 Aplicar las gestorías del servicio	812 días?	lun 31/10/16	sáb 30/11/19
342	Gestión del Servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
343	Mesa de Servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
344	Entrega de Operación	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
345	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
346	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
347	Periodo de administración del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
348	Herramienta de Gestión de Activos	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
349	Entrega de Operación	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
350	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
351	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
352	Periodo de administración del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
353	Interconexión de Terceros	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
354	Entrega de Operación	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
355	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
356	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
357	Periodo de administración del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
358	Herramienta de Administración de Inventarios y generación de resguardos (SITE - SCAP)	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
359	Entrega de Operación	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
360	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
361	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
362	Periodo de administración del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
363	Administración de Dispositivos Móviles	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
364	Entrega de Operación	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
365	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
366	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
367	Periodo de administración del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
368	Administración de PS	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
369	Entrega de Operación	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
370	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
371	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
372	Periodo de administración del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
373	Medición del Servicio y Entregables Periódicos	813 días?	dom 30/10/16	sáb 30/11/19
374	Id-28 Aplicar la medición del cumplimiento del servicio y entregables periódicos y bajo demanda	811 días?	mar 01/11/16	sáb 30/11/19
375	Mesa de Servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
376	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
377	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
378	Reporteo Continuo de Resultados	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
379	Herramienta de Gestión de Activos	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
380	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
381	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
382	Reporteo Continuo de Resultados	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
383	Periodo de administración del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
384	Interconexión de Terceros	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
385	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
386	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
387	Reporteo Continuo de Resultados	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
388	Periodo de administración del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
389	Herramienta de Administración de Inventarios y generación de resguardos (SITE - SCAP)	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
390	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
391	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
392	Reporteo Continuo de Resultados	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
393	Periodo de administración del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
394	Administración de Dispositivos Móviles	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
395	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
396	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
397	Reporte Continuo de Resultados	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
398	Periodo de administración del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
399	Administración de PS	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
400	Monitoreo Continuo	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
401	Validación del servicio	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
402	Reporte Continuo de Resultados	811 días?	dom 30/10/16	jue 28/11/19
403	CIERRE	257 días?	mar 01/01/19	lun 16/12/19
404	Lista de verificación	224 días?	mar 01/01/19	jue 31/10/19
405	Id-29 Elaborar lista de verificación (checklist) de las actividades y documentos necesarios para el cierre de contrato	224 días?	mar 01/01/19	jue 31/10/19
406	Libro Blanco	223 días?	mié 02/01/19	jue 31/10/19
407	Id-30 Conformar libro blanco	223 días?	mié 02/01/19	jue 31/10/19
408	Donación de Perfiles	14 días	vie 01/03/19	mié 20/03/19
409	Id-31 Definir la donación de perfiles	14 días	vie 01/03/19	mié 20/03/19
410	Realizar una mesa de planeación	2 días	vie 01/03/19	lun 04/03/19
411	Definir condiciones de donación de equipo	5 días	mar 05/03/19	lun 11/03/19
412	Acordar lineamientos de donación de equipo	5 días	mar 12/03/19	lun 18/03/19
413	Firma acuerdo de donación de equipo	2 días	mar 19/03/19	mié 20/03/19
414	Plan de Retiro de PS	1 día	lun 01/04/19	lun 01/04/19
415	Id-32 Entregar plan de retiro de equipo para los perfiles que aplique	1 día	lun 01/04/19	lun 01/04/19
416	Elaborar plan de retiro de equipos para los perfiles que aplique	1 día	lun 01/04/19	lun 01/04/19
417	Verificar el plan de retiro de equipos para los perfiles que aplique	1 día	lun 01/04/19	lun 01/04/19
418	Retiro de PS Donados	175 días	sáb 06/04/19	sáb 30/11/19
419	Id-33 Retirar los perfiles que así fueron definidos	175 días	sáb 06/04/19	sáb 30/11/19
420	Solicitar autorización del SAT para ejecutar el plan de retiro de equipos	10 días	sáb 06/04/19	mié 17/04/19
421	Retiro de Equipo	175 días	sáb 06/04/19	sáb 30/11/19
422	Verificar cumplimiento del checklist para el cierre	4 días?	vie 01/11/19	mié 06/11/19
423	Id-34 Verificar el cumplimiento del checklist de actividades y documentos para el cierre	4 días?	vie 01/11/19	mié 06/11/19
424	Comparar el monitoreo contra el checklist	4 días?	vie 01/11/19	mié 06/11/19
425	Reportar hallazgos	4 días?	vie 01/11/19	mié 06/11/19
426	Validación del último mes	33 días	vie 01/11/19	lun 16/12/19
427	Id-35 Validar último mes de niveles de servicio y firmar acta de entrega de los servicios	33 días	vie 01/11/19	lun 16/12/19



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45329

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
428	Comparar el monitoreo contra el checklist	33 días	vie 01/11/19	lun 16/12/19
429	Documentar reporte de hallazgos	33 días	vie 01/11/19	lun 16/12/19
430	Verificar los niveles de servicio	33 días	vie 01/11/19	lun 16/12/19



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5.mpp

Nombres de los recursos					10 abr '16								17 abr '16								24 abr '16								01 may '16								08 may '16			
	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V									
Especialista Herramienta SCAP																																								
Especialista Herramienta SCAP																																								
Especialista Herramienta SCAP																																								
Especialista Herramienta SCAP																																								
Especialista Herramienta SCAP																																								
Especialista Herramienta SCAP																																								
Especialista Herramienta SCAP																																								
Especialista Herramienta SCAP																																								
Especialista Herramienta LanDesk																																								
Especialista Herramienta LanDesk																																								
Especialista Herramienta LanDesk																																								
Especialista Herramienta LanDesk																																								
Especialista Herramienta LanDesk																																								
Especialista Herramienta LanDesk																																								
Especialista Herramienta LanDesk																																								
Especialista Herramienta LanDesk																																								
Especialista Herramienta LanDesk																																								
Especialista Herramienta LanDesk																																								
Especialista Herramienta LanDesk																																								
Especialista Herramienta LanDesk																																								
Especialista Herramienta LanDesk																																								
Líder de Proyecto																																								
Líder de Proyecto,Representante Legal																																								
Administrador del Contrato																																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																								



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45332

PT SAT APS-03_v5.mpp

Nombres de los recursos					10 abr '16								17 abr '16								24 abr '16								01 may '16								08 may '16							
	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V						
Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto																																												
Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto																																												
Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto																																												
Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto																																												
Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto																																												
Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto																																												
Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto																																												
Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto																																												
Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto																																												
Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto																																												
Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto																																												
Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto																																												
Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto																																												
Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto																																												
Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto																																												
Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto																																												
Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto																																												
Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto																																												
Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto																																												
Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto																																												
Líder de Proyecto,Grupo Administrador del Proyecto																																												



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45333

PT SAT APS-03_v5.mpp

Nombres de los recursos					10 abr '16								17 abr '16								24 abr '16								01 may '16								08 may '16			
	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V		
Coordinador Help Desk Manager																																								
Coordinador Help Desk Manager																																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																								
Líder de Proyecto																																								
Administrador del Contrato																																								
Grupo Dedicado Generación Imágenes																																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																								
SAT / Licitante adjudicado																																								
Grupo Dedicado Generación Imágenes																																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																								
Administrador del Contrato,Grupo De Implementación																																								
Administrador del Contrato,Grupo De Implementación																																								
Administrador del Contrato,Grupo De Implementación																																								
Administrador del Contrato,Grupo De Implementación																																								
Administrador del Contrato,Grupo De Implementación																																								
Administrador del Contrato,Grupo De Implementación																																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																								



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45335

PT SAT APS-03_v5.mpp

Nombres de los recursos	10 abr '16				17 abr '16				24 abr '16				01 may '16				08 may '16							
	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																								
Especialista Herramienta SCAP,Administrador del Contrato																								
Especialista Herramienta SCAP,Administrador del Contrato																								
Especialista Herramienta SCAP,Administrador del Contrato																								
Especialista Herramienta SCAP,Administrador del Contrato																								
Especialista Herramienta SCAP,Administrador del Contrato																								
Especialista Herramienta SCAP,Administrador del Contrato																								
Especialista MDM																								
Especialista MDM																								
Especialista MDM																								
Especialista MDM																								
Especialista MDM																								
Especialista MDM																								
Especialista MDM																								
Especialista MDM																								
Especialista MDM																								
Especialista MDM																								
Especialista MDM																								
Especialista MDM																								
Especialista MDM																								
Especialista MDM																								
Especialista MDM																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																								



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45336

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45337

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45338

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45339

PT SAT APS-03_v5.mpp



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45341

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45342

PT SAT APS-03_v5.mpp

Nombres de los recursos					10 abr '16								17 abr '16								24 abr '16								01 may '16								08 may '16			
	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V									
Líder de Proyecto,Administrador del Contrato																																								
Líder de Proyecto,Administrador del Contrato																																								
Líder de Proyecto,Administrador del Contrato																																								
Líder de Proyecto,Administrador del Contrato																																								
Líder de Proyecto,Administrador del Contrato																																								
Líder de Proyecto,Administrador del Contrato																																								
Líder de Proyecto,Administrador del Contrato																																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																								
Administrador del Contrato																																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																								
Líder de Proyecto																																								
Líder de Proyecto																																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																								
Líder de Proyecto																																								
Líder de Proyecto																																								
Administrador del Contrato																																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																								
Administrador del Contrato[550%],Líder de Proyecto[550%]																																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																								
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																								





ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45343

Nombres de los recursos					10 abr '16							17 abr '16							24 abr '16							01 may '16							08 may '16						
	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																							
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																							
Administrador del Contrato,Líder de Proyecto																																							



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

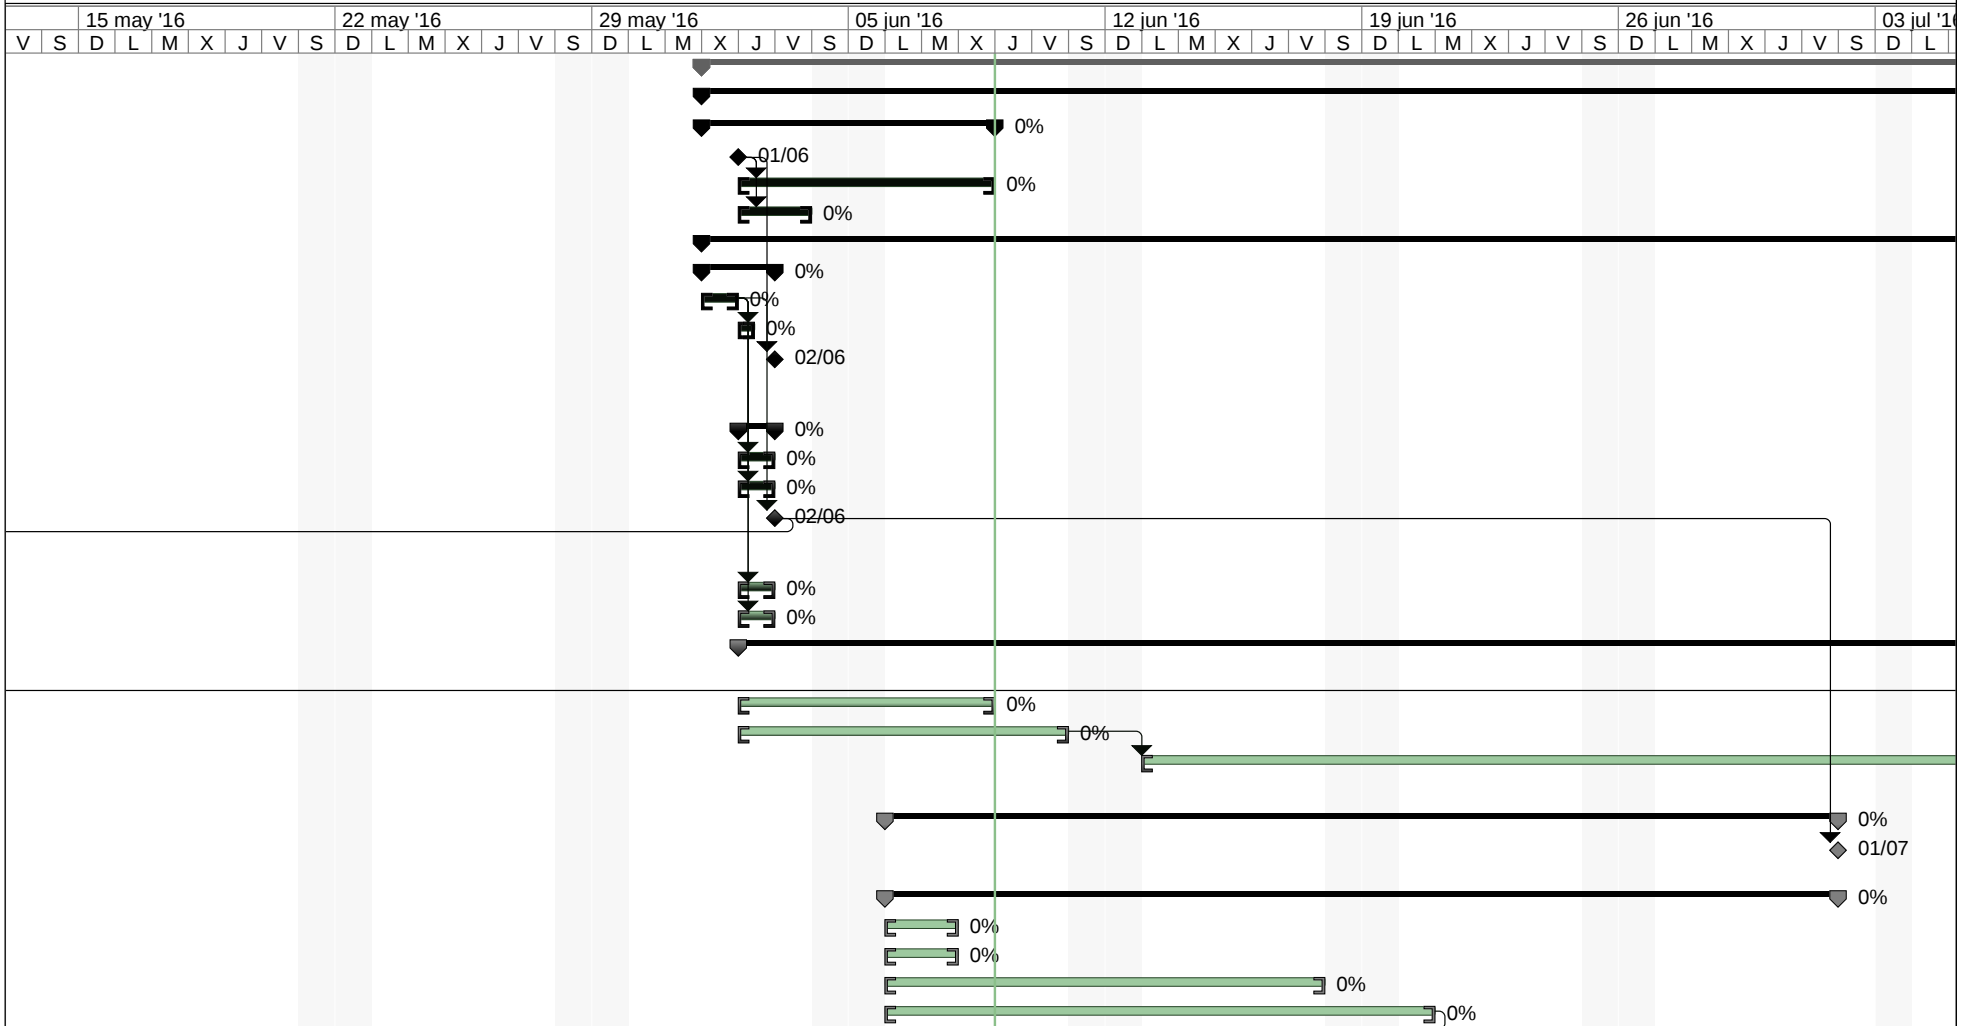

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5.mpp

15 may '16							22 may '16							29 may '16							05 jun '16							12 jun '16							19 jun '16							26 jun '16							03 jul '16	
V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L												





PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.


Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45347

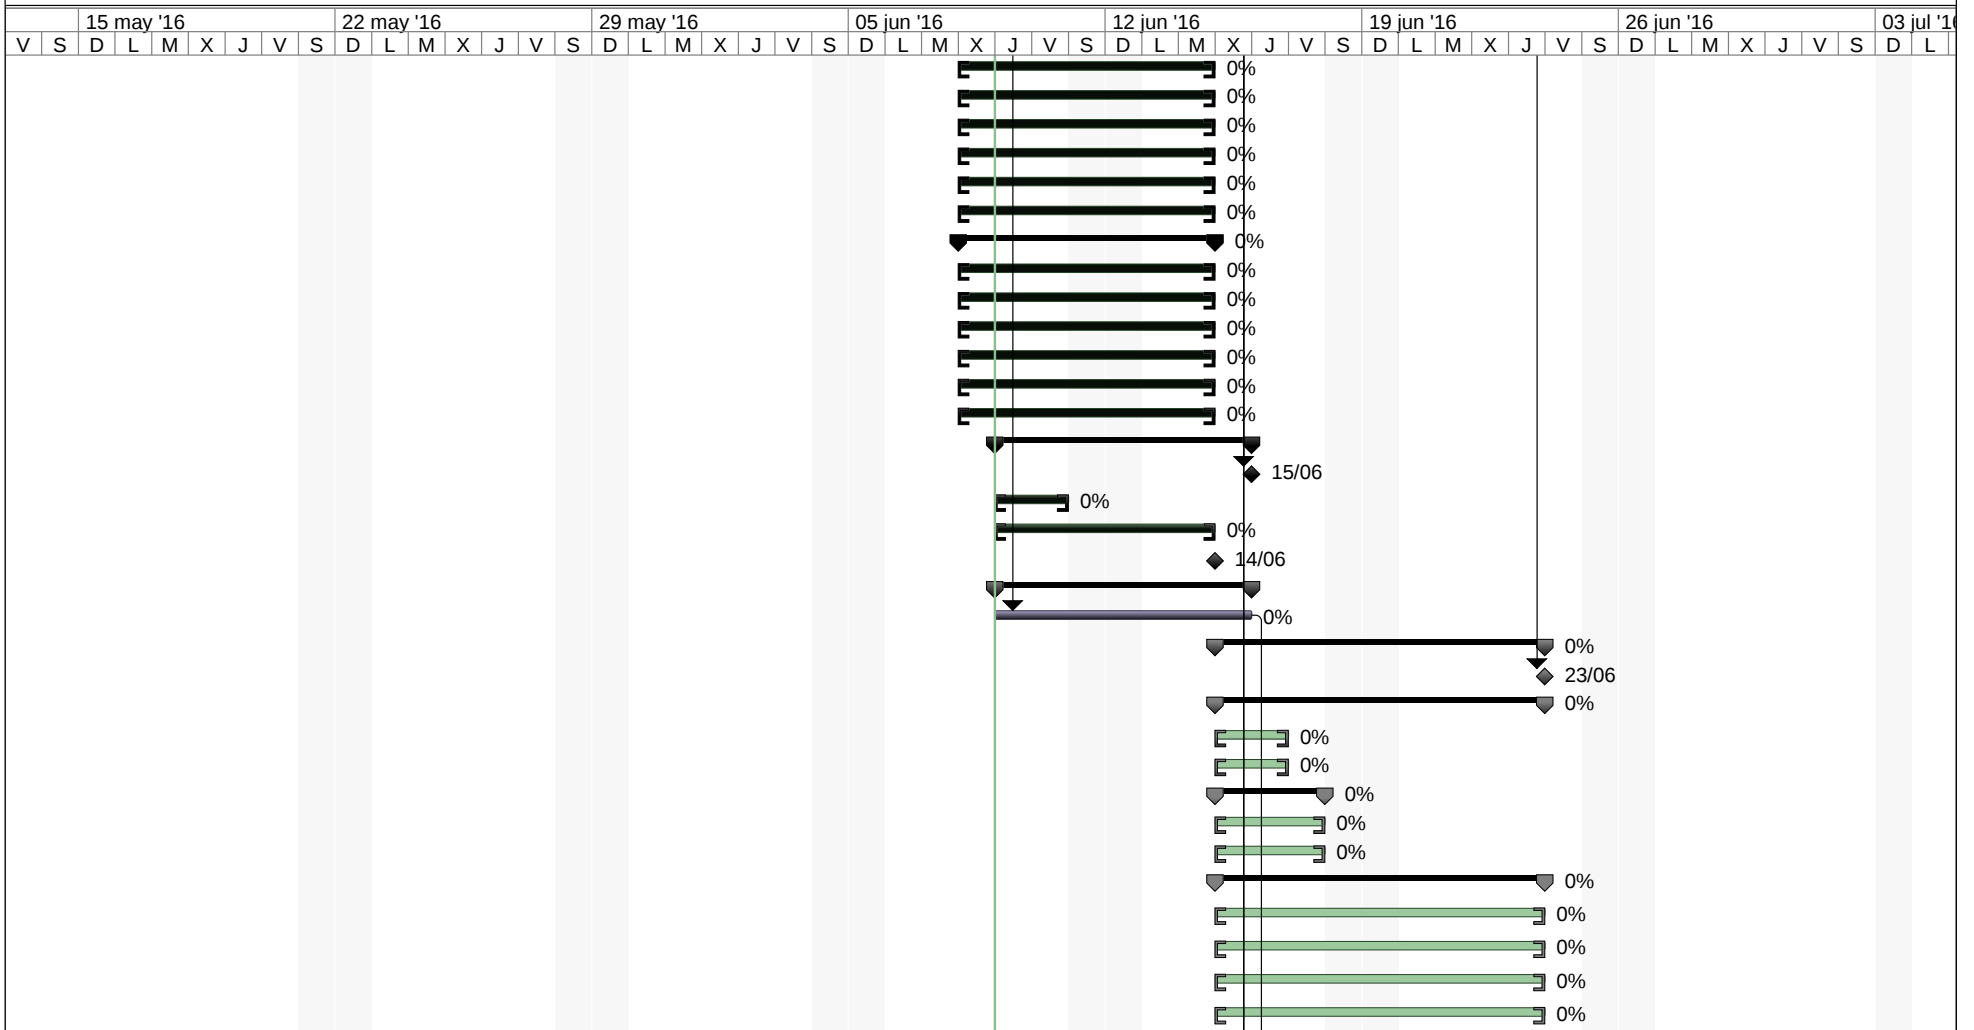

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45348


PT SAT APS-03_v5.mpp

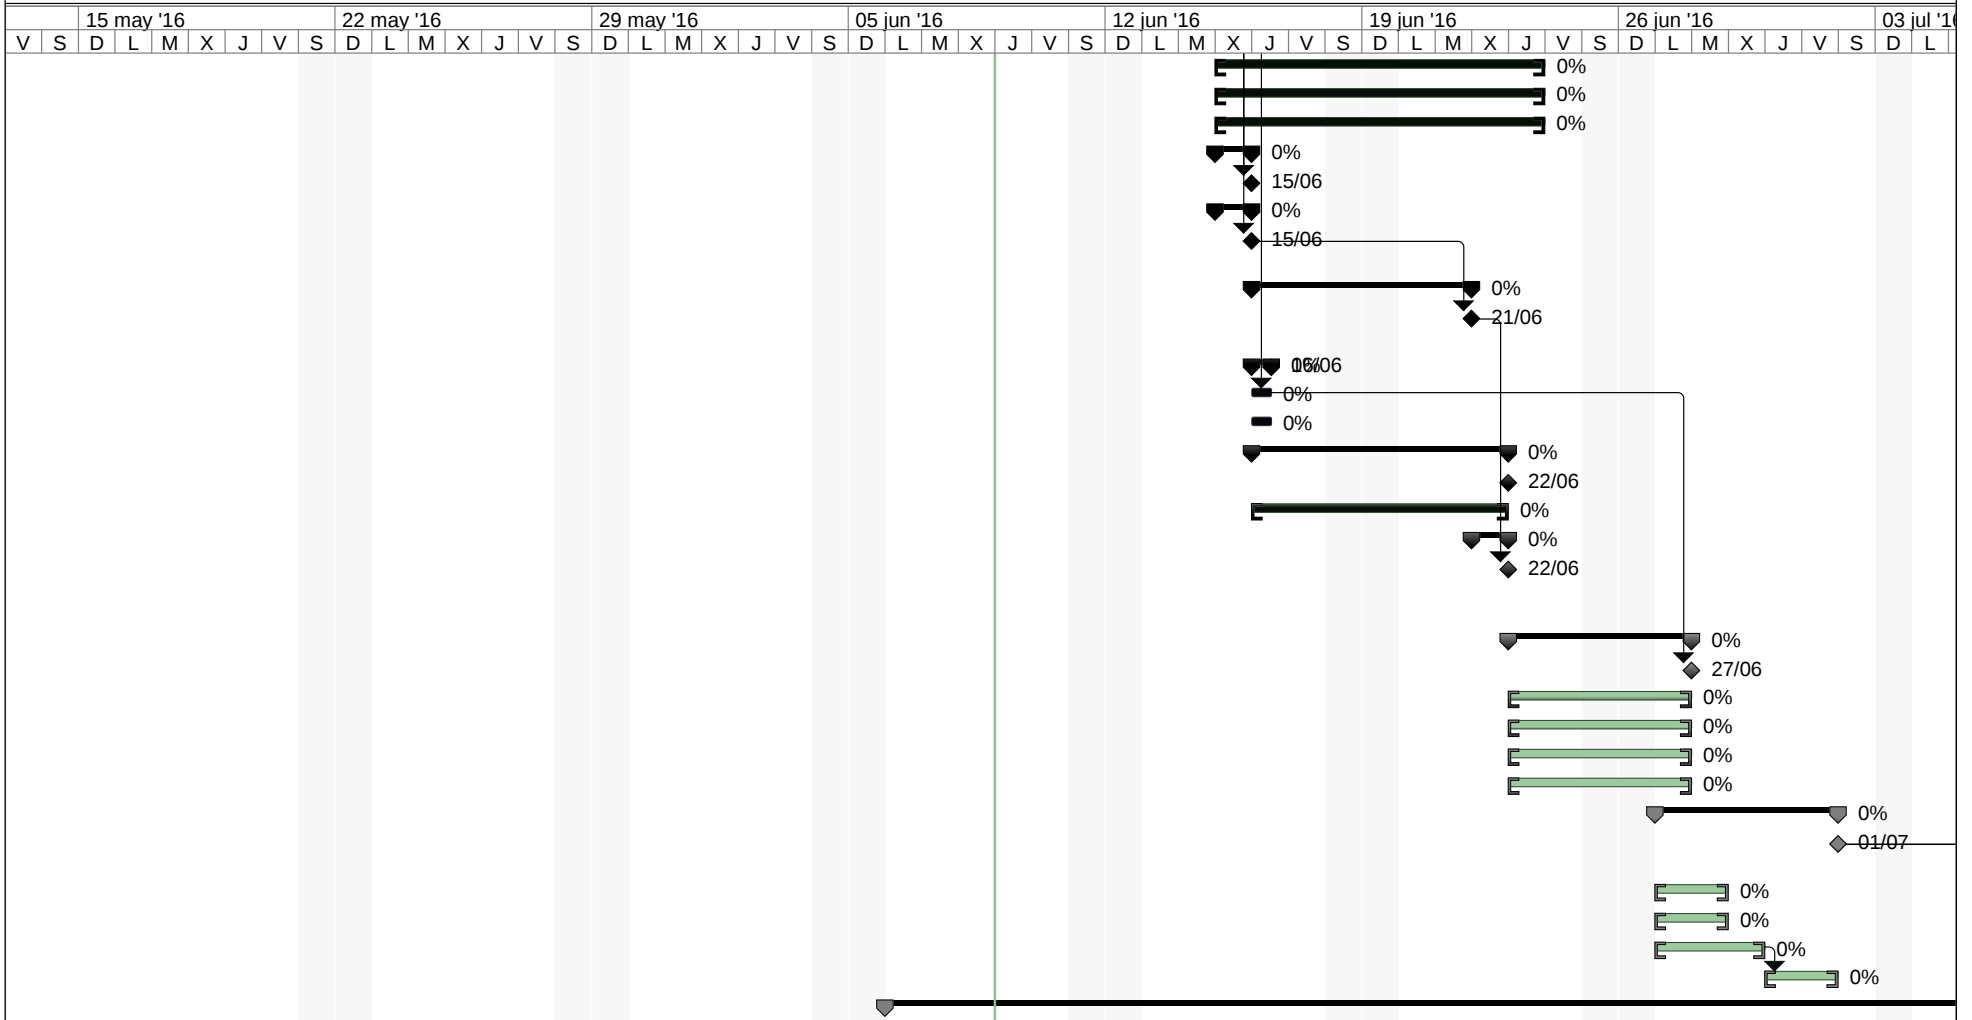

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45349

PT SAT APS-03_v5.mpp

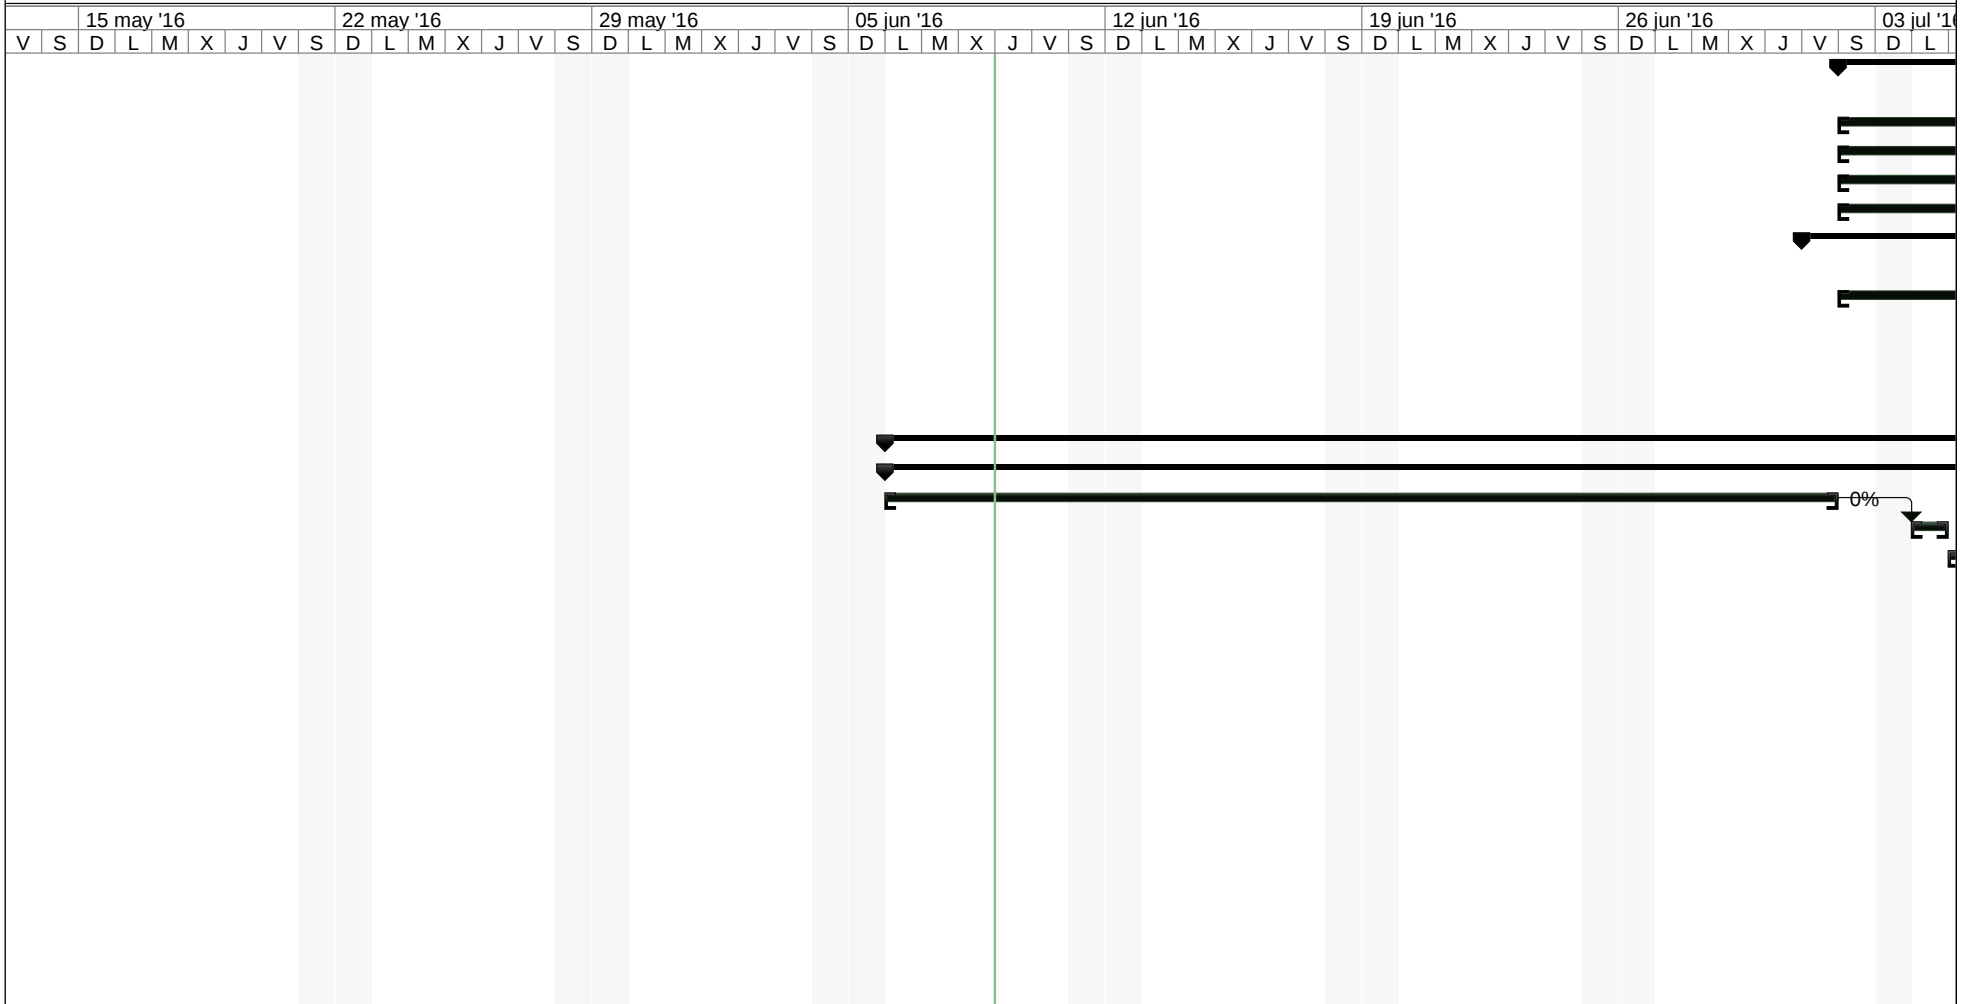

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45350

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45351

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45352

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45354

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45355

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45356

[illegible]


ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45357

[illegible]

PT SAT APS-03_v5.mpp

6					10 jul '16					17 jul '16					24 jul '16					31 jul '16					07 ago '16					14 ago '16					21 ago '16				
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	

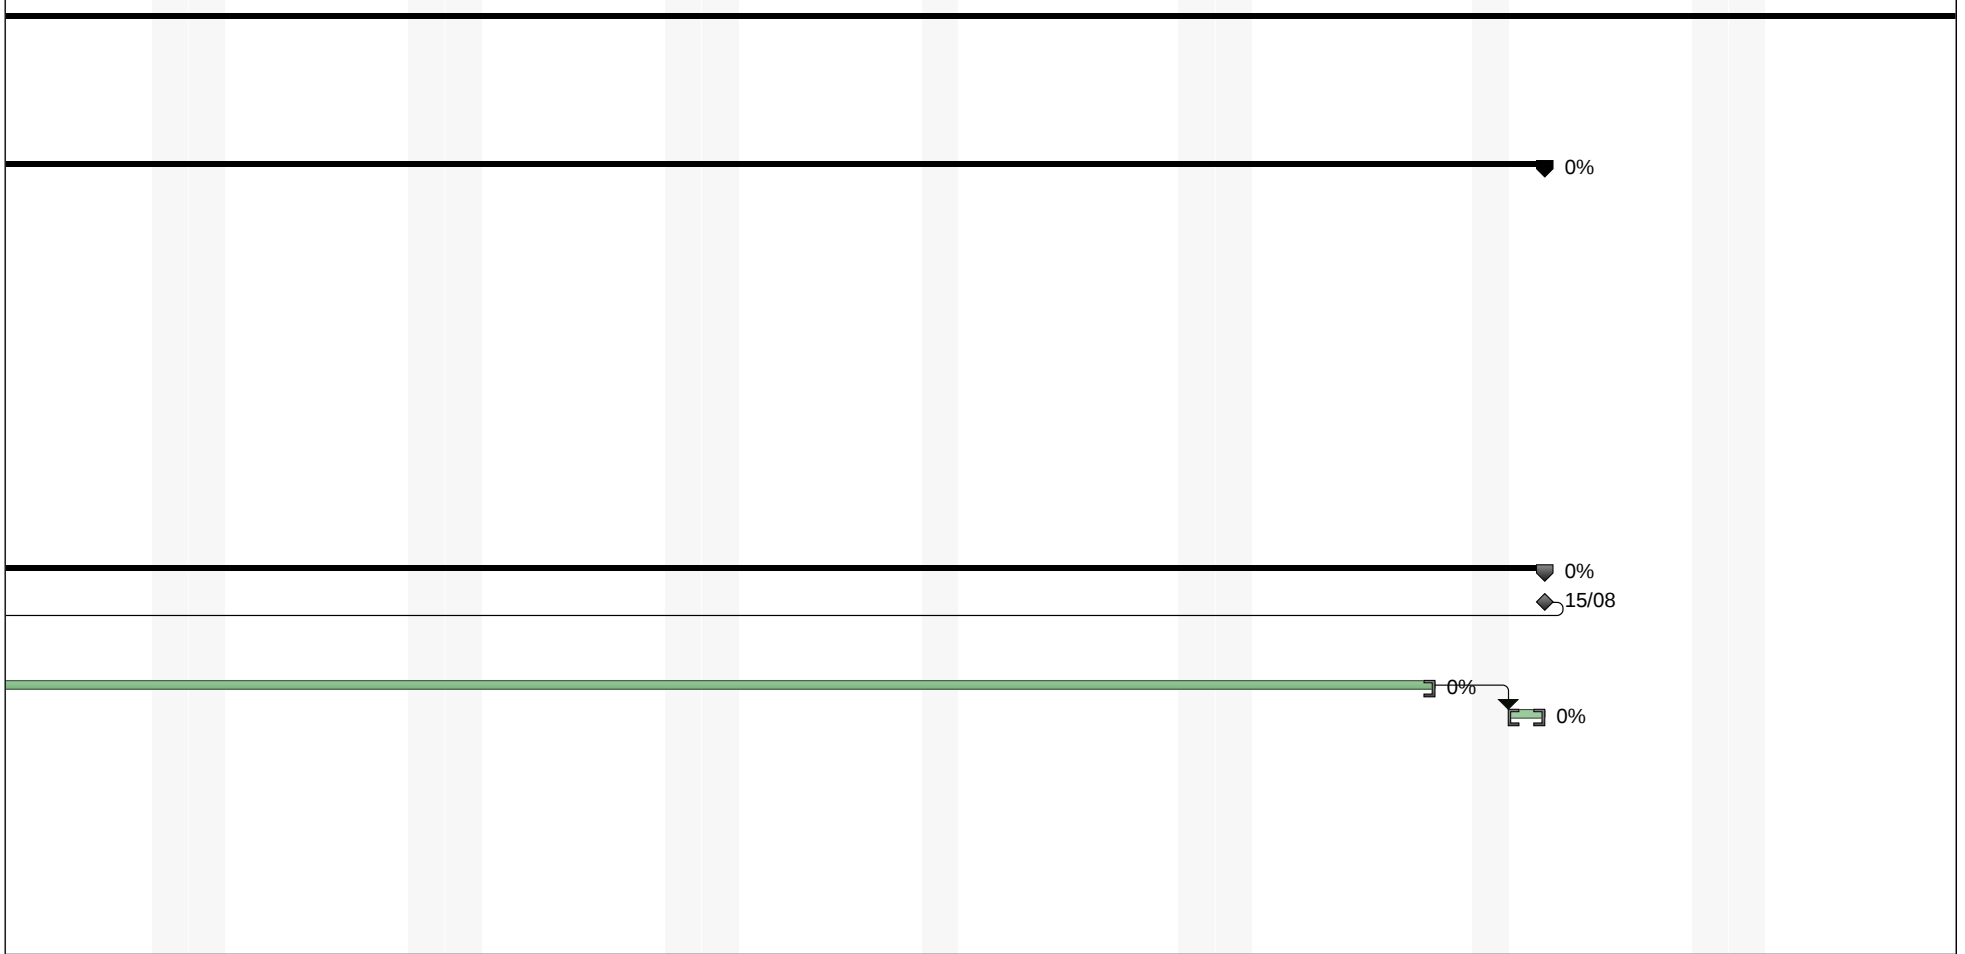

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45359

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45360

6						10 jul '16					17 jul '16					24 jul '16					31 jul '16					07 ago '16					14 ago '16					21 ago '16				
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V		



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5.mpp

6	10 jul '16										17 jul '16										24 jul '16										31 jul '16										07 ago '16										14 ago '16										21 ago '16									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45362

PT SAT APS-03_v5.mpp


					10 jul '16							17 jul '16							24 jul '16							31 jul '16							07 ago '16							14 ago '16							21 ago '16						
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S							



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45363

PT SAT APS-03_v5.mpp

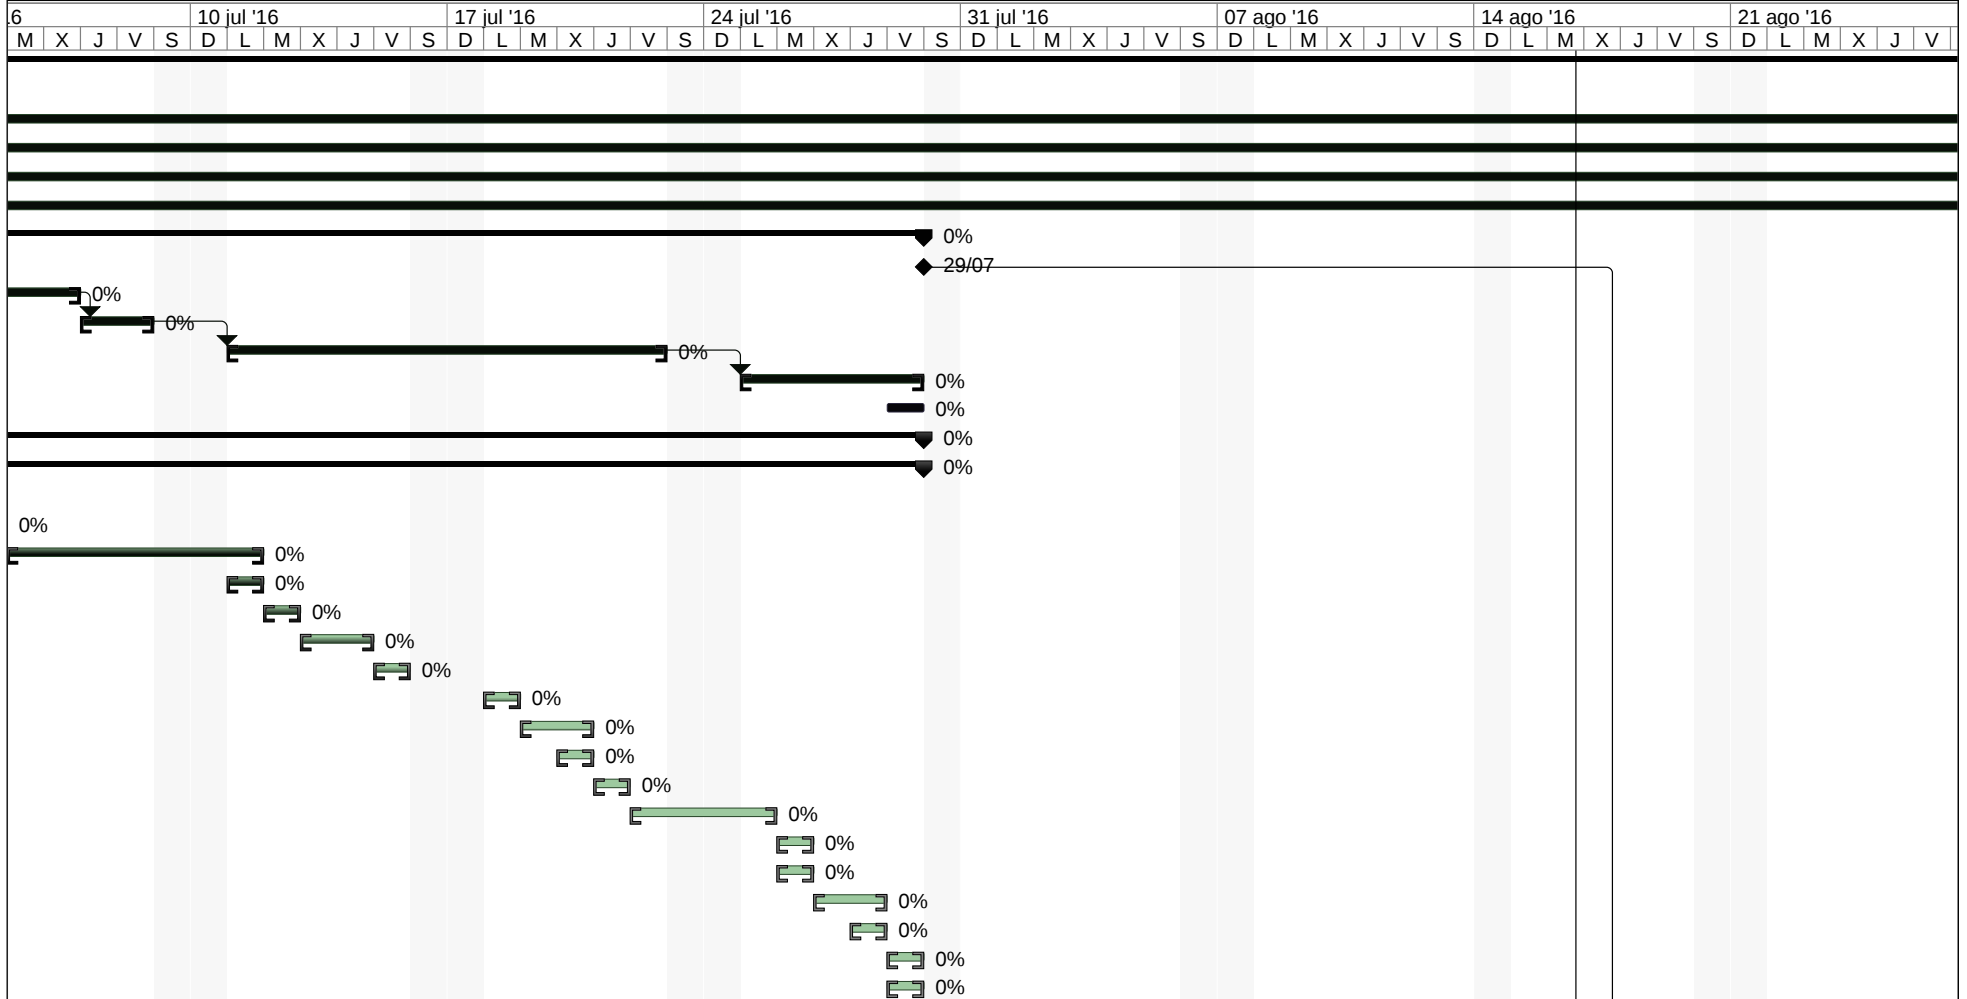

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45364

PT SAT APS-03_v5.mpp

Task Name	Start Date	End Date	Progress (%)	Category
Task 1	2016-06-06	2016-07-03	0%	Black
Task 2	2016-07-03	2016-07-10	0%	Black
Task 3	2016-07-03	2016-07-17	0%	Black
Task 4	2016-07-10	2016-07-17	0%	Black
Task 5	2016-07-17	2016-07-24	0%	Black
Task 6	2016-07-24	2016-08-07	0%	Black
Task 7	2016-08-07	2016-08-14	0%	Black
Task 8	2016-08-14	2016-08-21	0%	Black
Task 9	2016-07-10	2016-07-17	0%	Green
Task 10	2016-07-17	2016-07-24	0%	Green
Task 11	2016-07-24	2016-08-07	0%	Green
Task 12	2016-08-07	2016-08-14	0%	Green
Task 13	2016-08-14	2016-08-21	0%	Green



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45365

PT SAT APS-03_v5.mpp

The Gantt chart displays the project schedule for PT SAT APS-03_v5.mpp. The timeline spans from July 6 to August 21, 2016. The chart is organized into weekly intervals, with days of the week (M, X, J, V, S) indicated for each day. The tasks are represented by horizontal bars, and their completion percentages are shown at the end of each bar.

Task	Start Date	End Date	Completion Percentage
Task 1	Jul 6	Jul 10	0%
Task 2	Jul 10	Jul 17	0%
Task 3	Jul 17	Jul 24	0%
Task 4	Jul 24	Jul 31	0%
Task 5	Jul 31	Aug 7	0%
Task 6	Aug 7	Aug 14	0%
Task 7	Aug 14	Aug 21	0%



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.


PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45367

PT SAT APS-03_v5.mpp

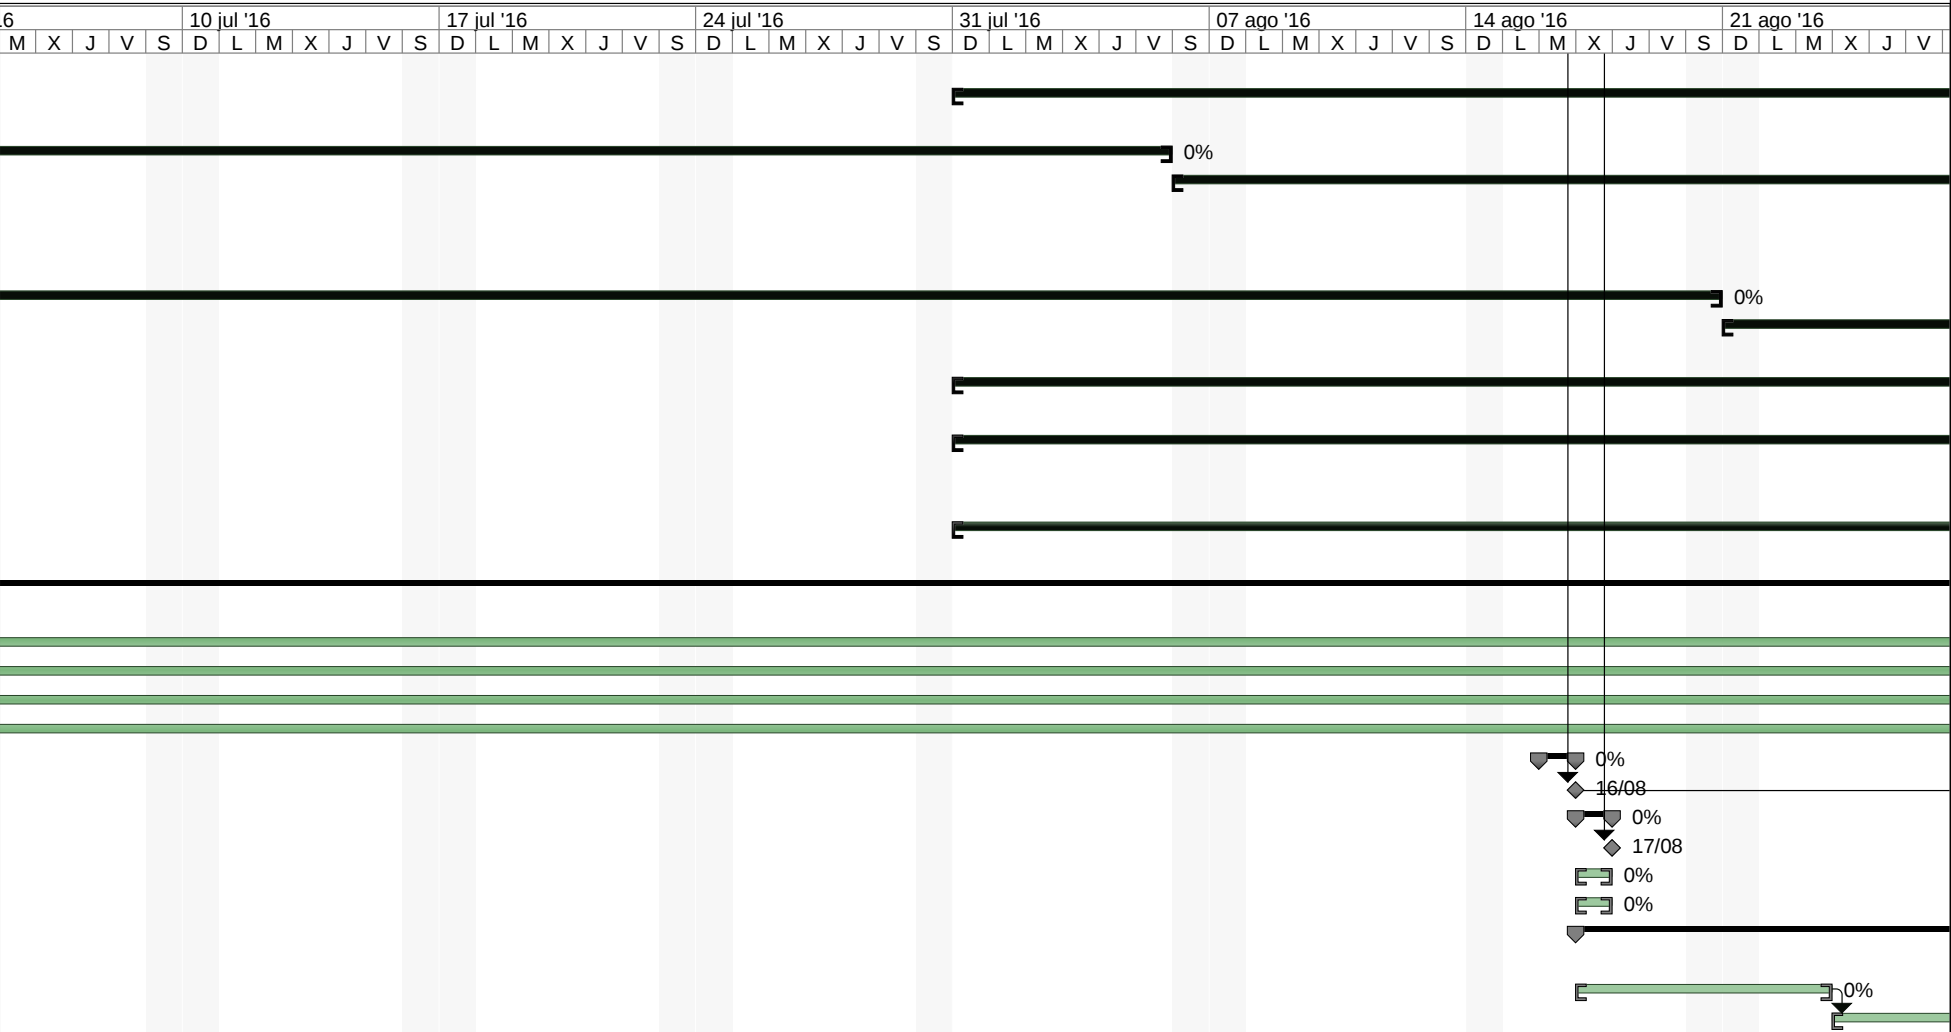

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45368

PT SAT APS-03_v5.mpp

6	10 jul '16										17 jul '16										24 jul '16										31 jul '16										07 ago '16										14 ago '16										21 ago '16									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45369

PT SAT APS-03_v5.mpp

6	10 jul '16										17 jul '16										24 jul '16										31 jul '16										07 ago '16										14 ago '16										21 ago '16									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45370

PT SAT APS-03_v5.mpp

6	10 jul '16										17 jul '16										24 jul '16										31 jul '16										07 ago '16										14 ago '16										21 ago '16									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45371

PT SAT APS-03_v5.mpp

6					10 jul '16							17 jul '16							24 jul '16							31 jul '16							07 ago '16							14 ago '16							21 ago '16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</	



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45372

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45373

[illegible]

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45375

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45376

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible][illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45377

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible][illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45378

PT SAT APS-03_v5.mpp

28 ago '16							04 sep '16							11 sep '16							18 sep '16							25 sep '16							02 oct '16							09 oct '16							16 oct '16																														
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M																																									
0%																																																																															
														0%																																																																	
														0%																																																																	
0%																																																																															
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	
														0%																																																																	



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45379

PT SAT APS-03_v5.mpp


28 ago '16							04 sep '16							11 sep '16							18 sep '16							25 sep '16							02 oct '16							09 oct '16							16 oct '16		
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M													





ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45380

PT SAT APS-03_v5.mpp

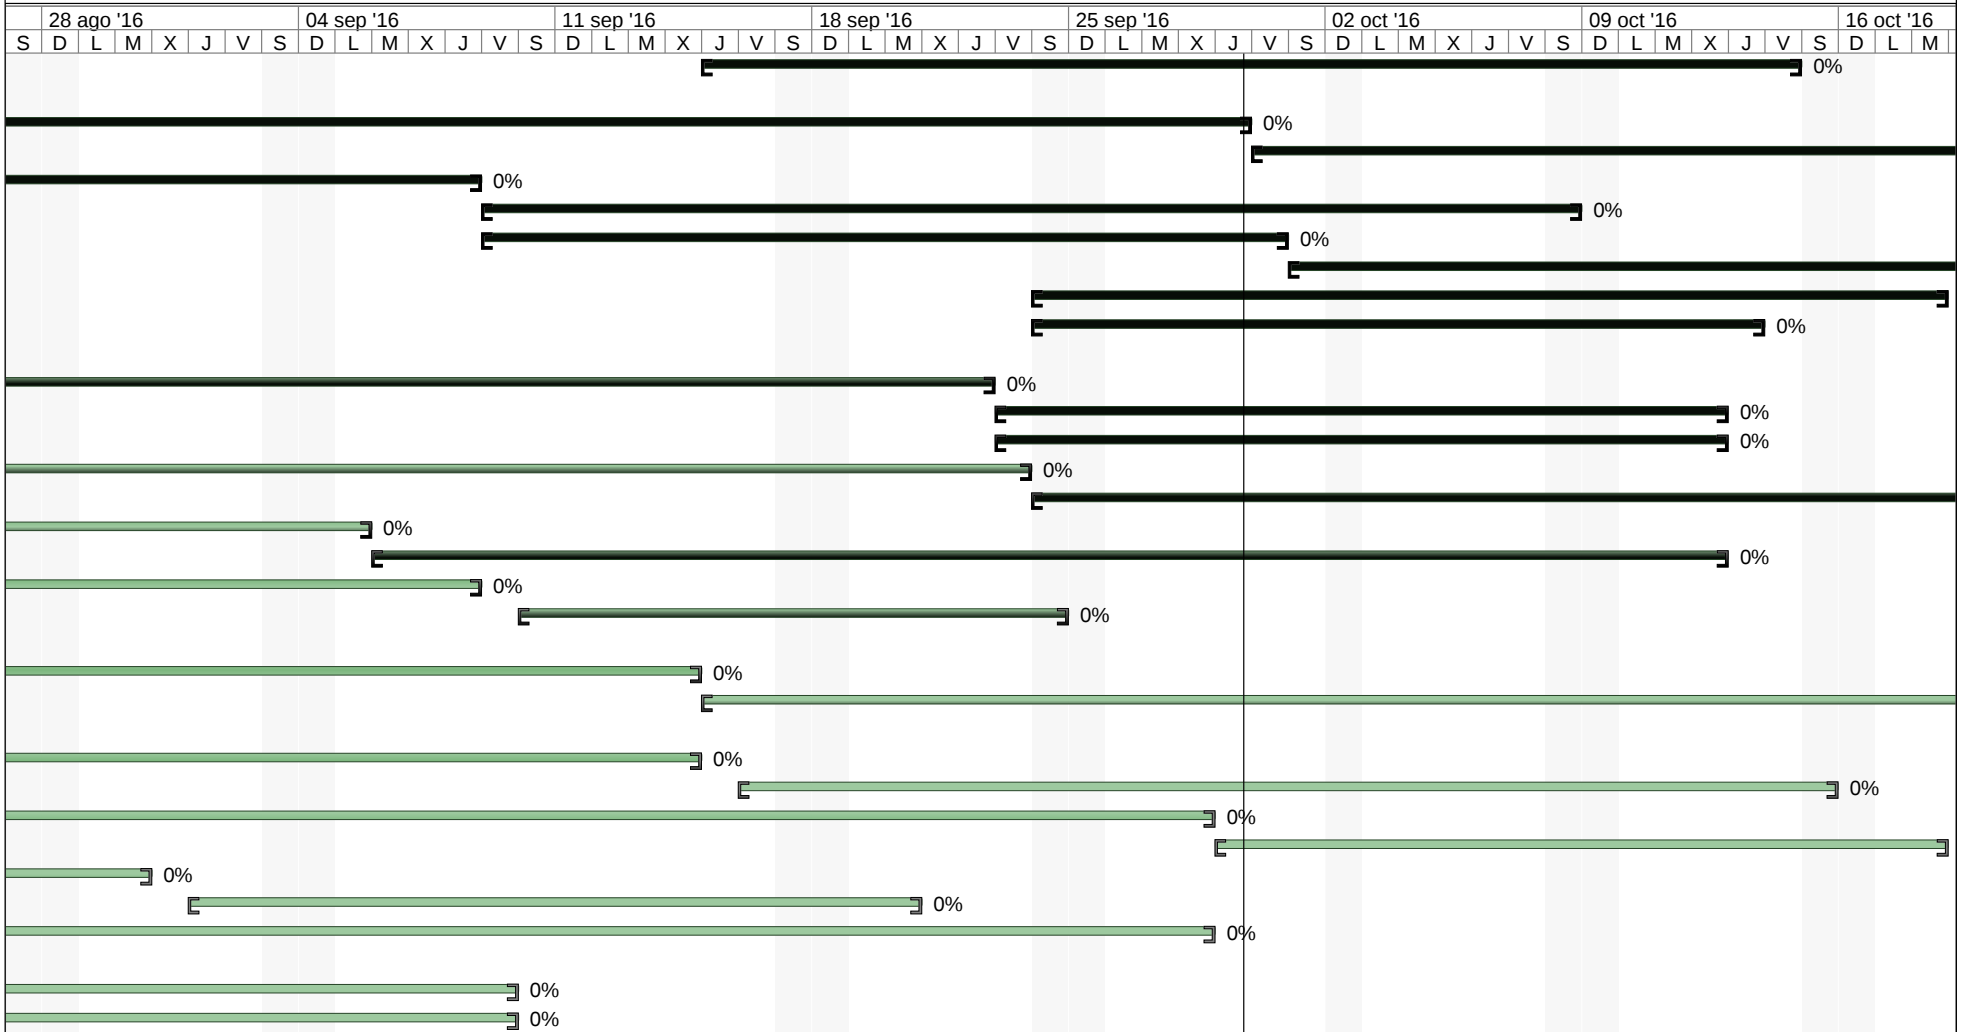


ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

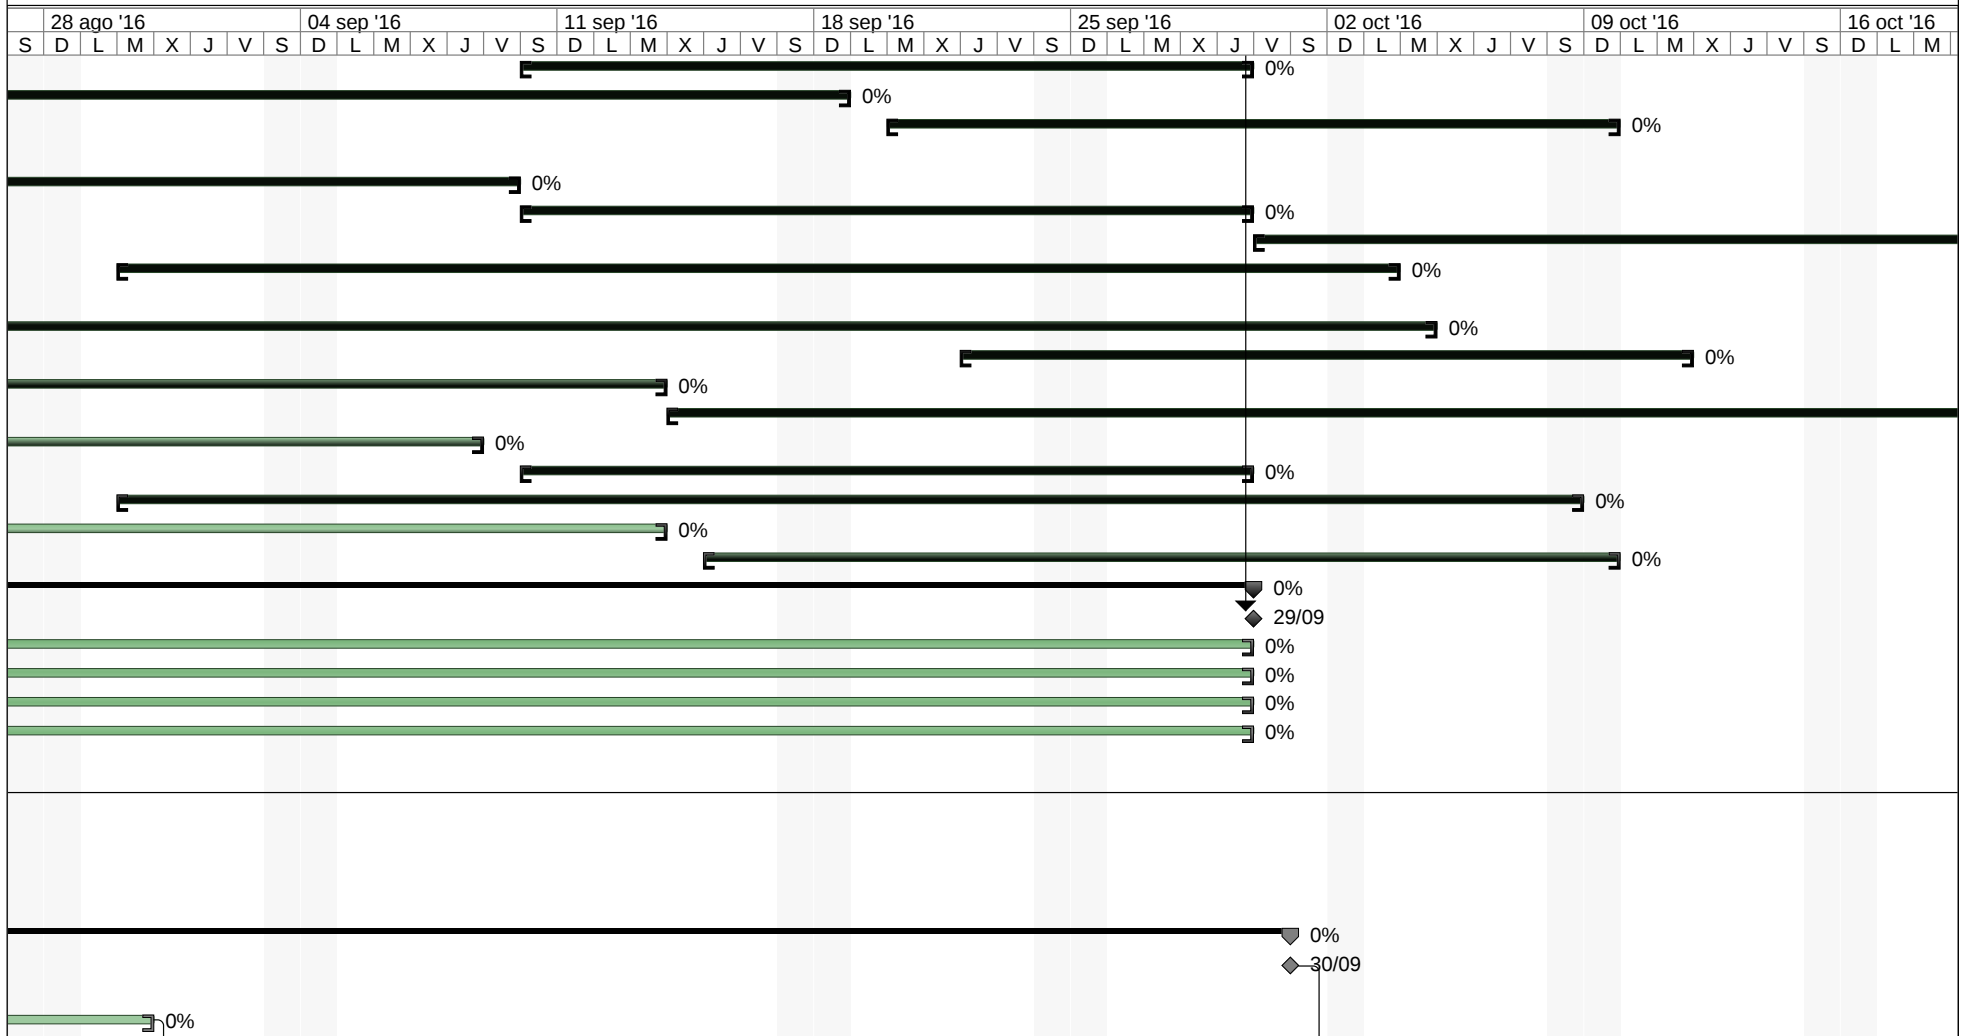

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45382

PT SAT APS-03_v5.mpp

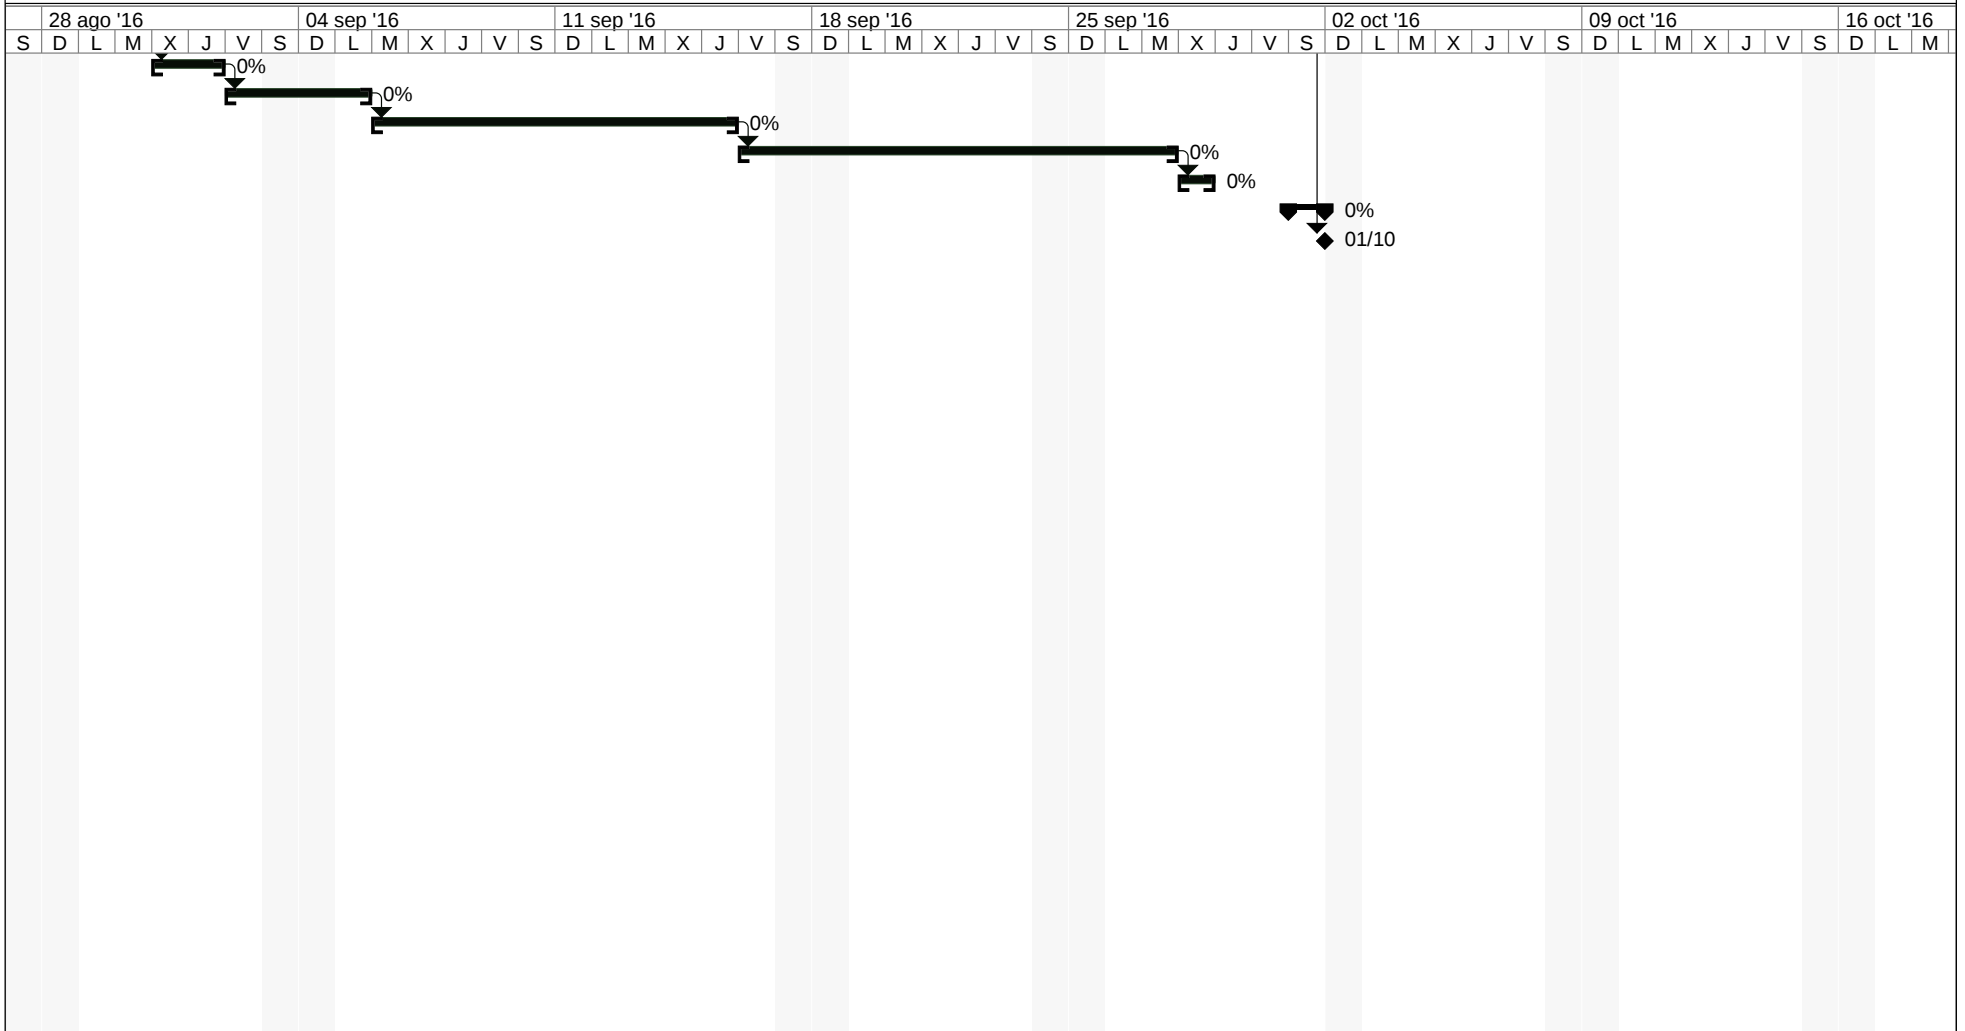

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45383

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45384

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45385

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45386

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45388

[illegible]


ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45390

PT SAT APS-03_v5.mpp

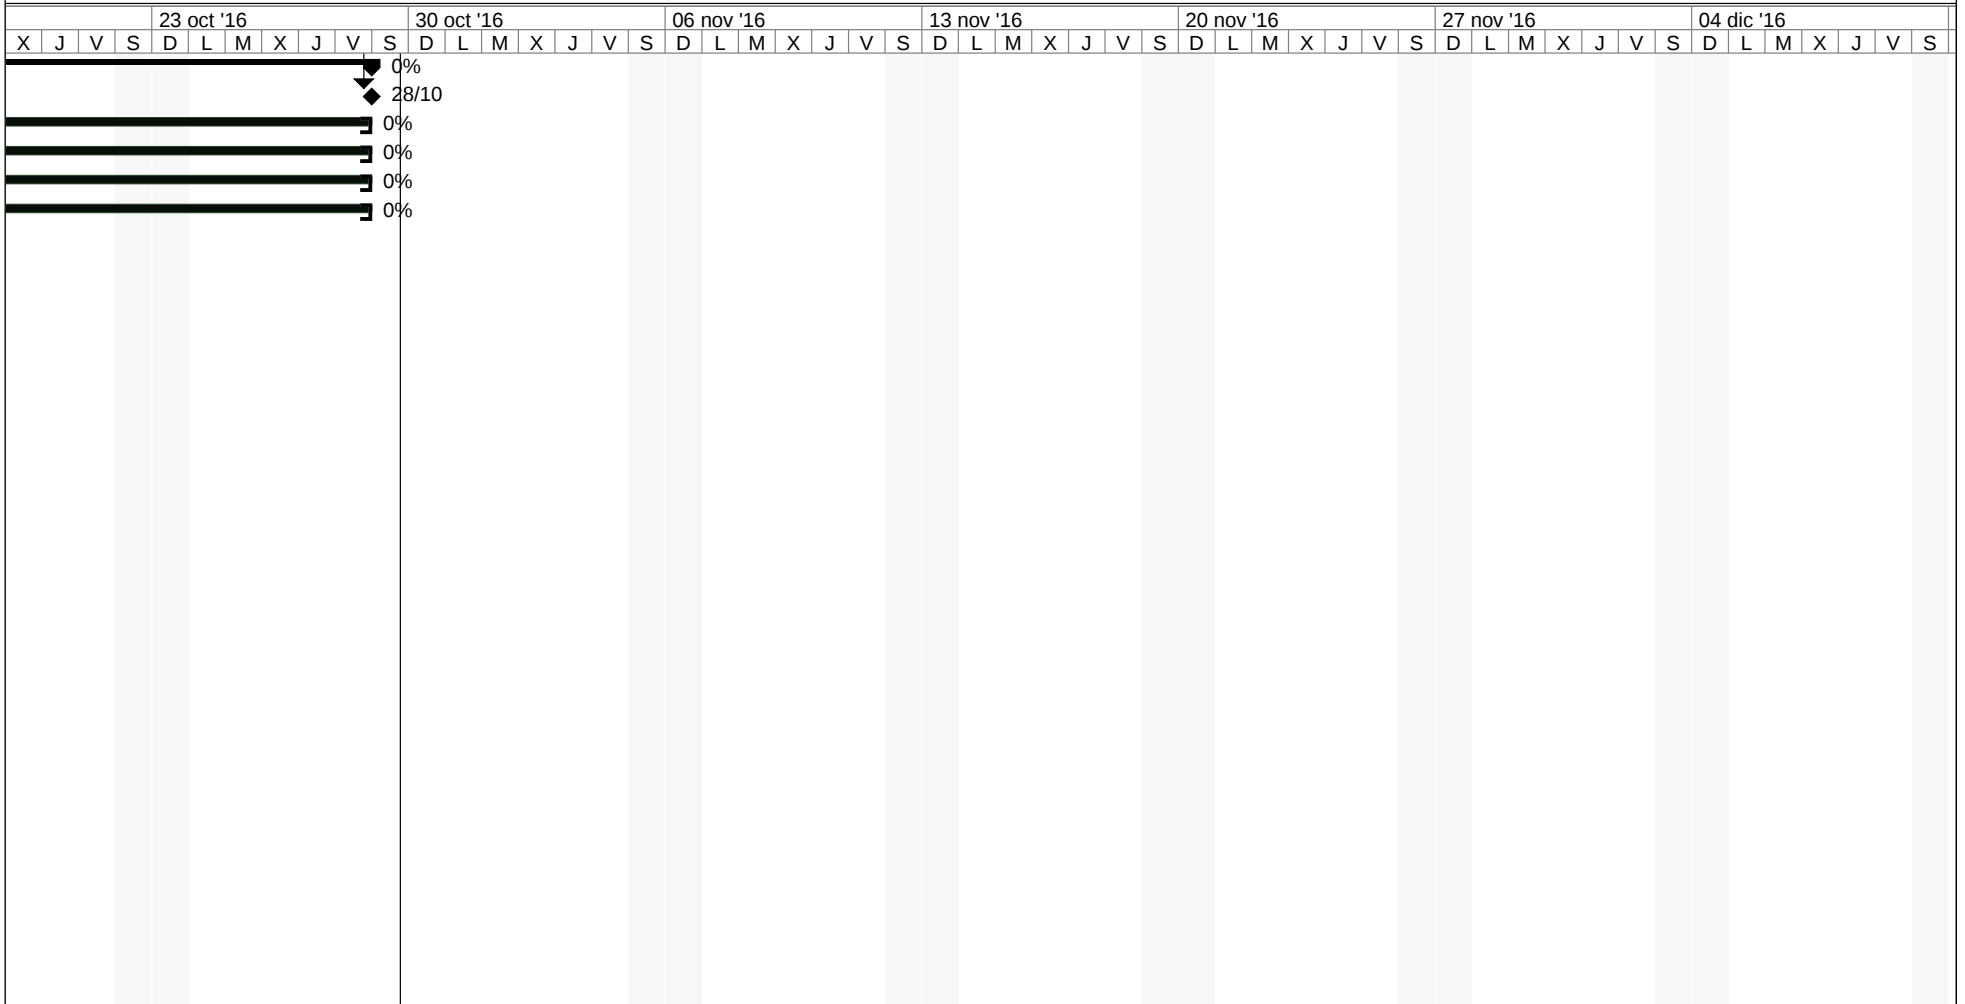

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45392

PT SAT APS-03_v5.mpp




ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45393

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.


PT SAT APS-03_v5.mpp

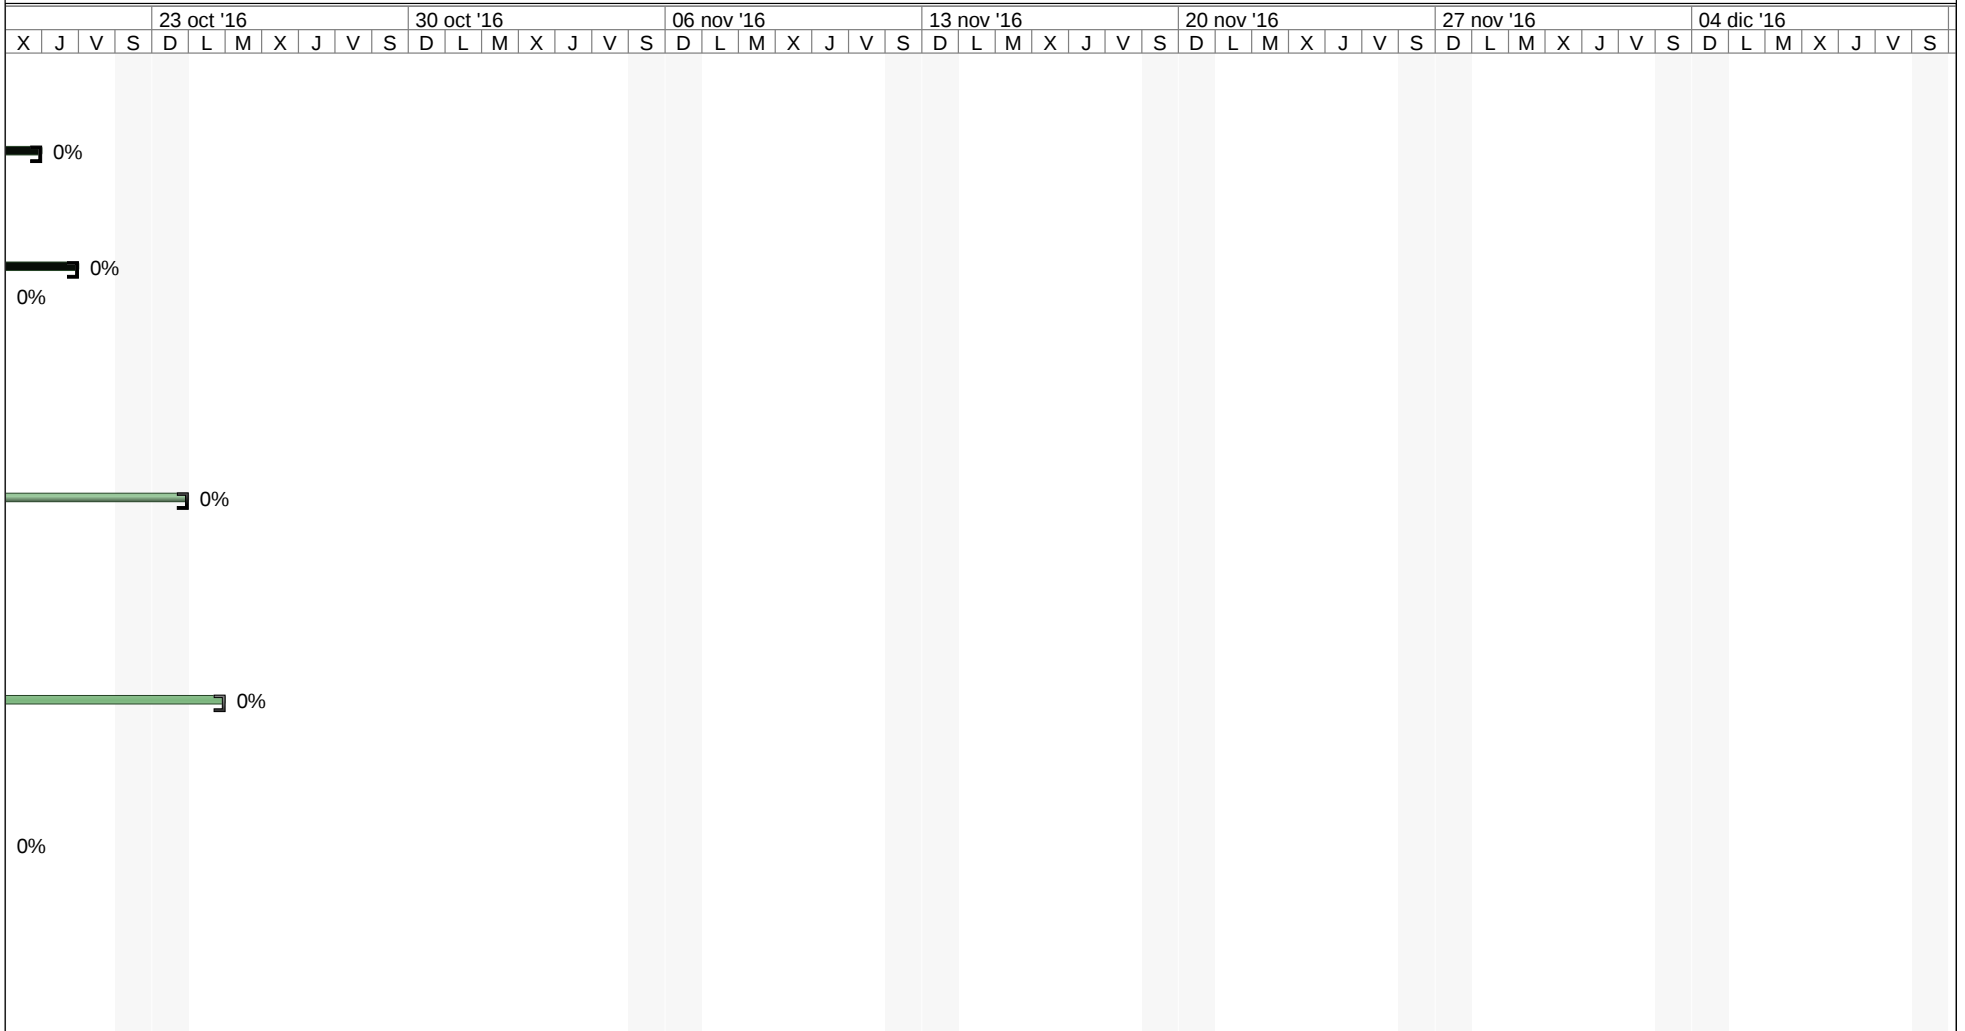

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45395

PT SAT APS-03_v5.mpp

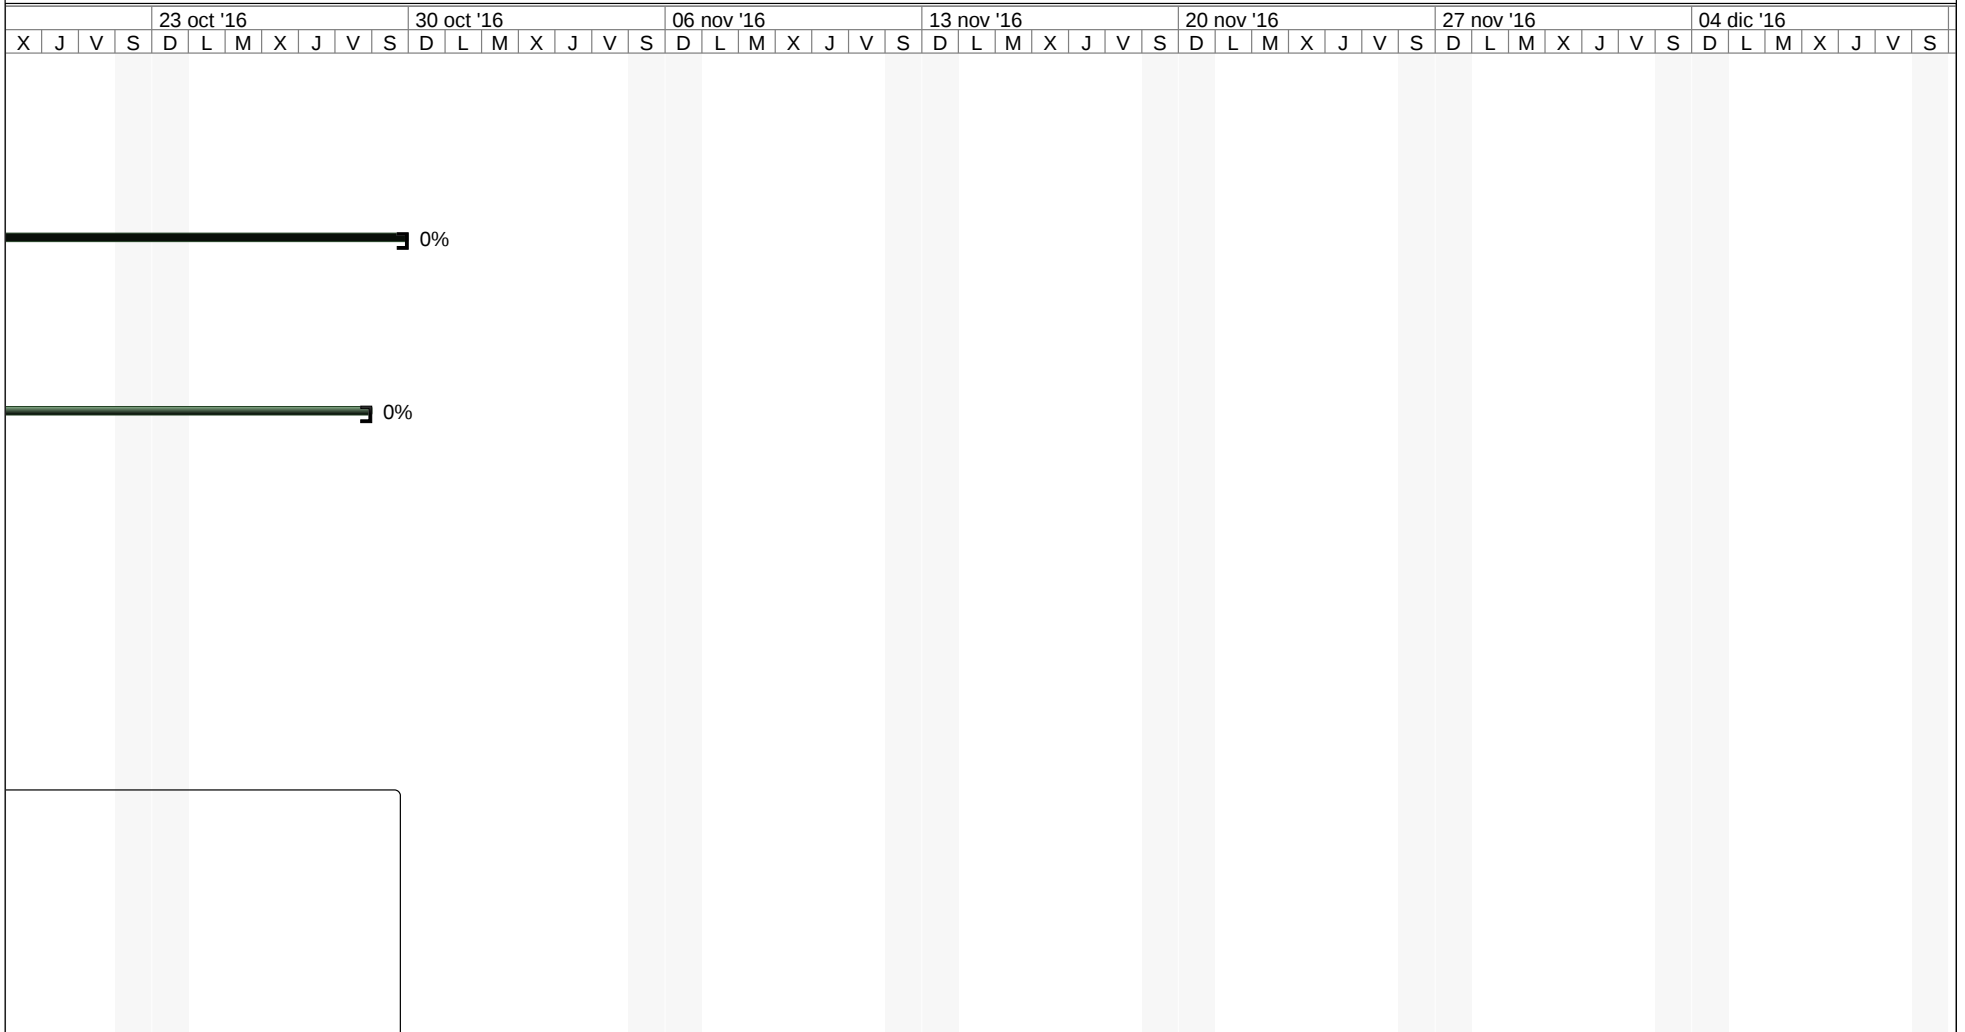

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45399

				23 oct '16				30 oct '16				06 nov '16				13 nov '16				20 nov '16				27 nov '16				04 dic '16			
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45402

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45403

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45404

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45405

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45406

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45407

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45408

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45409

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45410

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The page is divided into sections by margins. The top section features a wide margin at the top, followed by three sets of primary-ruled lines. Each set consists of a solid black top line, a solid green midline, and a solid black bottom line. Below these, there is another wide margin, followed by two more sets of primary-ruled lines. The entire page is overlaid with vertical gray bands of varying widths, which appear to be part of the background or scanning artifacts.

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45411

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible][illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45413

PT SAT APS-03_v5.mpp

11 dic '16							18 dic '16							25 dic '16							01 ene '17							08 ene '17							15 ene '17							22 ene '17							29 ene '17			
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X							



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45414

PT SAT APS-03_v5.mpp

05 feb '17							12 feb '17							19 feb '17							26 feb '17							05 mar '17							12 mar '17							19 mar '17							26 mar '17						
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D			



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45416

			05 feb '17							12 feb '17							19 feb '17							26 feb '17							05 mar '17							12 mar '17							19 mar '17							26 mar '17	
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D								



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5.mpp

			05 feb '17							12 feb '17							19 feb '17							26 feb '17							05 mar '17							12 mar '17							19 mar '17							26 mar '17	
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D								



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45418

PT SAT APS-03_v5.mpp



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45419

			05 feb '17							12 feb '17							19 feb '17							26 feb '17							05 mar '17							12 mar '17							19 mar '17							26 mar '17	
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D								



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5.mpp

			05 feb '17							12 feb '17							19 feb '17							26 feb '17							05 mar '17							12 mar '17							19 mar '17							26 mar '17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45421

PT SAT APS-03_v5.mpp

			05 feb '17							12 feb '17							19 feb '17							26 feb '17							05 mar '17							12 mar '17							19 mar '17							26 mar '17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45423

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible][illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45427

PT SAT APS-03_v5.mpp

			05 feb '17							12 feb '17							19 feb '17							26 feb '17							05 mar '17							12 mar '17							19 mar '17							26 mar '17
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D							



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45428

PT SAT APS-03_v5.mpp

mar '17							02 abr '17							09 abr '17							16 abr '17							23 abr '17							30 abr '17							07 may '17							14 may '17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S</



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45429

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45430

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45431

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45432

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45433

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45434

PT SAT APS-03_v5.mpp

mar '17							02 abr '17							09 abr '17							16 abr '17							23 abr '17							30 abr '17							07 may '17							14 may '17													
L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S	



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45435

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45436

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45437

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45438

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. There are two vertical margin lines, one on the left and one on the right, creating three columns. The central column is wider than the two side margins. The horizontal lines are evenly spaced and extend across the width of the page. The top and bottom edges of the paper are slightly irregular, suggesting it might be a scan of a physical document.

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45439

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45440

PT SAT APS-03_v5.mpp

mar '17						02 abr '17						09 abr '17						16 abr '17						23 abr '17						30 abr '17						07 may '17						14 may '17				
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J								



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45441

PT SAT APS-03_v5.mpp

mar '17							02 abr '17							09 abr '17							16 abr '17							23 abr '17							30 abr '17							07 may '17							14 may '17				
L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J		



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45442

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible][illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45443

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45444

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45445

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45446

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45447

PT SAT APS-03_v5.mpp

		21 may '17							28 may '17							04 jun '17							11 jun '17							18 jun '17							25 jun '17							02 jul '17							09 jul '17		
V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L								



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45448

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45449

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45450

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45451

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.


Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45452

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible][illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45453

[illegible]

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45454

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible][illegible]This image shows a completely blank white rectangular area, which appears to be a scanned document page. It is surrounded by a thin black border. There are no visible markings, text, or figures on the page.

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45455

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45456

PT SAT APS-03_v5.mpp

7	16 jul '17										23 jul '17										30 jul '17										06 ago '17										13 ago '17										20 ago '17										27 ago '17									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45459

PT SAT APS-03_v5.mpp

7	16 jul '17										23 jul '17										30 jul '17										06 ago '17										13 ago '17										20 ago '17										27 ago '17									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45460

PT SAT APS-03_v5.mpp

7	16 jul '17										23 jul '17										30 jul '17										06 ago '17										13 ago '17										20 ago '17										27 ago '17									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45461

PT SAT APS-03_v5.mpp

7	16 jul '17										23 jul '17										30 jul '17										06 ago '17										13 ago '17										20 ago '17										27 ago '17									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45462

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45463

PT SAT APS-03_v5.mpp

7	16 jul '17										23 jul '17										30 jul '17										06 ago '17										13 ago '17										20 ago '17										27 ago '17									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45464

PT SAT APS-03_v5.mpp

7	16 jul '17										23 jul '17										30 jul '17										06 ago '17										13 ago '17										20 ago '17										27 ago '17									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45465

PT SAT APS-03_v5.mpp

7	16 jul '17										23 jul '17										30 jul '17										06 ago '17										13 ago '17										20 ago '17										27 ago '17									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45466

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible][illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45467

7	16 jul '17										23 jul '17										30 jul '17										06 ago '17										13 ago '17										20 ago '17										27 ago '17									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																									



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5.mpp

7					16 jul '17							23 jul '17							30 jul '17							06 ago '17							13 ago '17							20 ago '17							27 ago '17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45470

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45472

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45473

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45474

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45475

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45476

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45477

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45478

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45479

[illegible]

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible][illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45481

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45482

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45484

PT SAT APS-03_v5.mpp

				29 oct '17				05 nov '17				12 nov '17				19 nov '17				26 nov '17				03 dic '17				10 dic '17			
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45498

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45500

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45501

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45502

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45503

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45504

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45505

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45506

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45507

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45508

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45510

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible][illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45511

PT SAT APS-03_v5.mpp

17 dic '17							24 dic '17							31 dic '17							07 ene '18							14 ene '18							21 ene '18							28 ene '18							04 feb '18			
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X							



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45512

PT SAT APS-03_v5.mpp

			11 feb '18							18 feb '18							25 feb '18							04 mar '18							11 mar '18							18 mar '18							25 mar '18							01 apr '18	
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D								



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45514

PT SAT APS-03_v5.mpp

			11 feb '18							18 feb '18							25 feb '18							04 mar '18							11 mar '18							18 mar '18							25 mar '18							01 apr '18	
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D								



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45515

PT SAT APS-03_v5.mpp

			11 feb '18							18 feb '18							25 feb '18							04 mar '18							11 mar '18							18 mar '18							25 mar '18							01 apr '18	
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D								



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45516

PT SAT APS-03_v5.mpp

			11 feb '18							18 feb '18							25 feb '18							04 mar '18							11 mar '18							18 mar '18							25 mar '18							01 apr '18	
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D								



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45517

PT SAT APS-03_v5.mpp

			11 feb '18							18 feb '18							25 feb '18							04 mar '18							11 mar '18							18 mar '18							25 mar '18							01 apr '18	
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D								



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45518

PT SAT APS-03_v5.mpp

			11 feb '18							18 feb '18							25 feb '18							04 mar '18							11 mar '18							18 mar '18							25 mar '18							01 apr '18
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D							



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45519

PT SAT APS-03_v5.mpp

			11 feb '18							18 feb '18							25 feb '18							04 mar '18							11 mar '18							18 mar '18							25 mar '18							01 apr '18	
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D								



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45520

PT SAT APS-03_v5.mpp

			11 feb '18							18 feb '18							25 feb '18							04 mar '18							11 mar '18							18 mar '18							25 mar '18							01 apr '18	
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D								



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45521

PT SAT APS-03_v5.mpp

			11 feb '18							18 feb '18							25 feb '18							04 mar '18							11 mar '18							18 mar '18							25 mar '18							01 apr '18	
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D								



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45522

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible][illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45523

PT SAT APS-03_v5.mpp

			11 feb '18							18 feb '18							25 feb '18							04 mar '18							11 mar '18							18 mar '18							25 mar '18							01 apr '18
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D							



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45526

PT SAT APS-03_v5.mpp

abr '18						08 abr '18						15 abr '18						22 abr '18						29 abr '18						06 may '18						13 may '18						20 may '18				
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J								



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45527

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45528

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45529

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45530

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45531

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45532

PT SAT APS-03_v5.mpp

abr '18							08 abr '18							15 abr '18							22 abr '18							29 abr '18							06 may '18							13 may '18							20 may '18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S	



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45533

PT SAT APS-03_v5.mpp



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45534

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45535

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45536

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible][illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45537

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45538

PT SAT APS-03_v5.mpp

abr '18						08 abr '18						15 abr '18						22 abr '18						29 abr '18						06 may '18						13 may '18						20 may '18				
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J								



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45539

PT SAT APS-03_v5.mpp

abr '18						08 abr '18						15 abr '18						22 abr '18						29 abr '18						06 may '18						13 may '18						20 may '18					
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J		



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45540

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible][illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45541

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45542

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45543

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45544

PT SAT APS-03_v5.mpp

		27 may '18							03 jun '18							10 jun '18							17 jun '18							24 jun '18							01 jul '18							08 jul '18							15 jul '18		
V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L								



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45545

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45546

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45547

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45548

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45549

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45550

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45551

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible][illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45552

[illegible][illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45554

PT SAT APS-03_v5.mpp

8					22 jul '18					29 jul '18					05 ago '18					12 ago '18					19 ago '18					26 ago '18					02 sep '18				
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45555

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45556

PT SAT APS-03_v5.mpp

8	22 jul '18										29 jul '18										05 ago '18										12 ago '18										19 ago '18										26 ago '18										02 sep '18									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45557

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45558

PT SAT APS-03_v5.mpp

8	22 jul '18										29 jul '18										05 ago '18										12 ago '18										19 ago '18										26 ago '18										02 sep '18									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45559

PT SAT APS-03_v5.mpp

8	22 jul '18										29 jul '18										05 ago '18										12 ago '18										19 ago '18										26 ago '18										02 sep '18									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45560

PT SAT APS-03_v5.mpp

8					22 jul '18					29 jul '18					05 ago '18					12 ago '18					19 ago '18					26 ago '18					02 sep '18				
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45561

PT SAT APS-03_v5.mpp

8	22 jul '18										29 jul '18										05 ago '18										12 ago '18										19 ago '18										26 ago '18										02 sep '18									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45562

PT SAT APS-03_v5.mpp

8	22 jul '18										29 jul '18										05 ago '18										12 ago '18										19 ago '18										26 ago '18										02 sep '18									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45563

PT SAT APS-03_v5.mpp

8	22 jul '18										29 jul '18										05 ago '18										12 ago '18										19 ago '18										26 ago '18										02 sep '18									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45564

PT SAT APS-03_v5.mpp

8					22 jul '18					29 jul '18					05 ago '18					12 ago '18					19 ago '18					26 ago '18					02 sep '18				
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45567

PT SAT APS-03_v5.mpp

8					22 jul '18							29 jul '18							05 ago '18							12 ago '18							19 ago '18							26 ago '18							02 sep '18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45568

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45569

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45570

PT SAT APS-03_v5.mpp



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45571

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45572

[illegible]

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45574

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45575

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45576

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45577

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45578

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45579



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45580

PT SAT APS-03_v5.mpp



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45581

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45582

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45584

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45585

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.


Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45590

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45591

[illegible]

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45592

PT SAT APS-03_v5.mpp

				04 nov '18				11 nov '18				18 nov '18				25 nov '18				02 dic '18				09 dic '18				16 dic '18			
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45596

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45597

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]


ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45599

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45600

[illegible]

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45601

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45603

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45604

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45605

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45606

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible][illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45607

PT SAT APS-03_v5.mpp



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45608

PT SAT APS-03_v5.mpp

23 dic '18							30 dic '18							06 ene '19							13 ene '19							20 ene '19							27 ene '19							03 feb '19							10 feb '19			
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45609

PT SAT APS-03_v5.mpp

23 dic '18							30 dic '18							06 ene '19							13 ene '19							20 ene '19							27 ene '19							03 feb '19							10 feb '19			
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X							



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45610

PT SAT APS-03_v5.mpp

			17 feb '19							24 feb '19							03 mar '19							10 mar '19							17 mar '19							24 mar '19							31 mar '19							07 a
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D							



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45612

PT SAT APS-03_v5.mpp

			17 feb '19							24 feb '19							03 mar '19							10 mar '19							17 mar '19							24 mar '19							31 mar '19							07 a
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D							



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45615

PT SAT APS-03_v5.mpp

			17 feb '19								24 feb '19								03 mar '19								10 mar '19								17 mar '19								24 mar '19								31 mar '19								07 apr '19	
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D															



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45616

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45617

PT SAT APS-03_v5.mpp

			17 feb '19							24 feb '19							03 mar '19							10 mar '19							17 mar '19							24 mar '19							31 mar '19							07 a
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D							



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45618

PT SAT APS-03_v5.mpp

			17 feb '19							24 feb '19							03 mar '19							10 mar '19							17 mar '19							24 mar '19							31 mar '19							07 a
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D							



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45619

PT SAT APS-03_v5.mpp

			17 feb '19							24 feb '19							03 mar '19							10 mar '19							17 mar '19							24 mar '19							31 mar '19							07 a
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D														





ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45620

[illegible]

PT SAT APS-03_v5.mpp

			17 feb '19						24 feb '19						03 mar '19						10 mar '19						17 mar '19						24 mar '19						31 mar '19						07 a
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D							



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45623

PT SAT APS-03_v5.mpp

			17 feb '19							24 feb '19							03 mar '19							10 mar '19							17 mar '19							24 mar '19							31 mar '19							07 apr '19
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D							



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45624

PT SAT APS-03_v5.mpp

abr '19						14 abr '19						21 abr '19						28 abr '19						05 may '19						12 may '19						19 may '19						26 may '19				
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J								



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45625

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45626

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45627

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45628

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45629

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45630

PT SAT APS-03_v5.mpp

abr '19							14 abr '19							21 abr '19							28 abr '19							05 may '19							12 may '19							19 may '19							26 may '19																					
L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S	



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45631

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45632

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45633

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45634

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45635

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45636

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45637

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45638

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. There are two vertical red margin lines on each side, creating a central writing area. The paper is oriented vertically and appears to be a standard notebook page.

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45639

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45640

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45641

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45642

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45643

PT SAT APS-03_v5.mpp

02 jun '19								09 jun '19								16 jun '19								23 jun '19								30 jun '19								07 jul '19								14 jul '19								21 jul '19	
V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L												



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45644

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45645

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45646

PT SAT APS-03_v5.mpp

		02 jun '19							09 jun '19							16 jun '19							23 jun '19							30 jun '19							07 jul '19							14 jul '19							21 jul '19	
V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L							



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45647

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45648

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are also vertical margin lines on either side, creating a central writing area. The paper appears to be a standard notebook or ledger page.

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45649

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45650

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible][illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45651

[illegible]

PT SAT APS-03_v5.mpp

9					28 jul '19					04 ago '19					11 ago '19					18 ago '19					25 ago '19					01 sep '19					08 sep '19				
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45653

PT SAT APS-03_v5.mpp



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45654

PT SAT APS-03_v5.mpp



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45655

PT SAT APS-03_v5.mpp

9	28 jul '19										04 ago '19										11 ago '19										18 ago '19										25 ago '19										01 sep '19										08 sep '19									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45658

PT SAT APS-03_v5.mpp

9						28 jul '19										04 ago '19										11 ago '19										18 ago '19										25 ago '19										01 sep '19										08 sep '19				
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																									



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45659

PT SAT APS-03_v5.mpp

9	28 jul '19										04 ago '19										11 ago '19										18 ago '19										25 ago '19										01 sep '19										08 sep '19									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45660

PT SAT APS-03_v5.mpp

9	28 jul '19										04 ago '19										11 ago '19										18 ago '19										25 ago '19										01 sep '19										08 sep '19									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45661

PT SAT APS-03_v5.mpp

9	28 jul '19										04 ago '19										11 ago '19										18 ago '19										25 ago '19										01 sep '19										08 sep '19									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45662

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible][illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45663

PT SAT APS-03_v5.mpp

9					28 jul '19							04 ago '19							11 ago '19							18 ago '19							25 ago '19							01 sep '19							08 sep '19						
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V								



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45666

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45668

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45669

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45670

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45671

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45672

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45673

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45674

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45675

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45676

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45677

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible][illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45678

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45680

PT SAT APS-03_v5.mpp

				10 nov '19				17 nov '19				24 nov '19				01 dic '19				08 dic '19				15 dic '19				22 dic '19			
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S

0%

0%



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45681

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45683

PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.


PT SAT APS-03_v5.mpp

[illegible]

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45691

PT SAT APS-03_v5.mpp

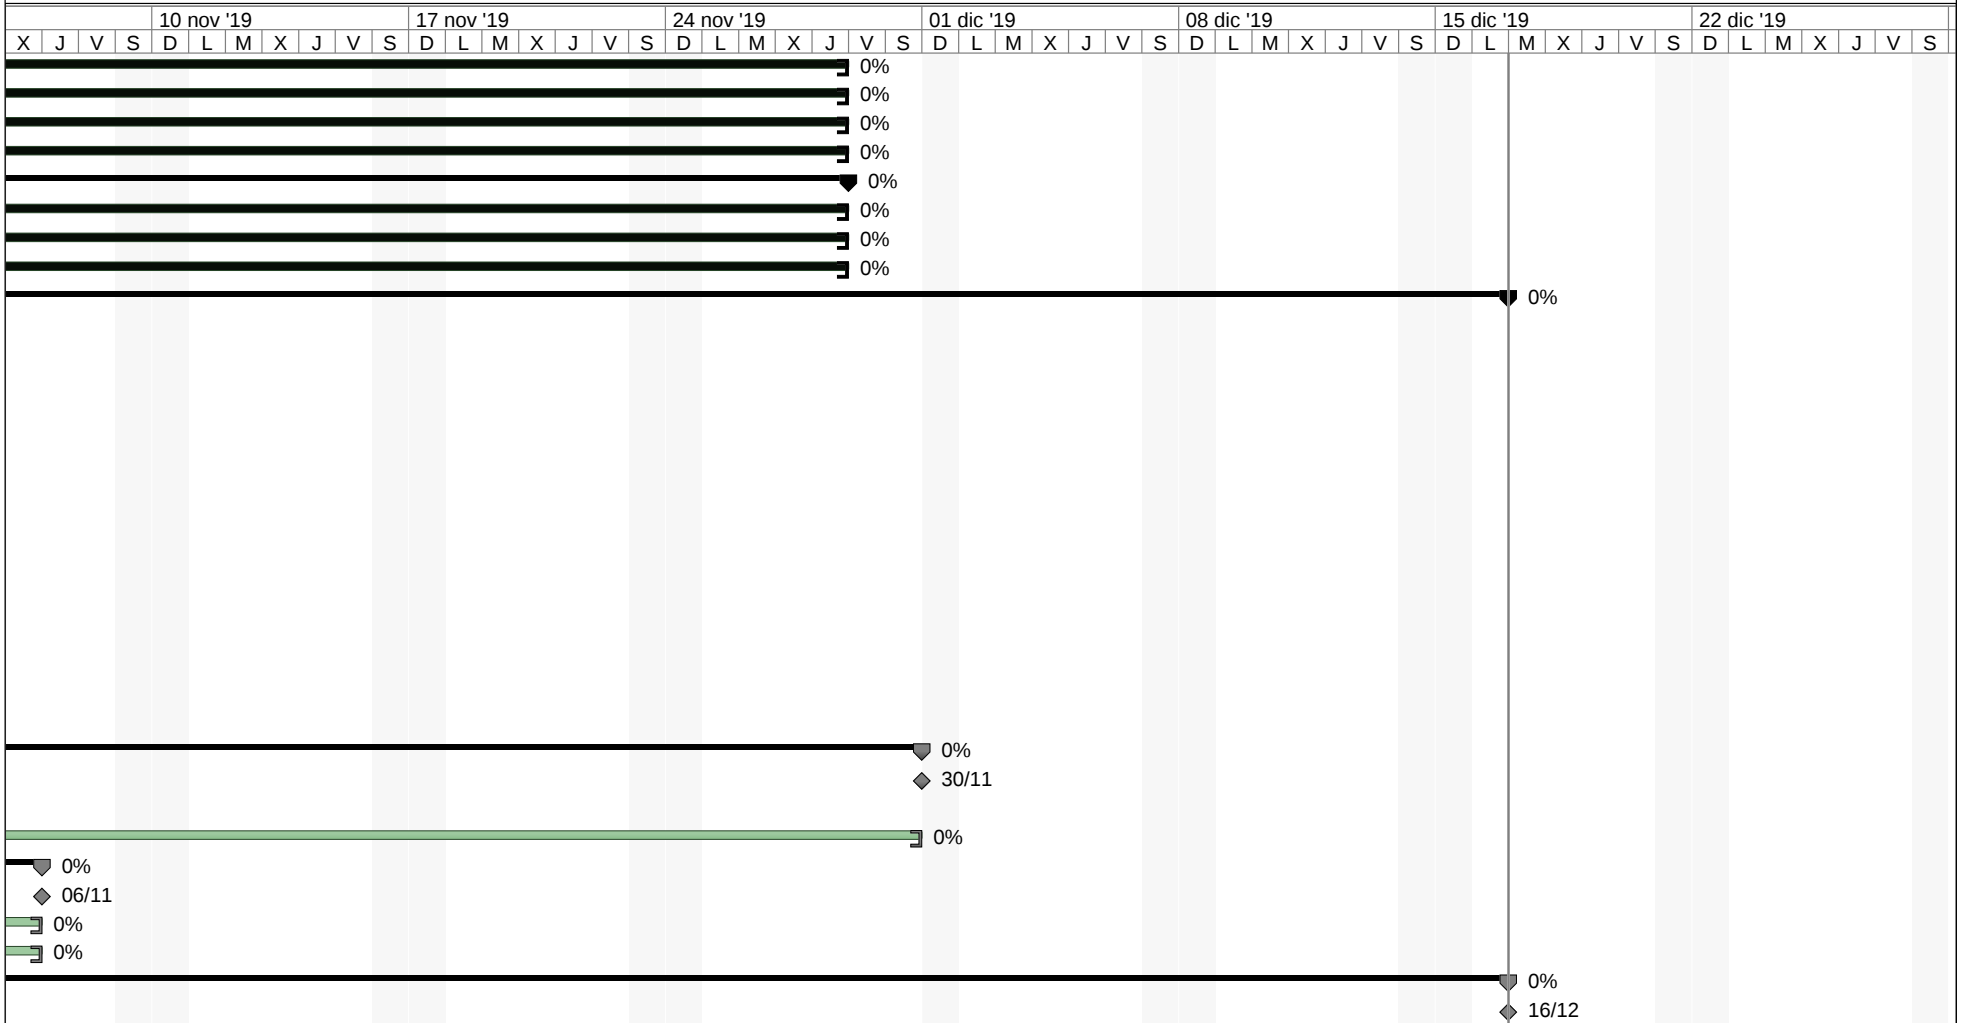

ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

PT SAT APS-03_v5.mpp

				10 nov '19				17 nov '19				24 nov '19				01 dic '19				08 dic '19				15 dic '19				22 dic '19			
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S

0%
0%
0%



ESTE PLAN DE TRABAJO TIENE FINES DE EVALUACIÓN CON LA INFORMACION DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN, POR LO CUAL Y DE COMÚN ACUERDO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES Y NO DEBERÁ TOMARSE COMO DEFINITIVO.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 45694
