

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Texto1	'16				
									M	X	J	V	
1			Administración de Puestos de Servicio 3 (APS-3)	1276 días	mar 31/05/16	jue 28/11/19							
2			Fallo de licitación	0.33 días	mar 31/05/16	mar 31/05/16		SAT					
3			Fase de Planificación	74 días	mar 31/05/16	sáb 13/08/16							
4			ID-1 Presentación Lider y equipo de trabajo	0.17 días	mié 01/06/16	mié 01/06/16	2	Lideres THEOS,SAT_Ac					
5			ID-2 Reunión Inicial acordar actividades previas a mesas de planeación	0.33 días	mié 01/06/16	mié 01/06/16	2	Administradores SAT,Administradores					
6			ID-3 Implementar la gestion de conexión a terceros	74 días	mar 31/05/16	sáb 13/08/16		SAT,Servicios profesionales THEOS					
7			ID-4 Implementar los servidores de gestion de activos y herramienta de administración remota de activos	25 días	sáb 04/06/16	mié 29/06/16		THEOS Consultoria,Personal_					
8			ID-5 Entrega de muestras para generar imagen base	0.2 días	lun 06/06/16	lun 06/06/16	2FC+6 días	THEOS_Logistica					
9			ID-6 Realizar las mesas de planeación y programación entre SAT, terceros y THEOS	7 días	lun 06/06/16	lun 13/06/16	2FC+6 días	Administradores SAT,Administradores					
10			ID-7 Verificar cumplimiento de especificaciones técnicas de los PS y accesorios propuestos	7 días	mar 07/06/16	mar 14/06/16	8FC+1 día	SAT					
11			ID-8 Construir imágenes base de los perfiles de PS	7 días	mar 07/06/16	mar 14/06/16	8FC+1 día	THEOS Consultoria,Personal_					
12			ID-9 Habilitar la mesa de servicio temporal	8.42 días	mar 14/06/16	mié 22/06/16	9	SAT,Servicios profesio					
13			ID-10 Entregar matriz de implementación	0.2 días	mar 14/06/16	mar 14/06/16	9	SAT_Administrador					
14			ID-11 Entregar la versión complemento al programa de trabajo general detallado	0.2 días	mar 14/06/16	mar 14/06/16	9	THEOS_Lider proyecto					

Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Texto1	'16				
									M	X	J	V	
15			ID-12 Analizar y revisar las actividades complementarias al programa de trabajo general	6 días	mar 14/06/16	lun 20/06/16	14	Administradores SAT,Administradores THEOS					
16			ID-13 Entregar imágenes base de los perfiles de PS	0.33 días	mié 15/06/16	mié 15/06/16	11	THEOS					
17			ID-14 Construir imágenes de implementación de PS	6 días	mié 15/06/16	mar 21/06/16	16	THEOS Consultoria,Personal_					
18			ID-15 Aceptar las actividades complementarias y liberar el programa de trabajo general detallado ajustado	1 día	lun 20/06/16	mar 21/06/16	15	SAT_Administrador,Th proyecto					
19			ID-16 Realizar prueba piloto del proceso de implementación en al menos 2 inmuebles	4.09 días	mar 21/06/16	sáb 25/06/16	17	THEOS Consultoria,Personal_					
20			ID-17 Probar PS en al menos 2 inmuebles en ambiente operativo con la cantidad que se menciona en la sección 3.4.1	5 días	sáb 25/06/16	jue 30/06/16	19	Administradores SAT,Administradores THEOS					
21			FASE DE IMPLEMENTACIÓN	122 días	mié 29/06/16	sáb 29/10/16							
22			ID-18 Establecer la documentación del control operativo	120 días	jue 30/06/16	vie 28/10/16	20	Administradores SAT,Administradores					
23			ID-19 Implementar esquema de integración herramienta de gestión de activos del licitante adjudicado con SITE	30 días	mié 29/06/16	vie 29/07/16	7	SAT; THEOS					
24			ID-20 Implementar la plataforma de PS (De acuerdo al plan de despliegue e implementación del apéndice 3)	120 días	jue 30/06/16	vie 28/10/16	20	SAT; THEOS					
25			ID-21 Iniciar la estabilización del servicio	88 días	jue 30/06/16	lun 26/09/16	20	SAT; THEOS					
26			ID-22 Liberar conexión a terceros	1 día	sáb 13/08/16	dom 14/08/16	6	SAT; THEOS					

Proyecto: Plan de trabajo APS-3
Fecha: lun 13/06/16

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Texto1	'16				
									M	X	J	V	
27			ID-23 Liberar el esquema de integración herramienta de gestion de activos del licitante adjudicado con SITE	1 día	vie 29/07/16	sáb 30/07/16	23	THEOS					
28			ID-24 Implementar y realizar pruebas integrales del esquema de integración con la mesa de servicio SAT	45 días	dom 31/07/16	mié 14/09/16	27	SAT; THEOS					
29			ID-25 Liberar esquema de integración con la mese de servicio	1 día	mié 14/09/16	jue 15/09/16	28	THEOS					
30			ID-26 Entregar la documentación del control operativo	1 día	vie 28/10/16	sáb 29/10/16	22	SAT; THEOS					
31			FASE DE EJECUCIÓN Y CONTROL	1125 días	sáb 29/10/16	jue 28/11/19							
32			ID-27 Aplicar las gestorias del servicio	1125 días	sáb 29/10/16	jue 28/11/19	24	SAT; THEOS					
33			ID-28 Aplicar la medición del cumplimiento del servicio y entregables peridicos y bajo demanda	1125 días	sáb 29/10/16	jue 28/11/19	24	SAT; THEOS					
34			FASE DE CIERRE	304 días	lun 28/01/19	jue 28/11/19							
35			ID-29 Elaborar lista de verificación (checklist) de las actividades y documentos necesarios para el cierre de contrato	304 días	lun 28/01/19	jue 28/11/19		SAT; THEOS					
36			ID-30 Conformar libro blanco	304 días	lun 28/01/19	jue 28/11/19	35CC	SAT					
37			ID-31 Definir la donación de perfiles	20 días	vie 29/03/19	jue 18/04/19	35CC+60 días	SAT; THEOS					
38			ID-32 Entregar plan de retiro de equipo para los perfiles que aplique	1 día	dom 28/04/19	lun 29/04/19	35CC+90 días	THEOS					
39			ID-33 Retirar los perfiles que así fueron definidos	205 días	dom 05/05/19	mar 26/11/19	38FC+6 días	THEOS					

Proyecto: Plan de trabajo APS-3
Fecha: lun 13/06/16

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Texto1	'16				
									M	X	J	V	
40			ID-34 Verificar el cumplimiento del checklist de actividades y documentos de cierre	4 días	vie 22/11/19	mar 26/11/19	39FC-4 días	SAT; THEOS					
41			ID-35 validar último mes de niveles de servicio y firmar acta de entrega de los servicios	45 días	sáb 12/10/19	mar 26/11/19	40FC-45 días	SAT; THEOS					

Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

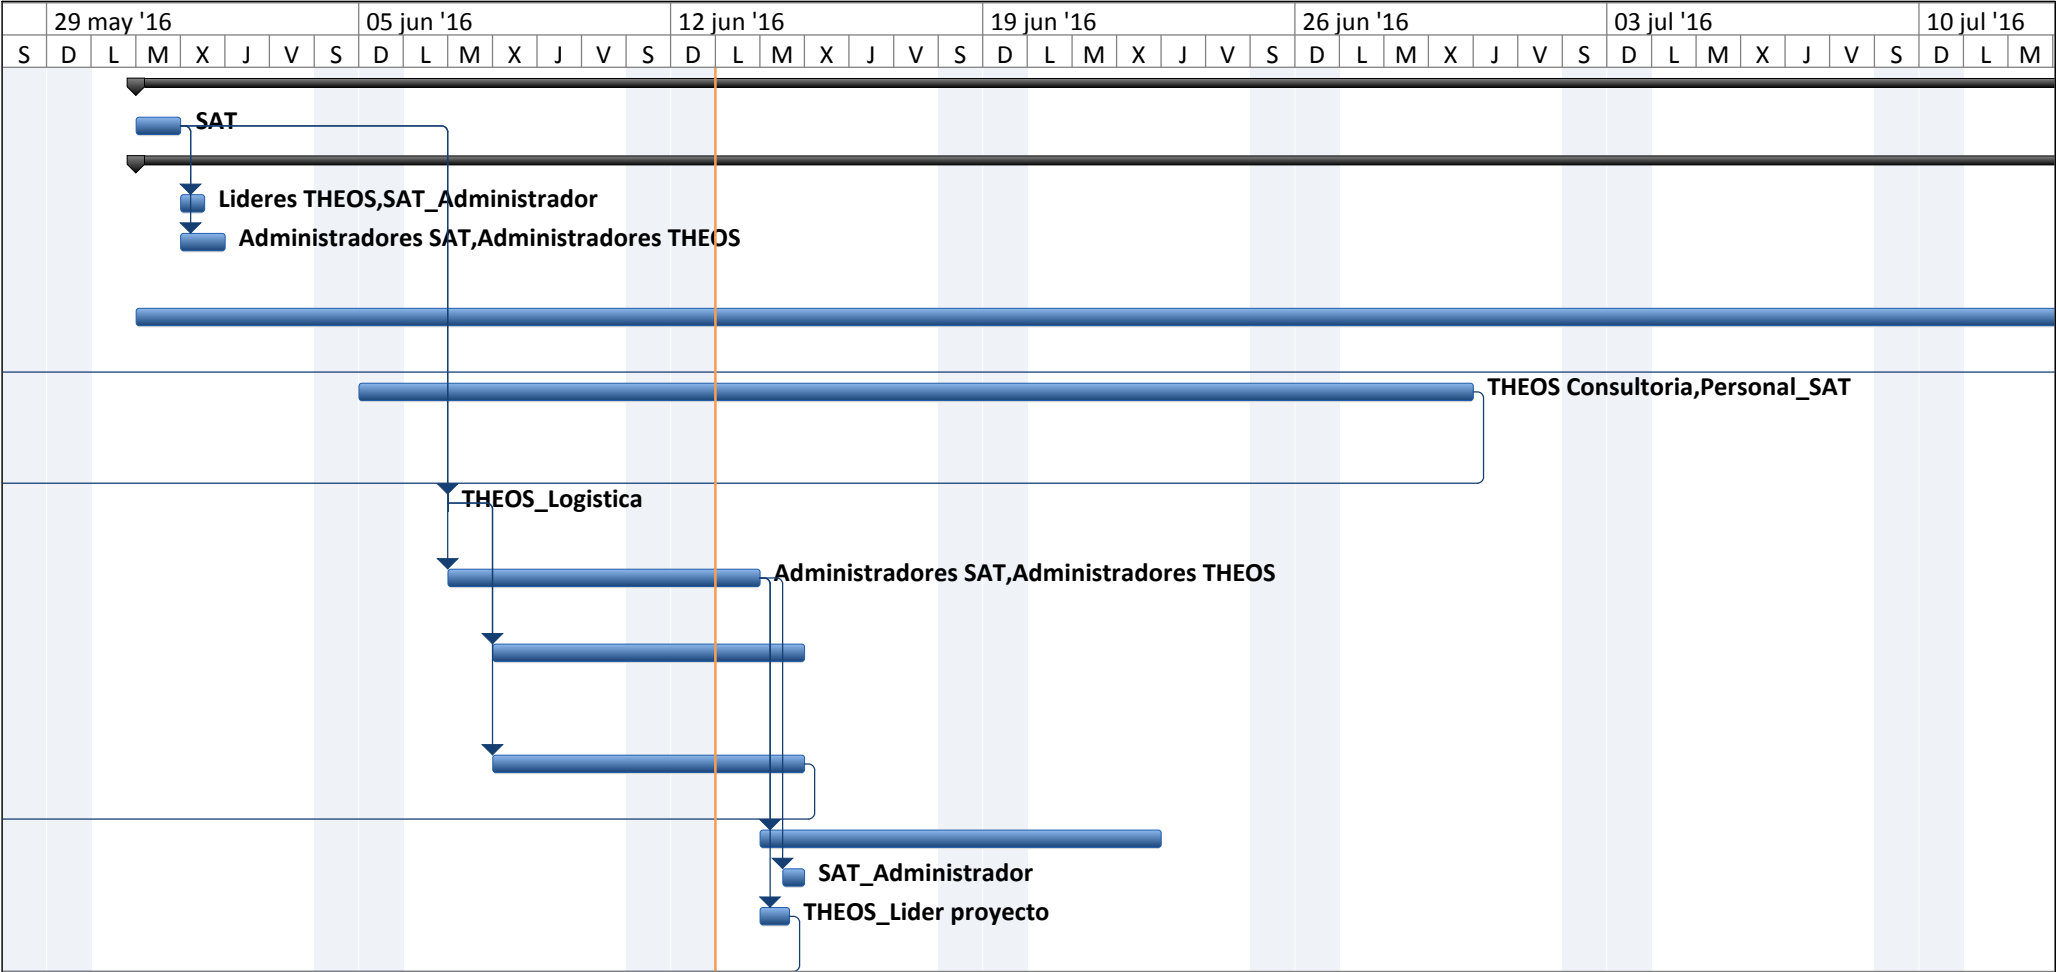

Proyecto: Plan de trabajo APS-3
Fecha: lun 13/06/16

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

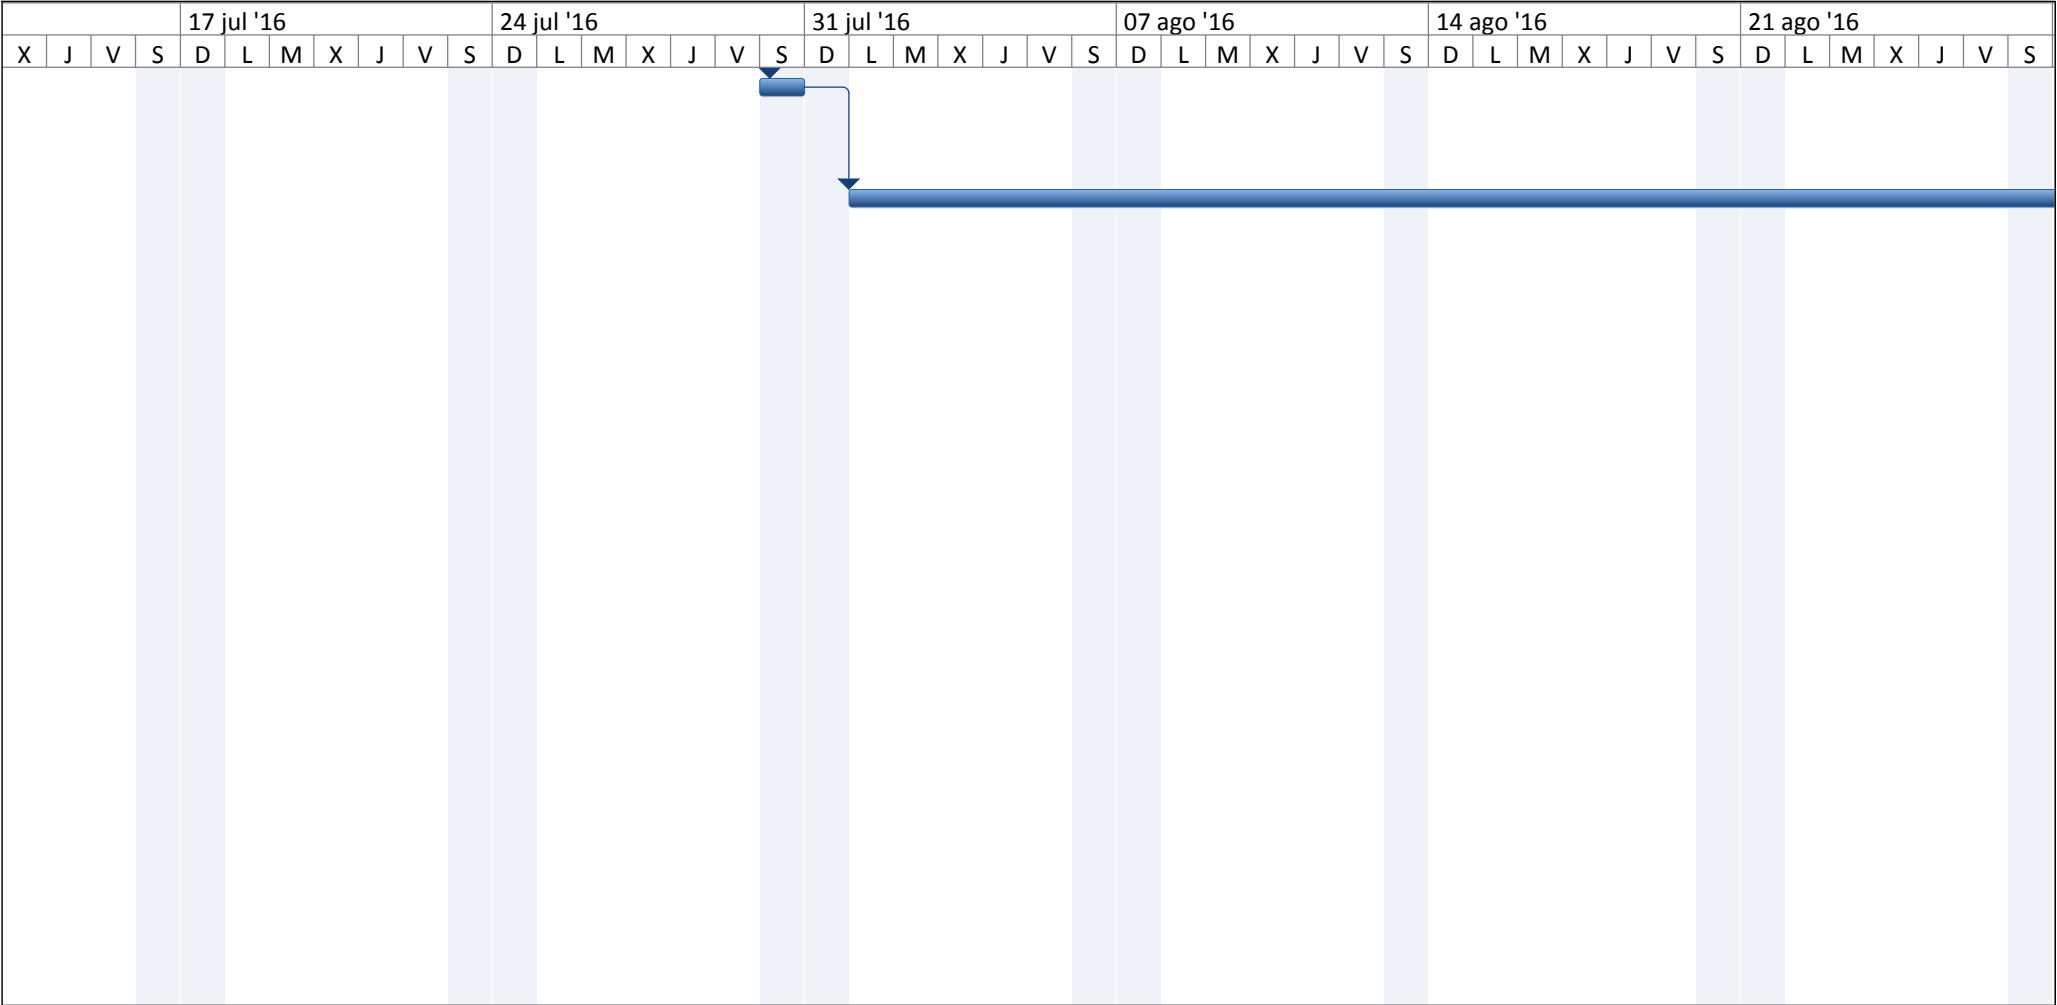

Proyecto: Plan de trabajo APS-3
Fecha: lun 13/06/16

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

				17 jul '16								24 jul '16								31 jul '16								07 ago '16								14 ago '16								21 ago '16							
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S													



Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

28 ago '16

D L M X J V S

04 sep '16

D L M X J V S

11 sep '16

D L M X J V S

18 sep '16

D L M X J V S

25 sep '16

D L M X J V S

02 oct '16

D L M X J V S

09 oct '16

D L M X

Proyecto: Plan de trabajo APS-3

Fecha: lun 13/06/16

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual


Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

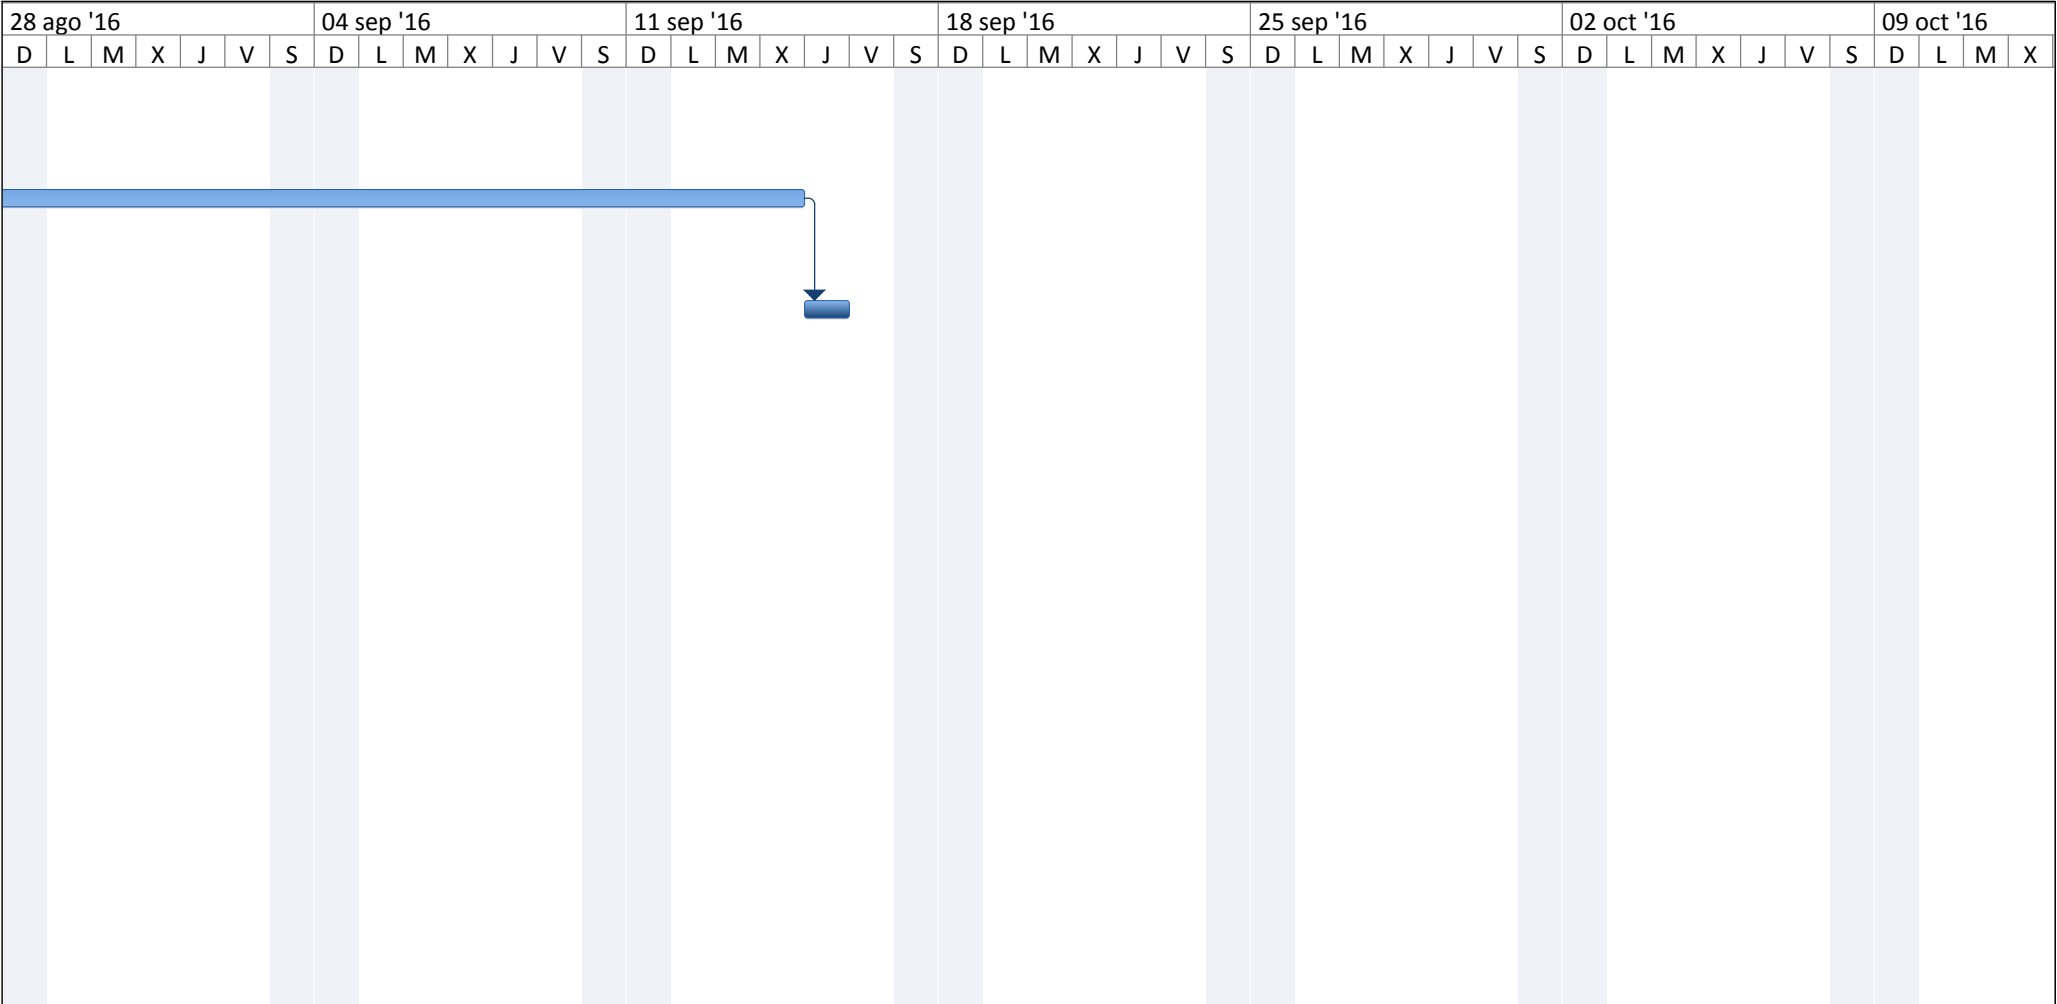

Proyecto: Plan de trabajo APS-3
Fecha: lun 13/06/16


Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

28 ago '16							04 sep '16							11 sep '16							18 sep '16							25 sep '16							02 oct '16							09 oct '16			
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X




Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

16 oct '16				23 oct '16				30 oct '16				06 nov '16				13 nov '16				20 nov '16				27
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D

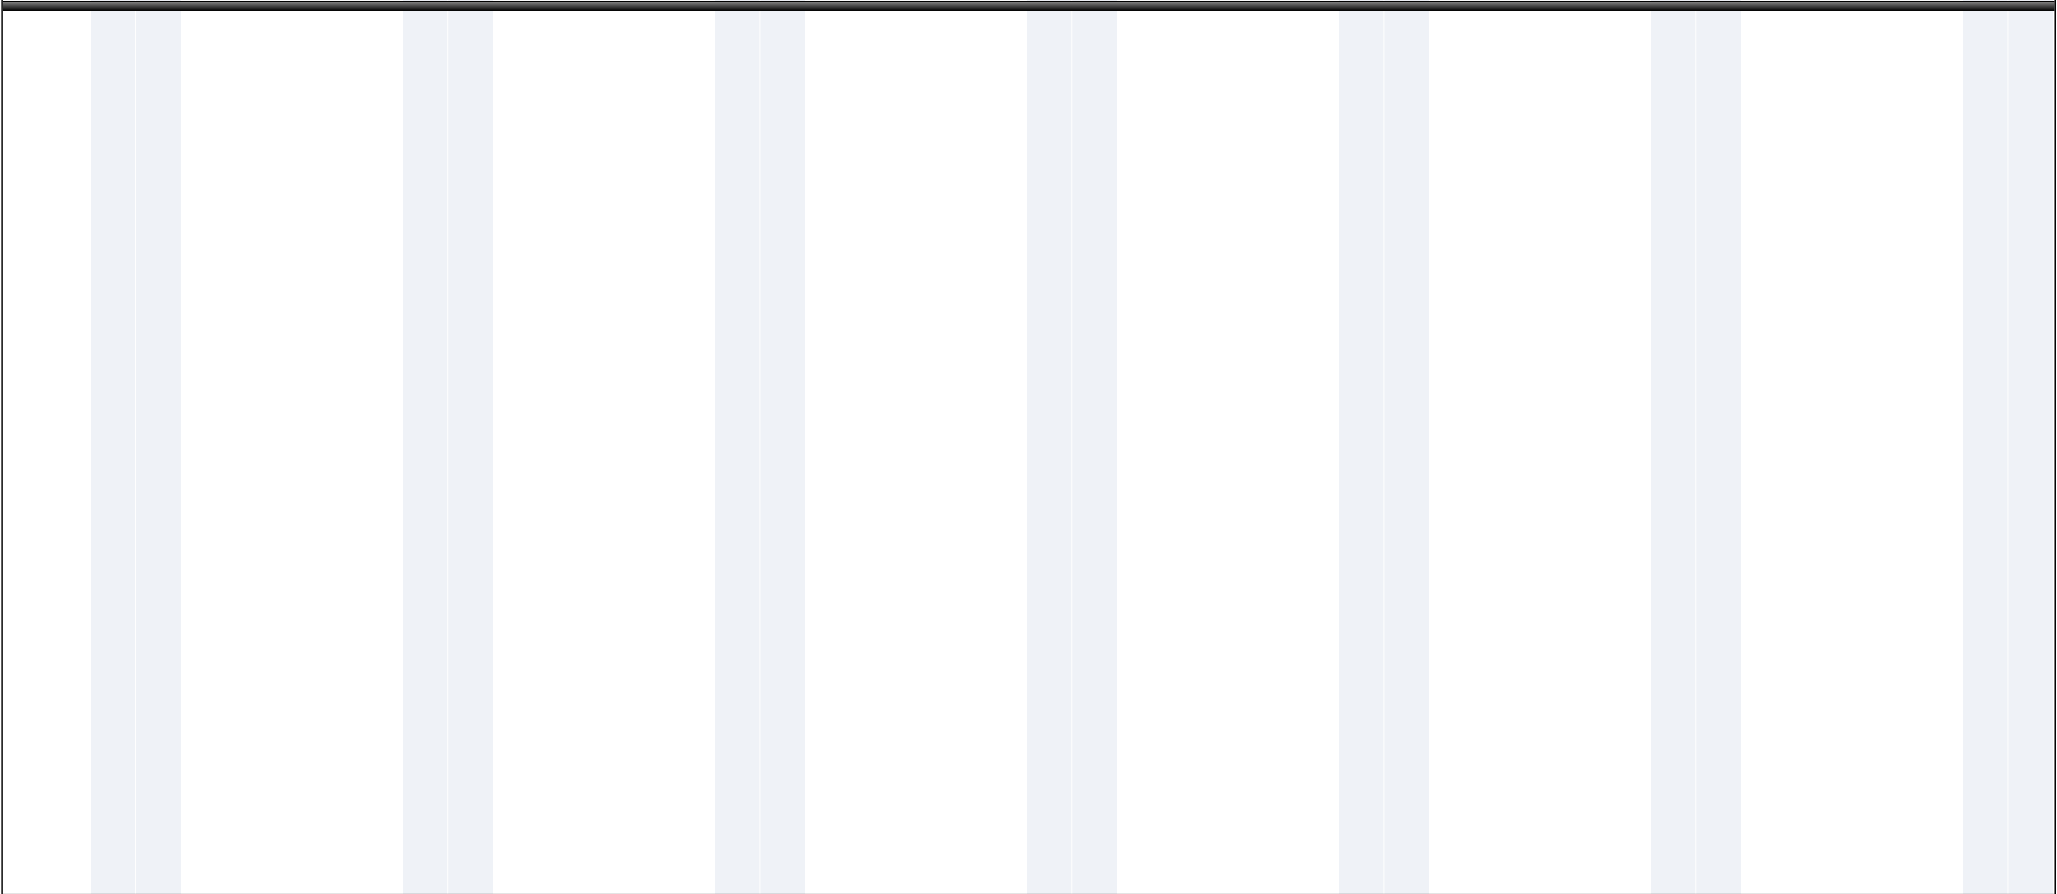

Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

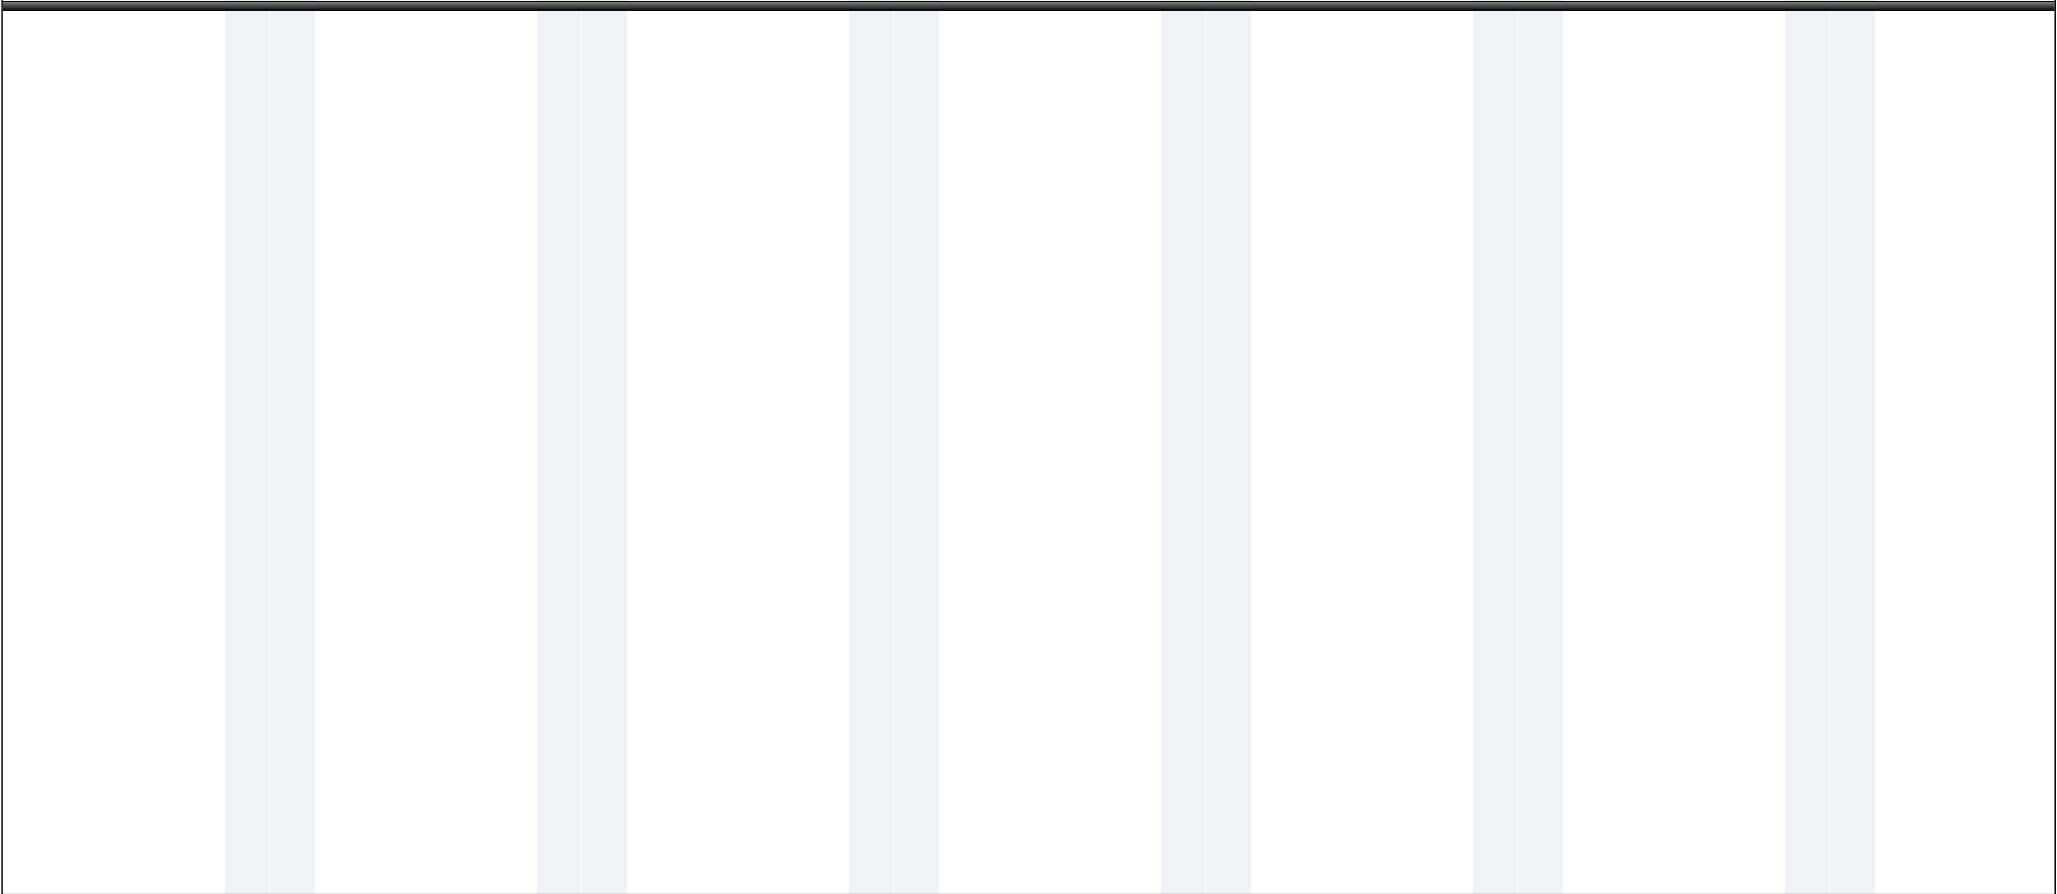

Proyecto: Plan de trabajo APS-3
Fecha: lun 13/06/16

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

nov '16							04 dic '16							11 dic '16							18 dic '16							25 dic '16							01 ene '17							08 ene '17				
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J								

Proyecto: Plan de trabajo APS-3

Fecha: lun 13/06/16

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

nov '16							04 dic '16							11 dic '16							18 dic '16							25 dic '16							01 ene '17							08 ene '17				
L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J			



Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

~~Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 53150~~

		15 ene '17							22 ene '17							29 ene '17							05 feb '17							12 feb '17							19 feb '17							26 feb '17		
V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L								

Proyecto: Plan de trabajo APS-3

Fecha: lun 13/06/16

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

		15 ene '17								22 ene '17								29 ene '17								05 feb '17								12 feb '17								19 feb '17								26 feb '17		
V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L							



Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

17	05 mar '17					12 mar '17					19 mar '17					26 mar '17					02 abr '17					09 abr '17					
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V



Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

17					05 mar '17					12 mar '17					19 mar '17					26 mar '17					02 abr '17					09 abr '17									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	

Proyecto: Plan de trabajo APS-3

Fecha: lun 13/06/16

- | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|
| Tarea |  | Hito externo |  | Informe de resumen manual |  |
| División |  | Tarea inactiva |  | Resumen manual |  |
| Hito |  | Hito inactivo |  | Sólo el comienzo |  |
| Resumen |  | Resumen inactivo |  | Sólo fin |  |
| Resumen del proyecto |  | Tarea manual |  | Fecha límite |  |
| Tareas externas |  | Sólo duración |  | Progreso |  |

17					05 mar '17					12 mar '17					19 mar '17					26 mar '17					02 abr '17					09 abr '17																
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V								



Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

[illegible]

[illegible]


[illegible]

				04 jun '17								11 jun '17								18 jun '17								25 jun '17								02 jul '17								09 jul '17							
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S													



Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

16 jul '17							23 jul '17							30 jul '17							06 ago '17							13 ago '17							20 ago '17							27 ago '17			
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X

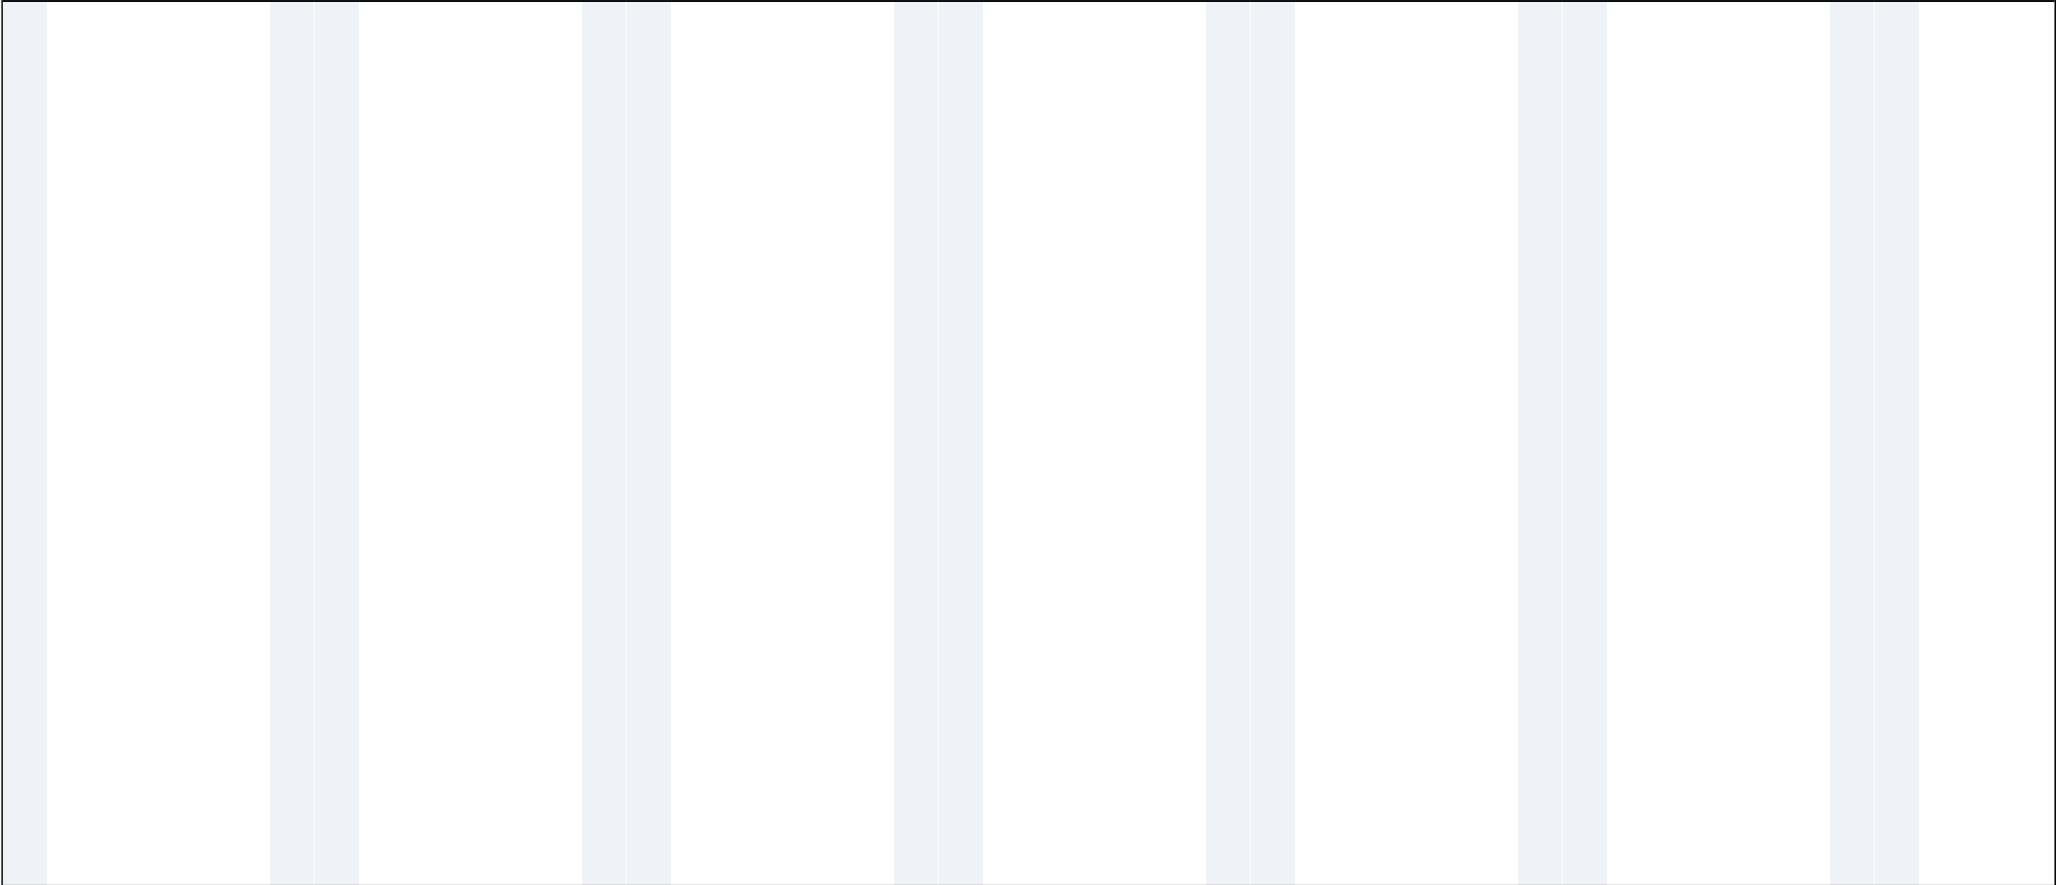

Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

16 jul '17							23 jul '17							30 jul '17							06 ago '17							13 ago '17							20 ago '17							27 ago '17			
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X							

Proyecto: Plan de trabajo APS-3
 Fecha: lun 13/06/16

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

16 jul '17							23 jul '17							30 jul '17							06 ago '17							13 ago '17							20 ago '17							27 ago '17			
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X							



Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

[illegible]

oct '17						22 oct '17						29 oct '17						05 nov '17						12 nov '17						19 nov '17						26 nov '17					
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J			



Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

oct '17						22 oct '17						29 oct '17						05 nov '17						12 nov '17						19 nov '17						26 nov '17				
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J		



Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

[illegible]

		03 dic '17								10 dic '17								17 dic '17								24 dic '17								31 dic '17								07 ene '18								14 ene '18		
V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L							



Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

18					21 ene '18					28 ene '18					04 feb '18					11 feb '18					18 feb '18					25 feb '18								
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V



Proyecto: Plan de trabajo APS-3
 Fecha: lun 13/06/16

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

18					21 ene '18					28 ene '18					04 feb '18					11 feb '18					18 feb '18					25 feb '18									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	

Proyecto: Plan de trabajo APS-3
 Fecha: lun 13/06/16

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

[illegible]

18					21 ene '18					28 ene '18					04 feb '18					11 feb '18					18 feb '18					25 feb '18																
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V								



Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

[illegible]

[illegible]

				22 abr '18				29 abr '18				06 may '18				13 may '18				20 may '18				27 may '18							
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S

Proyecto: Plan de trabajo APS-3

Fecha: lun 13/06/16

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 65

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 53190

				22 abr '18								29 abr '18								06 may '18								13 may '18								20 may '18								27 may '18							
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S													

Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

[illegible]

03 jun '18							10 jun '18							17 jun '18							24 jun '18							01 jul '18							08 jul '18							15 jul '18			
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X							

Proyecto: Plan de trabajo APS-3
 Fecha: lun 13/06/16

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

03 jun '18							10 jun '18							17 jun '18							24 jun '18							01 jul '18							08 jul '18							15 jul '18			
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X							



Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

[illegible]

				22 jul '18							29 jul '18							05 ago '18							12 ago '18							19 ago '18							26 ago '18							02 s
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D								



Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



Proyecto: Plan de trabajo APS-3

Fecha: lun 13/06/16

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

sep '18							09 sep '18							16 sep '18							23 sep '18							30 sep '18							07 oct '18							14 oct '18						
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J										

Proyecto: Plan de trabajo APS-3
Fecha: lun 13/06/16

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

sep '18						09 sep '18						16 sep '18						23 sep '18						30 sep '18						07 oct '18						14 oct '18				
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J		




Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

		21 oct '18							28 oct '18							04 nov '18							11 nov '18							18 nov '18							25 nov '18							02 dic '18	
V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L							



Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

21 oct '18								28 oct '18								04 nov '18								11 nov '18								18 nov '18								25 nov '18								02 dic '18	
V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L											
Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16								Tarea										Hito externo				Informe de resumen manual																											
								División										Tarea inactiva				Resumen manual																											
								Hito										Hito inactivo				Sólo el comienzo																											
								Resumen										Resumen inactivo				Sólo fin																											
								Resumen del proyecto										Tarea manual				Fecha límite																											
								Tareas externas										Sólo duración				Progreso																											
Página 82 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 53207																																																	

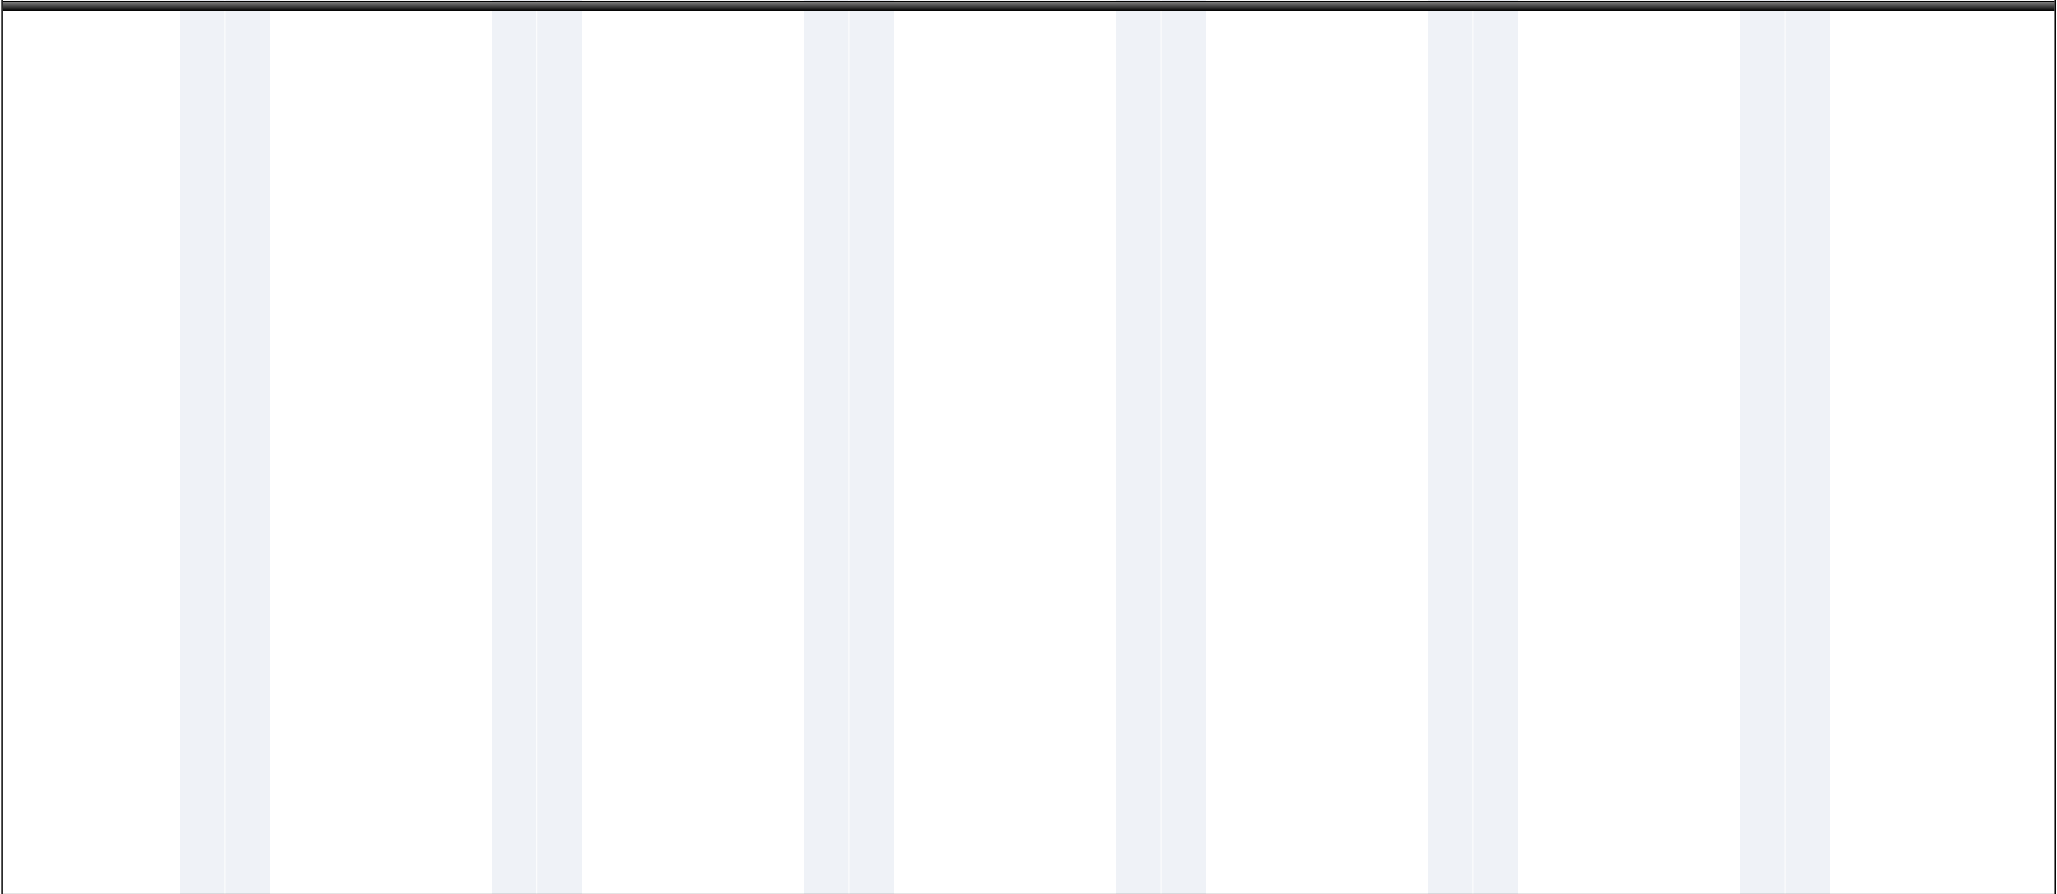

Proyecto: Plan de trabajo APS-3
Fecha: lun 13/06/16

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

18					09 dic '18					16 dic '18					23 dic '18					30 dic '18					06 ene '19					13 ene '19								
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16					Tarea										Hito externo										Informe de resumen manual													
					División										Tarea inactiva										Resumen manual													
					Hito										Hito inactivo										Sólo el comienzo													
					Resumen										Resumen inactivo										Sólo fin													
					Resumen del proyecto										Tarea manual										Fecha límite													
					Tareas externas										Sólo duración										Progreso													

18					09 dic '18							16 dic '18							23 dic '18							30 dic '18							06 ene '19							13 ene '19						
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V								



Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

20 ene '19							27 ene '19							03 feb '19							10 feb '19							17 feb '19							24 feb '19							03 mar '19			
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M



Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

				10 mar '19							17 mar '19							24 mar '19							31 mar '19							07 abr '19							14 abr '19						
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S							



Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

[illegible]

Proyecto: Plan de trabajo APS-3
Fecha: lun 13/06/16

Tarea



Hito externo



Informe de resumen manual



División



Tarea inactiva



Resumen manual



Hito



Hito inactivo



Sólo el comienzo



Resumen



Resumen inactivo



Sólo fin



Resumen del proyecto



Tarea manual



Fecha límite



Tareas externas



Sólo duración



Progreso




				10 mar '19								17 mar '19								24 mar '19								31 mar '19								07 abr '19								14 abr '19							
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S													



Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

21 abr '19							28 abr '19							05 may '19							12 may '19							19 may '19							26 may '19							02 jun '19			
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X

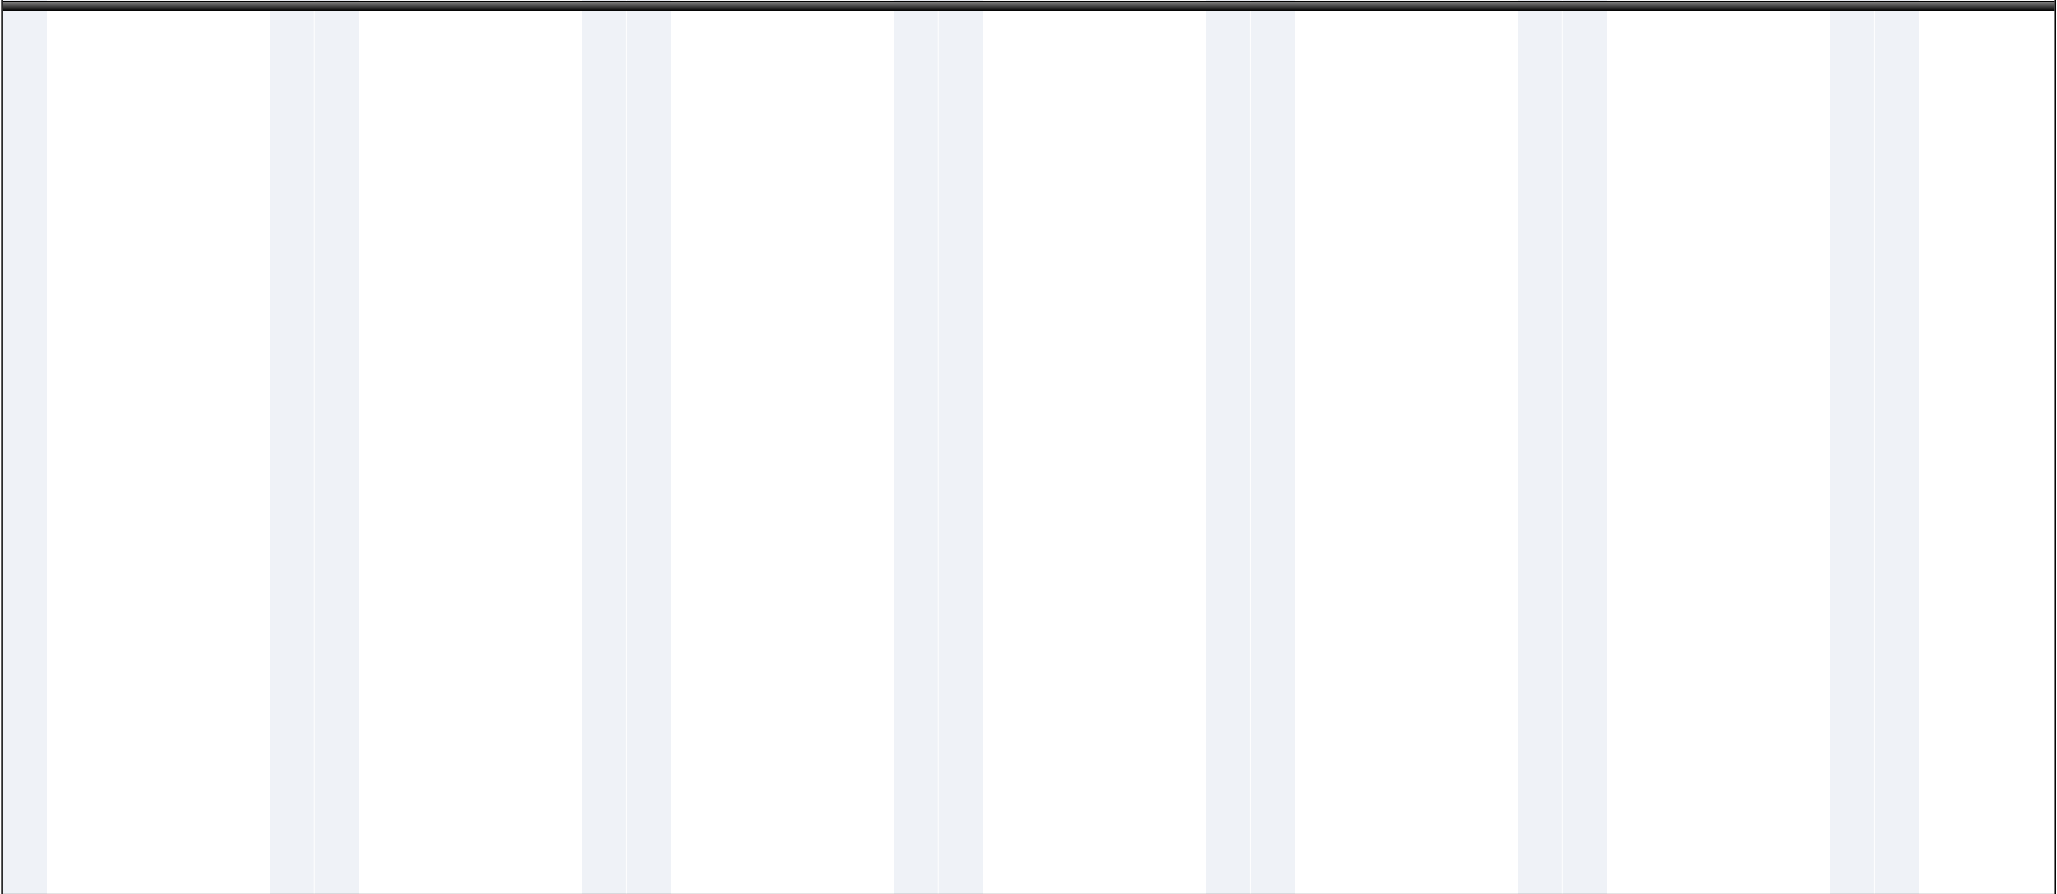

Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

[illegible]

Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

21 abr '19							28 abr '19							05 may '19							12 may '19							19 may '19							26 may '19							02 jun '19			
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X							



Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

[illegible]

ul '19							28 jul '19							04 ago '19							11 ago '19							18 ago '19							25 ago '19							01 sep '19												
L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S	



Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	


ul '19							28 jul '19							04 ago '19							11 ago '19							18 ago '19							25 ago '19							01 sep '19						
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J										

Proyecto: Plan de trabajo APS-3
 Fecha: lun 13/06/16

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

[illegible]

08 sep '19								15 sep '19								22 sep '19								29 sep '19								06 oct '19								13 oct '19								20 oct '19	
V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L											
Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16								Tarea									Hito externo									Informe de resumen manual																							
								División									Tarea inactiva									Resumen manual																							
								Hito									Hito inactivo									Sólo el comienzo																							
								Resumen									Resumen inactivo									Sólo fin																							
								Resumen del proyecto									Tarea manual									Fecha límite																							
								Tareas externas									Sólo duración									Progreso																							
Página 110 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 53235																																																	

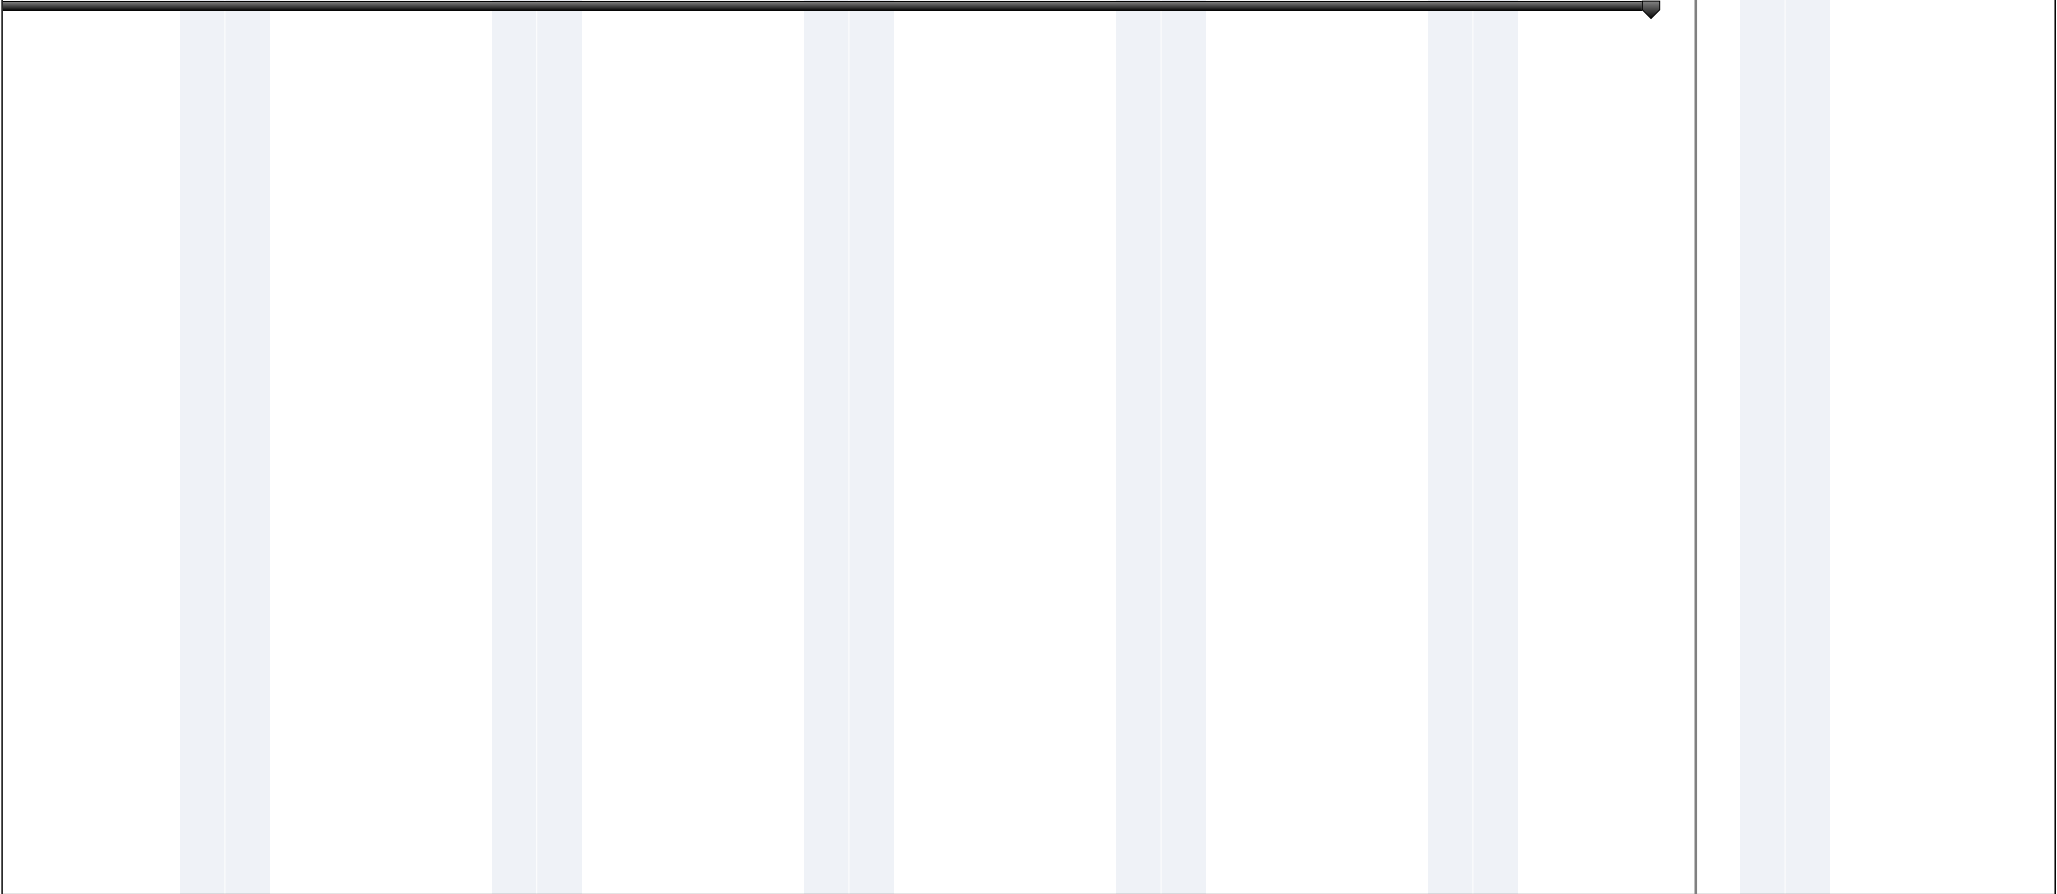

Proyecto: Plan de trabajo APS-3
Fecha: lun 13/06/16

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite


Progreso

19					27 oct '19					03 nov '19					10 nov '19					17 nov '19					24 nov '19					01 dic '19									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	

Proyecto: Plan de trabajo APS-3


Fecha: lun 13/06/16

- | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|
| Tarea |  | Hito externo |  | Informe de resumen manual |  |
| División |  | Tarea inactiva |  | Resumen manual |  |
| Hito |  | Hito inactivo |  | Sólo el comienzo |  |
| Resumen |  | Resumen inactivo |  | Sólo fin |  |
| Resumen del proyecto |  | Tarea manual |  | Fecha límite |  |
| Tareas externas |  | Sólo duración |  | Progreso |  |

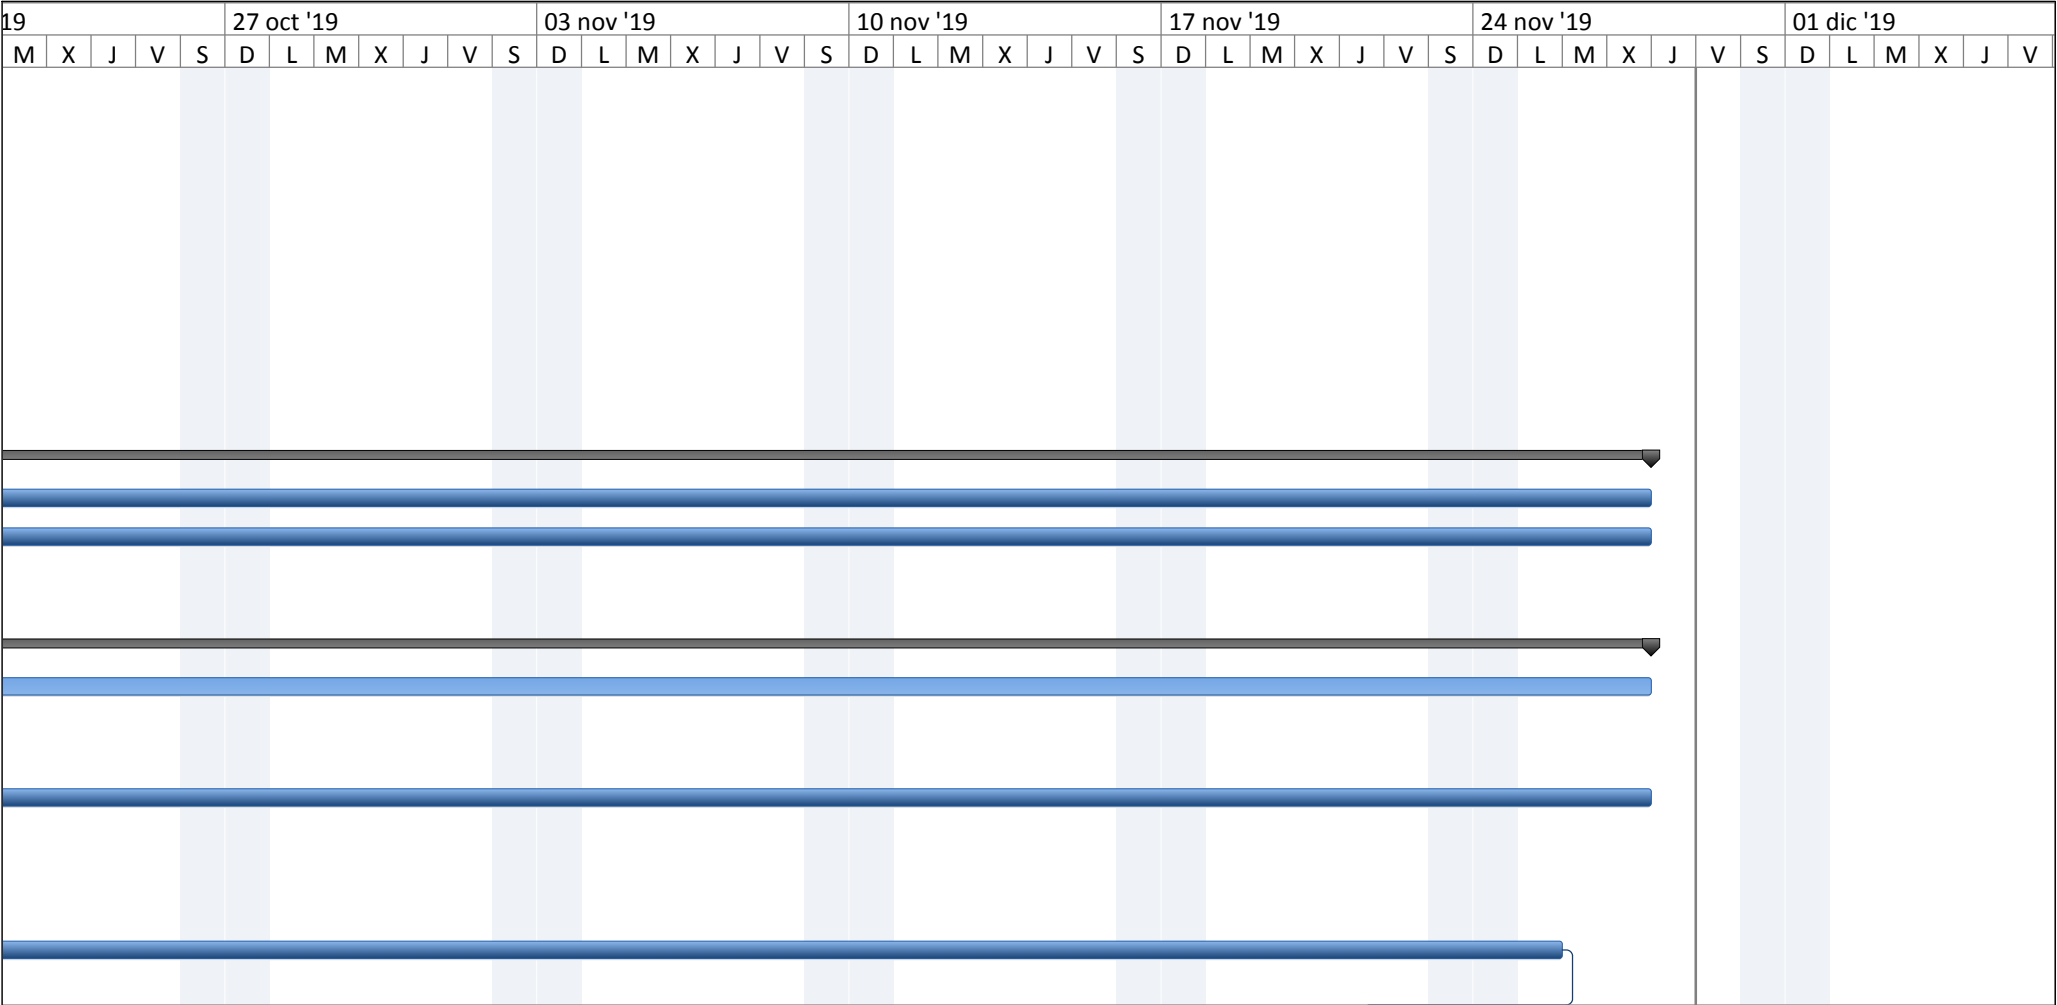

Proyecto: Plan de trabajo APS-3
Fecha: lun 13/06/16

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

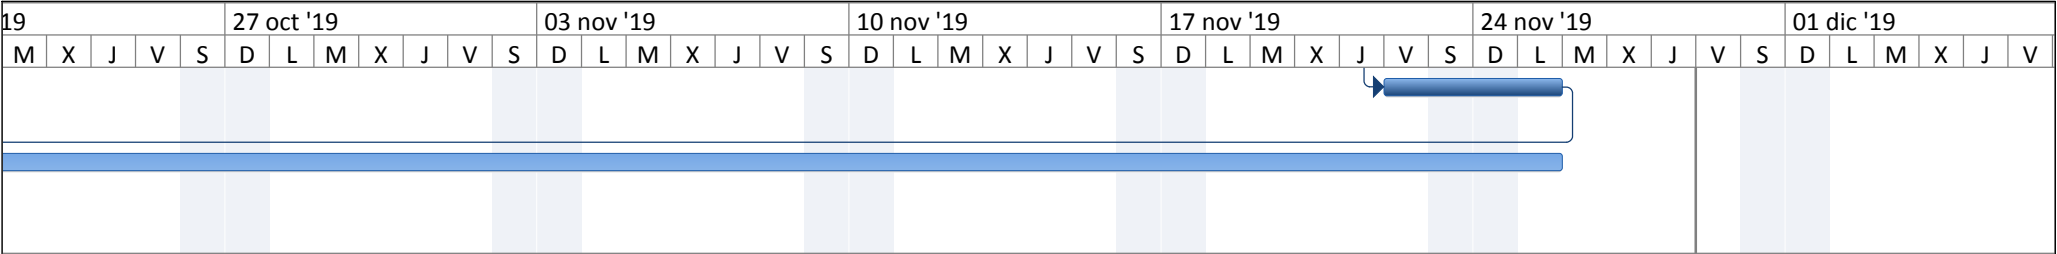

Proyecto: Plan de trabajo APS-3 Fecha: lun 13/06/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	
